

Urbesur Constructora, S.A. de C.V.

UCO980121LC9
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
 Belisario Domínguez, 173, Centro, 49000, Ciudad Guzmán, Zapotlán El Grande, Jalisco,
 México
 Tel. 3414127007

CLIENTE

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE
 MZG8501012NA
 USO CFDI: P01 - Por definir
 COLON, 62, 49000, Ciudad Guzmán, Zapotlán el Grande, Jalisco, México

Factura 447

FOLIO FISCAL (UUID)
 E000CEBA-13D0-4B45-8683-860143EBD11C
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000405535779
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000404141534
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
 2018-11-28T11:49:58
 RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
 FMD100203JS7
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
 2018-11-28T11:41:11
 LUGAR DE EXPEDICIÓN
 49000

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48 - N/A	RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE LA CANTIDAD DE \$218,648.33(DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 33/100MN) POR CONCEPTO DEL 1 ERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA DELEGACION DE ATEQUIZAYAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO. UBICACION: EN LA LOCALIDAD DE ATEQUIZAYAN DELEGACION DE CD. GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.	\$ 188,489.94	\$ 188,489.94

AFIANZADORA: SOFIMEX S.A.
 FIANZA DE ANTICIPO No.:2252807
 FIANZA DE CUMPLIMIENTO No.:2252815
 CONTRATO No.: DOP/FAIS33/2018-07/030
 RECURSOS: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

2 AL MILLAR: \$1,408.41
 5 AL MILLAR: \$ 3,521.03
 MONTO PARA EFECTO AL PAGO: \$ 213,718.89

Clave Prod. Serv. - 81101513 Gestión de construcción de edificios
 Impuestos:

Trasladados:
 002 IVA Base - \$ 188,489.94 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 30,158.39



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS, 33/100 MXN

SUBTOTAL \$ 188,489.94
 TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 30,158.39
TOTAL \$ 218,648.33

TIPO DE COMPROBANTE
 FORMA DE PAGO
 MÉTODO DE PAGO
 MONEDA

I - Ingreso
 03 - Transferencia electrónica de fondos
 PUE - Pago en una sola exhibición
 MXN - Peso Mexicano

ARQ. JESUS EUGENIO CAMROS ESCOBAR
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS
 JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA PUBLICA

ING. FILEMÓN LÓPEZ LÓPEZ
 CONTRATISTA



SELLO DIGITAL DEL CFDI

h9Ymo9hysvYmiEWovQfu4kOk0K6iRA9Z7yYJGgcMeCQriuG4+ah4Q4X/eUPW2UmPa+lajATGlnWkWaww1eYi8d+JBwT9HQs6uUM/5bWibfX0vsE3mBlxMJK/zUHkZ2d71snwWe1jv3cbFPpZz9pB/dL6RW0rGT2oq9PBWraNq+Y7e856jyKtQ/JQ199ayvpYkKt/cYy/EmoerFqeamXd70MJLcuBRoNEgDpDBeqYKM772U3OsBii59FLBmANkeuDfuEFAIGLXeHAJJTwhkZpKwBAGWNJXdSa1PRccVckN+kCf04P1MVSU6iXh5bWKG8KXrWh216BEg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

ZMBrA9E9Re8es9ePPNSuCdpm8scJ3ayBo20JN+pv15yGR66v17yZIfud+3J2t6FJHBINVoAgp87BCL4ictfjGBQzO+hqCEpOaPnu/0JuAYTrawoG88vxS2xP4V7gAvswSvr8lclUngeQ1HfykUPIBvBMSxPVEA5MITmVfULxiOJPKIj+gZqLk4UNhgr17W/Ebddd9ucgLY6IMH8P5gVw0AZ8KA7nJ09ZR53K/N+KVS035pYUzNTPXC47A5UgGRA7p9N1TbifUq+hUvxyY+TzPg7gHROZbNOMtoW74WGjFYXITSSIRHWtqUukWkLk6rjq96fctxIKI/Xw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|E000CEBA-13D0-4B45-8683-860143EBD11C|2018-11-28T11:49:58|FMD100203JS7|h9Ymo9hysvYmiEWovQfu4kOk0K6iRA9Z7yYJGgcMeCQriuG4+ah4Q4X/eUPW2UmPa+lajATGlnWkWaww1eYi8d+JBwT9HQs6uUM/5bWibfX0vsE3mBlxMJK/zUHkZ2d71snwWe1jv3cbFPpZz9pB/dL6RW0rGT2oq9PBWraNq+Y7e856jyKtQ/JQ199ayvpYkKt/cYy/EmoerFqeamXd70MJLcuBRoNEgDpDBeqYKM772U3OsBii59FLBmANkeuDfuEFAIGLXeHAJJTwhkZpKwBAGWNJXdSa1PRccVckN+kCf04P1MVSU6iXh5bWKG8KXrWh216BEg==|00001000000405535779|

VINCULACION CON DELEGACIONES

3 DIC 2018
 Folios Digitales®
 Proveedor Autorizado de Certificación
 No SAT 55710

RECIBIDO

CONTROL DE OBRA PUBLICA

FECHA : 24 DE NOVIEMBRE DEL 2018

ASIGNACIÓN No. : DOP/FAIS33/2018-07

O. DE T. S/N

CONTRATISTA: **URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.** PERIODO: 05-15 DE NOVIEMBRE DE 2018

OBRA : "CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA DELEGACION ATEQUIZAYAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO"

LOCALIDAD : CIUDAD GUZMAN, JAL.

FECHA DE INICIO : 07 DE OCTUBRE DE 2018

ESTIMACIÓN : 1ERA ESTIMACION

RESUMEN DE DOCUMENTO

IMPORTE DE LA ESTIMACION	\$251,319.92	\$251,319.92
ADITIVA		
DEDUCTIVA		
ESCALATORIA		
16 % I.V.A.	\$40,211.19	\$291,531.11
AMORTIZACIÓN 25%	\$72,882.78	\$218,648.33
TOTAL A FACTURAR	\$218,648.33	

RESUMEN Y ESTADO CONTABLE

AVANCE %

FECHA INICIAL	07 DE OCTUBRE 2018
FINANCIERO	51.77%
DOCUMENTO	0.00%
FISICO	35.69%
FECHA DE TERMINO	15 DE DIC. DE 2018

TECHO FINANCIERO	IMPORTE	ACUMULADO	IMPORTE	ANTICIPO	
PRESUPUESTO BASE	\$816,878.15	ESTA ESTIMACIÓN	\$291,531.11	ANTICIPO 25 %	\$204,219.54
CONVENIO ADICIONAL		ACUM. ANTERIOR	\$-	AMORT. ANTERIOR	
SUMA ESCALATORIA		ACUM. ACTUAL	\$291,531.11	ESTA AMORTIZACIÓN	\$72,882.78
TOTAL	\$816,878.15	SALDO	\$525,347.04	TOTAL AMORTIZADO	\$72,882.78
				SALDO	\$131,336.76

DETALLES	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	SUMA
IMPORTE	\$188,489.94	\$-	\$-	0	\$188,489.94
16 % I.V.A.	\$30,158.39	\$-	\$-	0	\$30,158.39
TOTAL A FACTURAR	\$218,648.33	\$-	\$-	0	\$218,648.33
2 AL MILLAR INST. CAPAC. C	\$1,408.41	\$-	\$-	0	\$1,408.41
5 AL MILLAR SFP	\$3,521.03	0	\$-	0	\$3,521.03
TOTAL A PAGAR	\$213,718.89	\$-	\$-	0	\$213,718.89

REFERENCIAS:

OBSERVACIONES:

<p>ARQ. JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS</p>	<p>ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA PUBLICA</p>
<p>DIRECCION DE GESTION DE PROGRAMAS DE OPLADEMUN Y CONTRATISTA CON DELEGACIONES</p>	
<p>ING. FILEMÓN LOPEZ LOPEZ</p>	

RECIBIDO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



3 DIC 2018 09:06

ESTIMACION

ARCHIVO: ESTIMACIONES

HOJA: 1 DE 5

EST. No. 1

CONTRATISTA:	URBESUR CONSTRUCTORA SA DE CV. BELISARIO DOMINGUEZ # 173 CD. GUZMAN, JAL.	OBRA:	"PRIMERA ETAPA DE REHABILITACION DE LA UNIDAD DE REHABILITACION DE ZAPOTLAN EL GRANDE"
		CONTRATO:	DOP/FAIS33/2018-07
		MUNICIPIO:	CD. GUZMAN, JALISCO.
		FECHA:	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	P. UNITARIO	PRESUPUESTO	ACUM ANTER	PRESENTE	ACUMULADO	EXCEDENTE	IMP. ESTIMACION
A01	PRELIMINARES								
01	LIMPIEZA Y DESHIERBE DE TERRENO A MANO INCLUYE: RETIRO DE PRODUCTO DE LA LIMPIEZA, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO QUE SEA NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	13.90	180.00	0	180.00	0.00	0.00 \$	2,502.00
02	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO LAS VECES QUE SE REQUIERA (UN SOLO PAGO)	M2	9.56	180.00	0	180.00	0.00	0.00 \$	1,720.80
A02	PISO FIRME								
03	PISO DE CONCRETO DE F" C=150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR ACABADO PULIDO, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/6-6 INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	M2	287.00	180.00	0	180.00	0.00	0.00 \$	51,660.00
A03	INSTALACION PLUVIAL								
04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJANTE DE P.V.C. DE 4" DE DIAMETRO	M	90.49	45.00	0	21.00	0.00	0.00 \$	1,900.29



Jesús Campos Escobar

ARG. JESUS CAMPOS ESCOBAR
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. FILEMÓN LÓPEZ
URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

ESTIMACION

ARCHIVO: ESTIMACIONES

HOJA: 2DE 5

EST. No. 1

CONTRATISTA:	URBESUR CONSTRUCTORA SA DE CV. BELISARIO DOMINGUEZ # 173 CD. GUZMAN, JAL.	OBRA:	"PRIMERA ETAPA DE REHABILITACION DE LA UNIDAD DE REHABILITACION DE ZAPOTLAN EL GRANDE"
		CONTRATO:	DOP/FAIS33/2018-07
		MUNICIPIO:	CD. GUZMAN, JALISCO.
		FECHA:	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	P. UNITARIO	PRESUPUESTO	ACUM ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	EXCEDENTE	IMP. ESTIMACION
A04	ESTRUCTURA								
05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE NOVAMURO A BASE DE TABIQUE HUECO TIPO VINTEX 12/12 Y TIPO MUXPLEX 12/12 INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO QUE SEA NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	361.32	544.80	0	235.39	0.00	0.00	85,051.11
06	ANCLAJE DE 3 VARILLAS DE ACERO CORRUGADO DE 3/8" DE 3 MTS. DE LONGITUD PLOMEADO Y AMARRADO CON ALAMBRE RECOCIDO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO QUE SEA NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	56.69	45.00	0	154.00	0.00	109.00	8,730.26
07	COLADO DE CASTILLO DE CONCRETO (F'c=150KG/CM2) AHOGADO EN MURO SECCION (10X9) CMS. 2 PZAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO QUE SEA NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M	287.00	180.00	0	347.58	0.00	0.00	99,755.46




ARQ. JESUS CAMPOS ESCOBAR
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS


ING. FILEMON LÓPEZ LÓPEZ
 URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ESTIMACION

ARCHIVO: ESTIMACIONES

HOJA: 3DE 5

EST. No. 1

CONTRATISTA:	URBESUR CONSTRUCTORA SA DE CV. BELISARIO DOMINGUEZ # 173 CD. GUZMAN, JAL.	OBRA:	"PRIMERA ETAPA DE REHABILITACION DE LA UNIDAD DE REHABILITACION DE ZAPOTLAN EL GRANDE"
		MUNICIPIO:	CD. GUZMAN, JALISCO.
		CONTRATO:	DOP/FAIS33/2018-07
		FECHA:	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	P. UNITARIO	PRESUPUESTO	ACUM ANTER	PRESENTE	ACUMULADO	EXCEDENTE	IMP. ESTIMACION
-------	----------	--------	-------------	-------------	------------	----------	-----------	-----------	-----------------

08	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE NOVADALA MARCA NOVACERAMIC, CON COLADO DE CONCRETO (F'C=150 KG/CM2) REFORZADO CON ARMEX REFORZADO TIPO 12-12-3 CON UNA SECCION INTERIOR DE CONCRETO DE (11.08X8.1)CMS Y UNA SECCION TERMINADA DE (11.5X15)CM INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO QUE SEA NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M	186.12	255.90	0	0.00	0.00	0.00	\$
----	---	---	--------	--------	---	------	------	------	----

A05 09	CUBIERTA SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA A BASE DE NOVA LOSA CON DIMENSIONES DE (80X24X9)CMS MARCA NOVACERAMIC, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA DE MADERA DE PINO DE 2DA, NERVADURAS DE (10X9) CMS DE CONCRETO (F'C=200KG/CM2), CAPA DE COMPRESION DE LA MISMA CALIDAD DE 3 CMS DE ESPESOR REFORZADA CON MALLA LAC 6X6 10/10, INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO QUE SEA NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	441.52	180.00	0	0.00	0.00	0.00	\$
-----------	--	----	--------	--------	---	------	------	------	----



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. JESUS CAMPOS ESCOBAR
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. FILEMÓN LÓPEZ LÓPEZ
 URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

ESTIMACION

ARCHIVO: ESTIMACIONES

HOJA: 4 DE 5

EST. No. 1

CONTRATISTA:	URBESUR CONSTRUCTORA SA DE CV. BELISARIO DOMINGUEZ # 173 CD. GUZMAN, JAL.	OBRA:	"PRIMERA ETAPA DE REHABILITACION DE LA UNIDAD DE REHABILITACION DE ZAPOTLAN EL GRANDE"
			CONTRATO: DOP/FAIS33/2018-07
		MUNICIPIO: CD. GUZMAN, JALISCO.	FECHA:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	P. UNITARIO	PRESUPUESTO	ACUM ANTER	PRESENTE	ACUMULADO	EXCEDENTE	IMP. ESTIMACION
10	TEN-079 TENDIDO DE ZAVALETA O CHAFLAN CON PEDACERA DE LADRILLO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CALHIDRA-ARENA-CEMENTO PROP. 1:3	M	86.84	210.00	0	0.00	0.00	0.00	\$ -
A06	INSTALACION ELECTRICA								
11	INSTALACION ELECTRICA TIPO RESIDENCIAL INCLUYE FOCO AHORRADOR Y APAGADOR SENCILLO	SAL	638.62	15.00	0	0.00	0.00	0.00	\$ -
12	INSTALACION ELECTRICA TIPO RESIDENCIAL OCULTA PARA CONTACTO SENCILLO	SAL	590.18	15.00	0	0.00	0.00	0.00	\$ -
A07	PUERTAS Y VENTANAS								
13	INSTALACION DE VENTANA DE 1.32X1.18 CON UN MODULO FIJO Y UN CORREDIZO CON MARCO DE ALUMINIO Y CRISTAL DE 6 MM INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZA	3473.5	15.00	0	0.00	0.00	0.00	\$ -



Arg. Campos Escobar
ARG. JESUS CAMPOS ESCOBAR
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Filemon Lopez Lopez
ING. FILEMÓN LÓPEZ LÓPEZ
URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ESTIMACION

ARCHIVO: ESTIMACIONES

HOJA: SDE 5

EST. No. 1

CONTRATISTA: URBESUR CONSTRUCTORA SA DE CV. BELISARIO DOMINGUEZ # 173 CD. GUZMAN, JAL.	OBRA: "PRIMERA ETAPA DE REHABILITACION DE LA UNIDAD DE REHABILITACION DE ZAPOTLAN EL GRANDE"	CONTRATO: DOP/FAIS33/2018- 07	FECHA:
MUNICIPIO: CD. GUZMAN, JALISCO.			

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	P. UNITARIO	PRESUPUESTO	ACUM ANTER	PRESENTE	ACUMULADO	EXCEDENTE	IMP. ESTIMACION
14	INSTALACION DE PUERTA DE 0.90X2.20 M DE TAMBOR CON MELANINA, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZA	4870.49	15.00	0	0.00	0.00	0.00	\$ -
A08	LIMPIEZA FINA DE OBRA								
15	LIMPIEZA FINA GENERAL DE OBRA	M2	14.25	180.00	0	0.00	0.00	0.00	\$ -

ING. FILEMÓN LÓPEZ LÓPEZ
URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

ARQ. JESUS CAMPOS ESCOBAR
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

TOTAL DE ESTA HOJA	\$ 251,319.92
TOTAL PRESENTE ESTIMACION	\$ 251,319.92
IMPORTE PARA FACTURACION	
16% IVA	\$ 40,211.19
AMENOS IMPORTE ANTICIPO POR AMORTIZACION 25%	\$ 72,882.78
SUB-TOTAL	\$ 218,648.33
IMPORTE TOTAL POR PAGAR IVA INCLUIDO	\$ 218,648.33



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

NUMEROS GENERADORES

ARCHIVO NUM. GENERADORES OBRA


OBRA:	"CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA DELEGACION DE ATEQUIZAYAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO"	LUGAR:	CD. GUZMAN, JALISCO
CONTRATISTA:	URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	PLANO:	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.
NIVEL:	EST. No. 1	FECHA:	CONTRATO: DOP/FAIS33/2018-07
			24 DE NOVIEMBRE DEL 2018

CLAVE	CONCEPTO	UBICACION	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	UNIDAD	SUBTOTAL	REFERENCIA
1	LIMPIEZA Y DESHIERBE DE TERRENO A MANO INCLUYE: RETIRO DE PRODUCTO DE LA LIMPIEZA, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO QUE SEA NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	CALLE UNICA #150D	4.000	3.000	0.000	1.000	M2	12.000	A-C DE 1-3
		CALLE UNICA #22	4.000	3.000	0.000	1.000	M2	12.000	A-C DE 1-3
		CALLE UNICA #285	4.000	3.000	0.000	1.000	M2	12.000	A-C DE 1-3
		CALLE UNICA #37	4.000	3.000	0.000	1.000	M2	12.000	A-C DE 1-3
		CALLE UNICA #40	4.000	3.000	0.000	1.000	M2	12.000	A-C DE 1-3
		CALLE UNICA #69	4.000	3.000	0.000	1.000	M2	12.000	A-C DE 1-3
		CALLE UNICA #74	4.000	3.000	0.000	1.000	M2	12.000	A-C DE 1-3
		CALLE UNICA #75	4.000	3.000	0.000	1.000	M2	12.000	A-C DE 1-3
		CALLE UNICA #79	4.000	3.000	0.000	1.000	M2	12.000	A-C DE 1-3
		CALLE UNICA #17A	4.000	3.000	0.000	1.000	M2	12.000	A-C DE 1-3
		CALLE UNICA #80	4.000	3.000	0.000	1.000	M2	12.000	A-C DE 1-3
		CALLE UNICA #50	4.000	3.000	0.000	1.000	M2	12.000	A-C DE 1-3
		CALLE UNICA #56	4.000	3.000	0.000	1.000	M2	12.000	A-C DE 1-3
		CALLE UNICA #1444	4.000	3.000	0.000	1.000	M2	12.000	A-C DE 1-3
		CALLE UNICA #31	4.000	3.000	0.000	1.000	M2	12.000	A-C DE 1-3
							M2	180.00	

SUMA DE ESTA HOJA


 ING. FILEMON LÓPEZ LÓPEZ
 URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.




 ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS
 JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


CROQUIS

ARCHIVO NUM. GENERADORES OBRA

OBRA:	"CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA DELEGACION ATEQUIZAYAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO"	LUGAR:	CD. GUZMAN, JAL.	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.
CONTRATISTA:	URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	FECHA:	24 DE NOVIEMBRE DEL 2018	CONTRATO: DOP/FAIS33/2018-07
NIVEL:	EST. No. 1			

1	LIMPIEZA Y DESHIERBE DE TERRENO A MANO			
---	--	--	--	--

PLANTA DE AREA

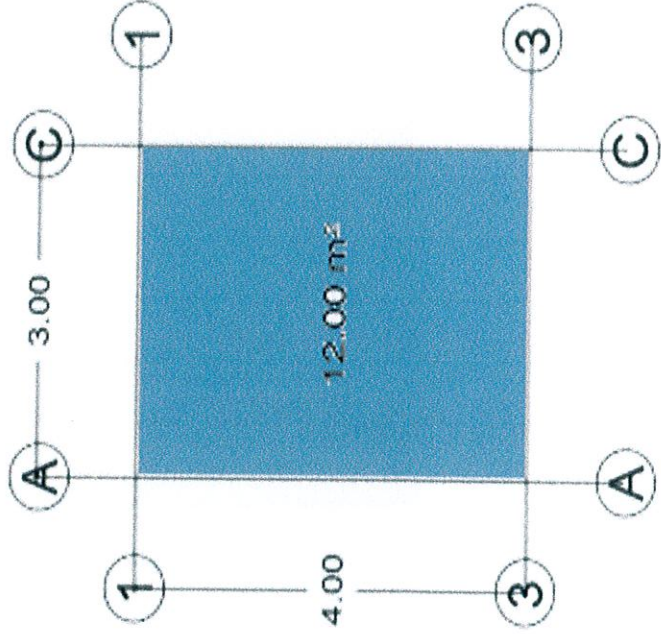

AREA DE LIMPIEZA Y DESHIERBE

[Signature]

ING. FILEMÓN LÓPEZ LÓPEZ
URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.



ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS
JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

REPORTE FOTOGRAFICO

ARCHIVO NUM. GENERADORES OBRA


OBRA:	"CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA DELEGACION ATEQUIZAYAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO"	LUGAR:	CD. GUZMAN, JAL.
CONTRATISTA:	URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	FECHA:	24 DE NOVIEMBRE DEL 2018
CONTRATO:	DOP/FAIS33/2018-07		
MUNICIPIO:	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.		

1	LIMPIEZA Y DESHIERBE DE TERRENO A MANO
---	--




 ING. FILEMÓN LÓPEZ LÓPEZ
 URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.




 ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS
 JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

NUMEROS GENERADORES

ARCHIVO NUM. GENERADORES OBRA

OBRA:	"CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA DELEGACION DE ATEQUIZAYAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO"	LUGAR:	CD. GUZMAN, JALISCO	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.
CONTRATISTA:	URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V	PLANO:		CONTRATO: DOI/FAIS33/2018-07
NIVEL:	EST. No. 1	FECHA:	24 DE NOVIEMBRE DEL 2018	

CLAVE	CONCEPTO	UBICACION	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	UNIDAD	SUBTOTAL	REFERENCIA
2	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO LAS VECES QUE SE REQUIERA (UN SOLO PAGO)	CALLE UNICA #150D	4.000	3.000	0.000	1.000	M2	12.000	A-C DE 1-3
		CALLE UNICA #22	4.000	3.000	0.000	1.000	M2	12.000	A-C DE 1-3
		CALLE UNICA #285	4.000	3.000	0.000	1.000	M2	12.000	A-C DE 1-3
		CALLE UNICA #37	4.000	3.000	0.000	1.000	M2	12.000	A-C DE 1-3
		CALLE UNICA #40	4.000	3.000	0.000	1.000	M2	12.000	A-C DE 1-3
		CALLE UNICA #69	4.000	3.000	0.000	1.000	M2	12.000	A-C DE 1-3
		CALLE UNICA #74	4.000	3.000	0.000	1.000	M2	12.000	A-C DE 1-3
		CALLE UNICA #75	4.000	3.000	0.000	1.000	M2	12.000	A-C DE 1-3
		CALLE UNICA #79	4.000	3.000	0.000	1.000	M2	12.000	A-C DE 1-3
		CALLE UNICA #17A	4.000	3.000	0.000	1.000	M2	12.000	A-C DE 1-3
		CALLE UNICA #80	4.000	3.000	0.000	1.000	M2	12.000	A-C DE 1-3
		CALLE UNICA #50	4.000	3.000	0.000	1.000	M2	12.000	A-C DE 1-3
		CALLE UNICA #56	4.000	3.000	0.000	1.000	M2	12.000	A-C DE 1-3
		CALLE UNICA #1444	4.000	3.000	0.000	1.000	M2	12.000	A-C DE 1-3
		CALLE UNICA #31	4.000	3.000	0.000	1.000	M2	12.000	A-C DE 1-3
	SUMA DE ESTA HOJA						M2	180.00	

[Handwritten Signature]

ING. FILEMÓN LÓPEZ LÓPEZ
URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.



ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS
JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA


CROQUIS

ARCHIVO NUM. GENERADORES OBRA

OBRA:	"CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA DELEGACION ATEQUIZAYAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO"		LUGAR:	CD. GUZMAN, JAL.	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.
CONTRATISTA:	URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.		FECHA:	24 DE NOVIEMBRE DEL 2018	CONTRATO: DOP/FAIS33/2018-07
NIVEL:	EST. No. 1				

2 TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO

PLANTA DE AREA

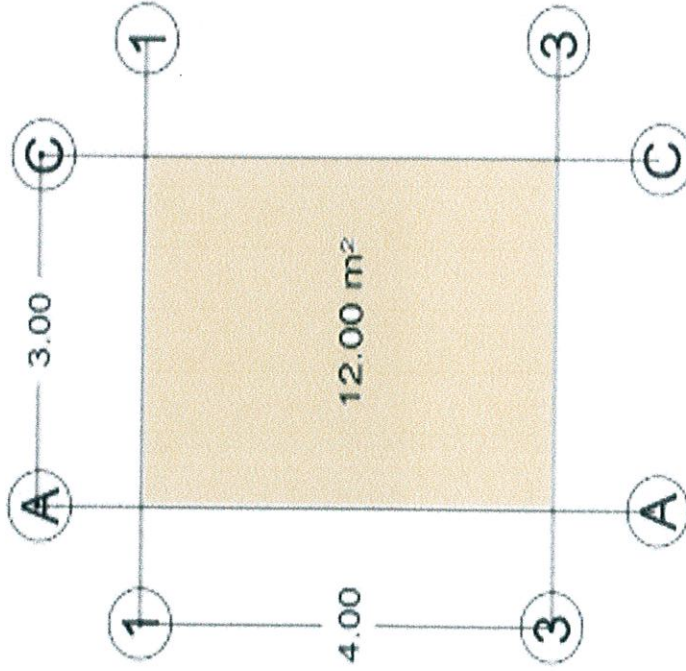

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

[Handwritten signature]

ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS

JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA


ING. FILEMÓN LÓPEZ LÓPEZ
URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

REPORTE FOTOGRAFICO


ARCHIVO NUM. GENERADORES OBRA

OBRA:	"CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA DELEGACION ATEQUIZAYAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO"	LUGAR:	CD. GUZMAN, JAL.
CONTRATISTA:	URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	CONTRATO:	DOI/FAIS33/2018-07
NIVEL:	EST. No. 1	FECHA:	24 DE NOVIEMBRE DEL 2018

2	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO
----------	--------------------------------

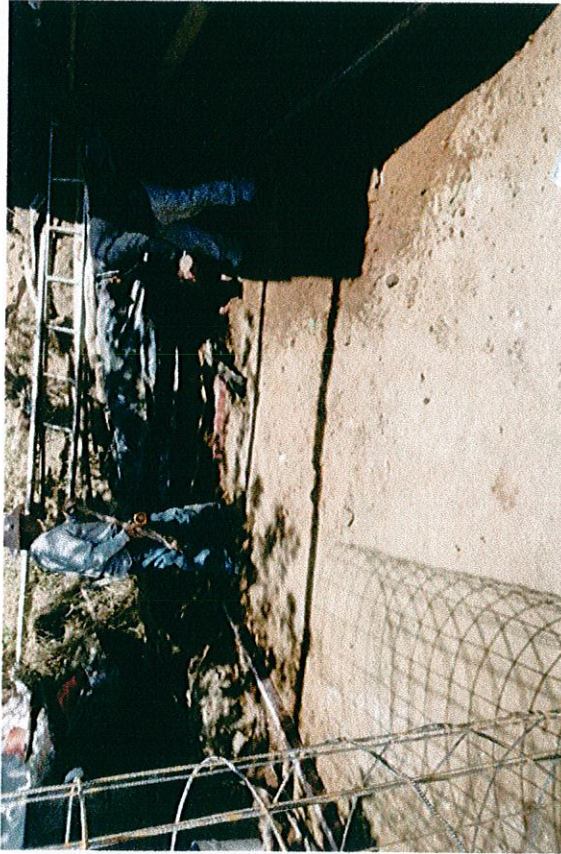

ING. FILEMÓN LOPEZ LOPEZ
URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

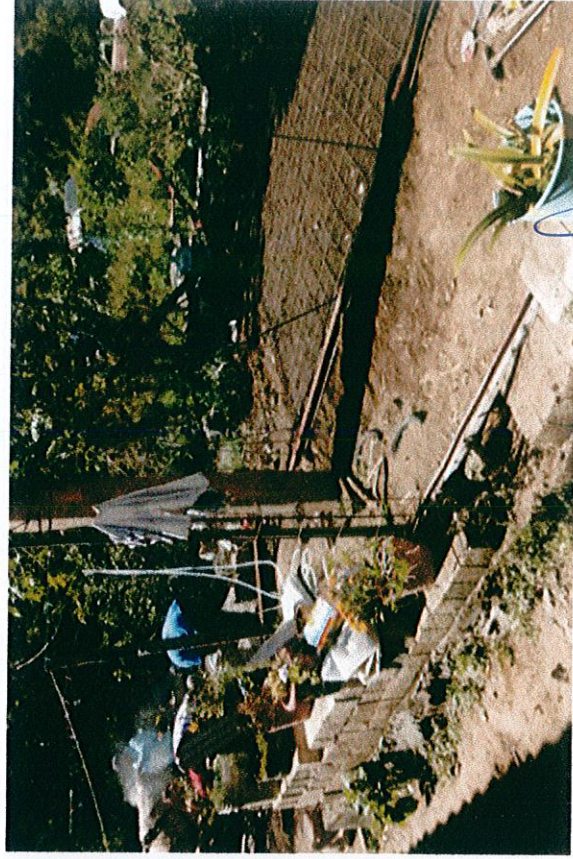

ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS
JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

NUMEROS GENERADORES

ARCHIVO NUM. GENERADORES OBRA

OBRA:	"CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA DELEGACION DE ATEQUIZAYAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO"	LUGAR:	CD. GUZMAN, JALISCO
CONTRATISTA:	URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	PLANO:	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.
NIVEL:	EST. No. 1	FECHA:	CONTRATO: DOP/FAIS33/2018-07
			24 DE NOVIEMBRE DEL 2018

CLAVE	CONCEPTO	UBICACION	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	UNIDAD	SUBTOTAL	REFERENCIA
3	PISO DE CONCRETO DE F"C=150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR ACABADO PULIDO, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/6-6 INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	CALLE UNICA #150D CALLE UNICA #22 CALLE UNICA #285 CALLE UNICA #37 CALLE UNICA #40 CALLE UNICA #69 CALLE UNICA #74 CALLE UNICA #75 CALLE UNICA #79 CALLE UNICA #17A CALLE UNICA #80 CALLE UNICA #50 CALLE UNICA #56 CALLE UNICA #1444 CALLE UNICA #31	4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000	3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000	8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2	12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000	EJE A-C DE 1-3 A-C DE 1-3 A-C DE 1-3 A-C DE 1-3 A-C DE 1-3 A-C DE 1-3 A-C DE 1-3 A-C DE 1-3 A-C DE 1-3 A-C DE 1-3 A-C DE 1-3 A-C DE 1-3 A-C DE 1-3
								SUMA DE ESTA HOJA	
								180.00	


 ING. FILEMÓN LÓPEZ LÓPEZ
 URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.





 ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS
 JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CROQUIS

ARCHIVO NUM. GENERADORES OBRA

	"CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA DELEGACION ATEQUIZAYAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO"				
OBRA:		LUGAR:	CD. GUZMAN, JAL.	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.	
CONTRATISTA:	URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	FECHA:	24 DE NOVIEMBRE DEL 2018	CONTRATO: DOPI/FAIS33/2018-07	
NIVEL:	EST. No. 1				
3	PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR				

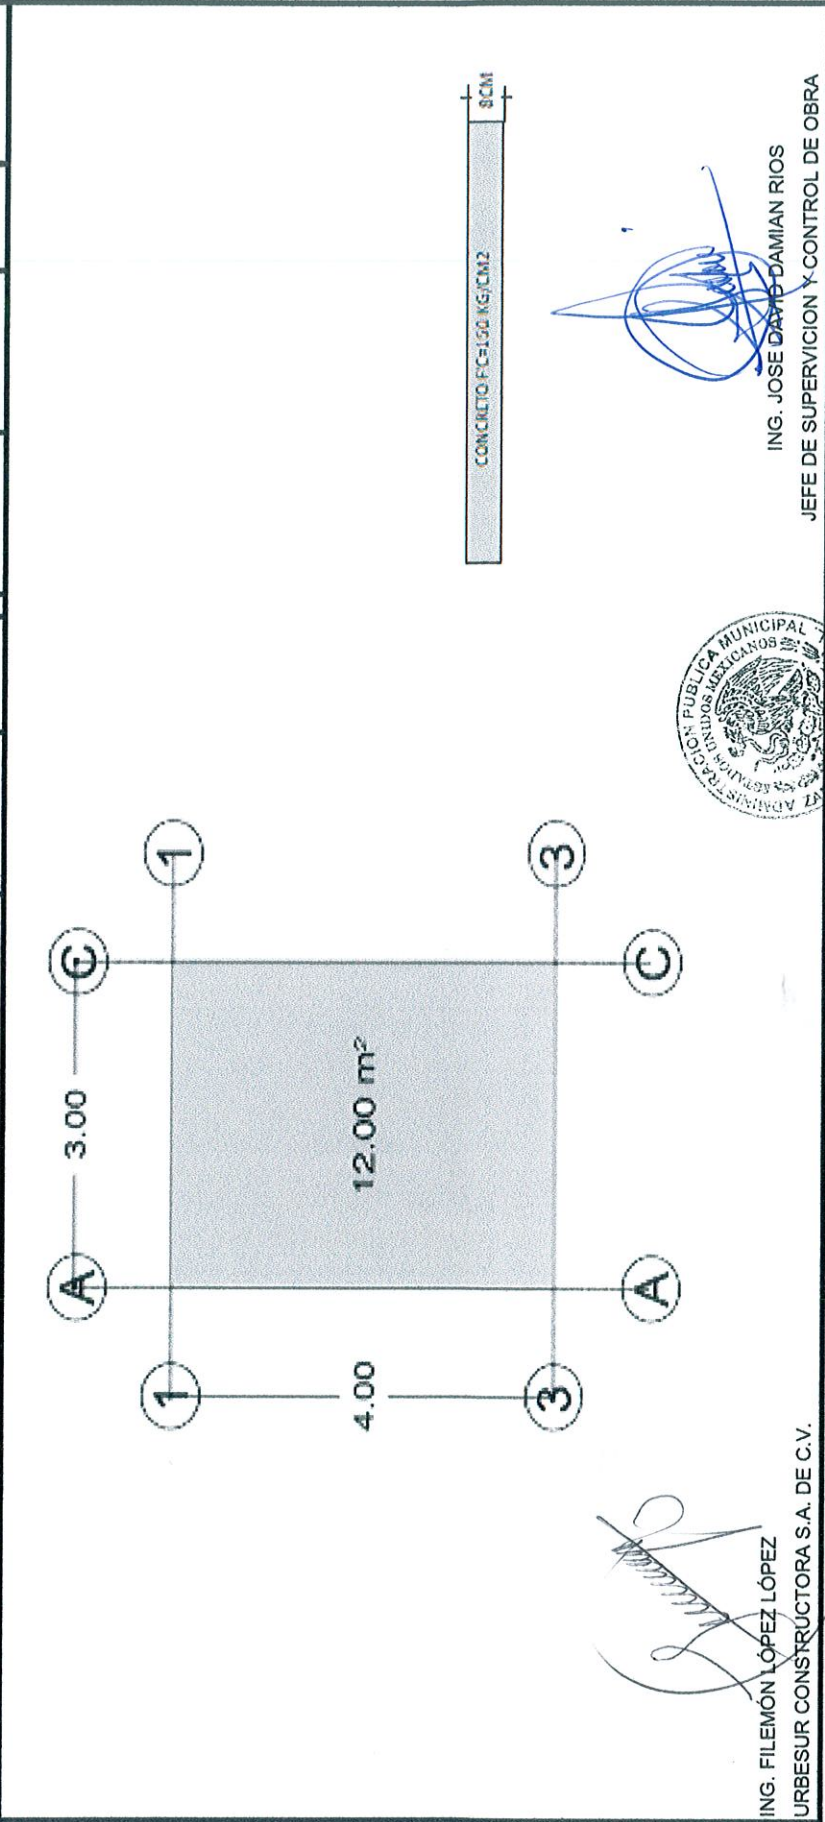


 ING. FILEMÓN LÓPEZ LÓPEZ
 URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.





 ING. JOSÉ DAVID DAMIAN RÍOS
 JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

REPORTE FOTOGRAFICO


ARCHIVO NUM. GENERADORES OBRA

	"CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA DELEGACION ATEQUIZAYAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO"	LUGAR: CD. GUZMAN, JAL.	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.
OBRA:	URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	FECHA: 24 DE NOVIEMBRE DEL 2018	CONTRATO: DOP/FAIS33/2018-07
CONTRATISTA:	EST. No. 1		
NIVEL:			
3	PISO DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR		

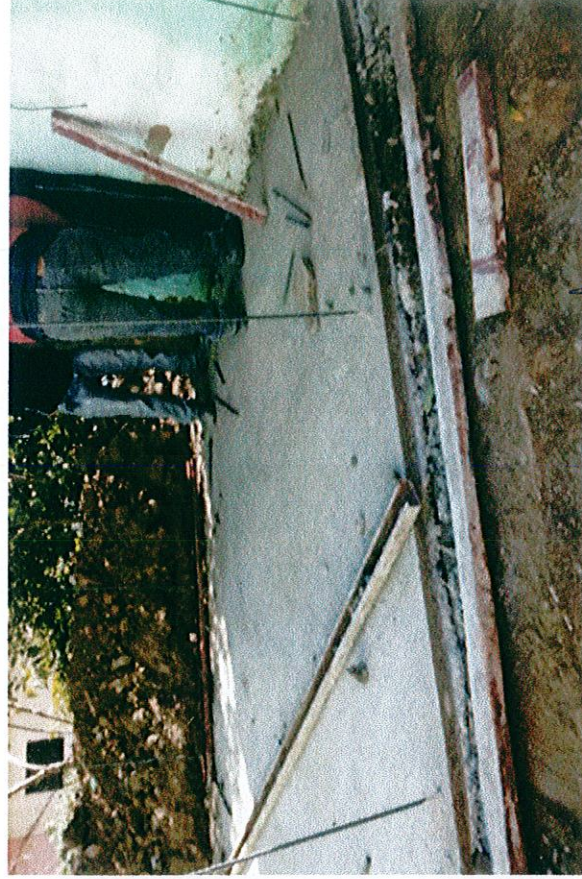


 ING. FILEMÓN LÓPEZ LÓPEZ
 URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.




 ING. JOSÉ DAVID DAMIAN RÍOS
 JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA


DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CROQUIS

ARCHIVO NUM. GENERADORES OBRA

OBRA:	"CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA DELEGACION ATEQUIZAYAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO"		LUGAR:	CD. GUZMAN, JAL.	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.
CONTRATISTA:	URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.		FECHA:	24 DE NOVIEMBRE DEL 2018	CONTRATO: DOP/FAIS33/2018-07
NIVEL:	EST. No. 1				

4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJANTE DE 4#				
---	--	--	--	--	--

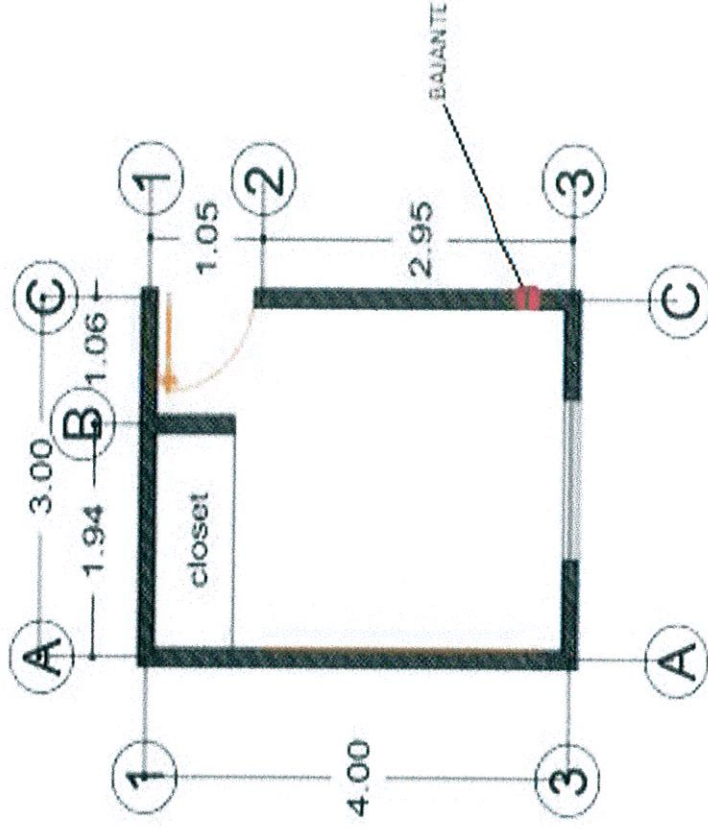

ING. FILEMÓN LÓPEZ LÓPEZ
URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.



ING. JOSÉ DAVID DAMIAN RIOS
JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

REPORTE FOTOGRAFICO

ARCHIVO NUM. GENERADORES OBRA

OBRA:	"CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA DELEGACION ATEQUIZAYAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO"	LUGAR:	CD. GUZMAN, JAL.	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.
CONTRATISTA:	URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	FECHA:	24 DE NOVIEMBRE DEL 2018	CONTRATO: DOPIFAIS33/2018-07
NIVEL:	EST. No. 1			

4 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJANTE DE 4#



Filemon Lopez Lopez
 ING. FILEMÓN LÓPEZ LÓPEZ
 URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.



Jose David Damian Rios
 ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS
 JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA



ARCHIVO NUM. GENERADORES OBRA

REPORTE FOTOGRAFICO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

NUMEROS GENERADORES

ARCHIVO NUM. GENERADORES OBRA

OBRA:	"CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA DELEGACION DE ATEQUIZAYAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO"	LUGAR:	CD. GUZMAN, JALISCO
CONTRATISTA:	URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V PLANO:		MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.
NIVEL:	EST. No. 1	FECHA:	24 DE NOVIEMBRE DEL 2018
		CONTRATO: DOP/FAIS33/2018-07	

CLAVE	CONCEPTO	UBICACION	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	UNIDAD	SUBTOTAL	REFERENCIA
5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE NOVAMURO A BASE DE TABIQUE HUECO TIPO VINTEX 12/12 Y TIPO MULTIPLEX 12/12 INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO QUE SEA NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	CALLE UNICA # 150D	4.000	0.000	2.56	2.000	M2	20.48	A-C DE 1 A 3
		puerta	0.000	0.940	2.20	1.000	M2	-2.07	A-C DE 1 A 3
		ventana	0.000	1.320	1.18	1.000	M2	-1.56	A-C DE 1 A 3
			2.76	0.000	2.56	2.000	M2	14.13	1-3 DE A-C
		pretil	0.75	0.000	2.71	1.000	M2	2.03	B DE 1-2
			4.00	0.000	0.13	2.000	M2	1.04	A-C DE 1 A 2
			2.76	0.000	0.130	2.000	M2	0.72	A-C DE 1 A 3
						TOTAL	M2	34.77	
		CALLE UNICA #22	4.000	0.000	2.56	2.000	M2	20.48	A-C DE 1 A 3
		puerta	0.000	0.940	2.20	1.000	M2	-2.07	A-C DE 1 A 3
		ventana	0.000	1.320	1.18	1.000	M2	-1.56	A-C DE 1 A 3
			2.76	0.000	2.56	2.000	M2	14.13	1-3 DE A-C
		pretil	0.75	0.000	2.71	1.000	M2	2.03	B DE 1-2
			4.00	0.000	0.13	2.000	M2	-1.04	A-C DE 1 A 2
			2.76	0.000	0.130	2.000	M2	0.72	A-C DE 1 A 3
						TOTAL	M2	34.77	

SUMA DE ESTA HOJA

M2 69.54



ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS
JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA

ING. FILEMON LOPEZ LOPEZ
URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

NUMEROS GENERADORES

ARCHIVO NUM. GENERADORES OBRA

	"CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA DELEGACION DE ATEQUIZAYAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO"		MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.
OBRA:	LUGAR: CD. GUZMAN, JALISCO		
CONTRATISTA:	URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V PLANO:	CONTRATO: DOP/FAIS33/2018-07	
NIVEL:	EST. No. 1		
	FECHA: 24 DE NOVIEMBRE DEL 2018		

CLAVE	CONCEPTO	UBICACION	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	UNIDAD	SUBTOTAL	REFERENCIA
5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE NOVAMURO A BASE DE TABIQUE HUECO TIPO VINTEX 12/12 Y TIPO MULTIPLEX 12/12 INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO QUE SEA NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	CALLE UNICA # 285 puerta	4.000	0.000	2.45	2.000	M2	19.60	A-C DE 1 A 3
		ventana	0.000	0.940	2.20	1.000	M2	-2.07	A-C DE 1 A 3
			2.760	0.000	2.45	2.000	M2	13.52	1-3 DE A -C
			1.32	0.000	1.18	1.000	M2	-1.56	C-C DE 2 A 3
			0.75	0.000	2.56	1.000	M2	1.92	B DE 1 A 2
		pretil	4.00	0.000	0.13	2.000	M2	1.04	A-A DE 1 A 3
			2.76	0.000	0.130	2.000	M2	0.72	1-3 DE A A C
						TOTAL	M2	33.17	
		CALLE UNICA #37 puerta	4.000	0.000	2.45	2.000	M2	19.60	A-C DE 1 A 3
		ventana	0.000	0.940	2.20	1.000	M2	-2.07	A-C DE 1 A 3
			2.760	0.000	2.45	2.000	M2	13.52	1-3 DE A -C
			1.32	0.000	1.18	1.000	M2	-1.56	C-C DE 2 A 3
			0.75	0.000	2.56	1.000	M2	1.92	B DE 1 A 2
		pretil	4.00	0.000	0.13	2.000	M2	1.04	A-A DE 1 A 3
			2.76	0.000	0.130	2.000	M2	0.72	1-3 DE A A C
						TOTAL	M2	33.17	
							M2	66.34	

SUMA DE ESTA HOJA



ING. FILEMÓN LOPEZ LOPEZ
URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS
JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

NUMEROS GENERADORES

ARCHIVO NUM. GENERADORES OBRA

	"CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA DELEGACION DE ATEQUIZAYAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO"		MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.
OBRA:	LUGAR:	CD. GUZMAN, JALISCO	
CONTRATISTA:	URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. PLANO:	CONTRATO: DOP/FAIS33/2018-07	
NIVEL:	EST. No. 1	24 DE NOVIEMBRE DEL 2018	

CLAVE	CONCEPTO	UBICACION	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	UNIDAD	SUBTOTAL	REFERENCIA
5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE NOVAMURO A BASE DE TABIQUE HUECO TIPO VINTEX 12/12 Y TIPO MULTIPLEX 12/12 INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO QUE SEA NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	CALLE UNICA #40 puerta ventana pretil	4.000 0.000 2.760 1.32 0.75 4.00 2.76	0.000 0.940 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	2.45 2.20 2.45 1.18 2.56 0.13 0.130	2.000 1.000 2.000 1.000 1.000 2.000 2.000	M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2	19.60 -2.07 13.52 -1.56 1.92 1.04 0.72 33.17	A-C DE 1 A 3 A-C DE 1 A 3 1-3 DE A -C C-C DE 2 A 3 B DE 1 A 2 A-A DE 1 A 3 1-3 DE A A C
		CALLE UNICA #69 puerta ventana pretil	4.000 0.000 2.760 1.32 0.75 4.00 2.76	0.000 0.940 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	2.45 2.20 2.45 1.18 2.56 0.13 0.130	2.000 1.000 2.000 1.000 1.000 2.000 2.000	M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2	19.60 -2.07 13.52 -1.56 1.92 1.04 0.72 33.17	A-C DE 1 A 3 A-C DE 1 A 3 1-3 DE A -C C-C DE 2 A 3 B DE 1 A 2 A-A DE 1 A 3 1-3 DE A A C
		TOTAL					M2	66.34	

SUMA DE ESTA HOJA



ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS
JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA

ING. FILEMÓN LÓPEZ LÓPEZ
URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

NUMEROS GENERADORES

ARCHIVO NUM. GENERADORES OBRA

"CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA DELEGACION DE ATEQUIZAYAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO"	LUGAR: CD. GUZMAN, JALISCO	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.
CONTRATISTA: URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. PLANO:	FECHA: 24 DE NOVIEMBRE DEL 2018	CONTRATO: DOP/FAIS33/2018-07
NIVEL: EST. No. 1		

CLAVE	CONCEPTO	UBICACION	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	UNIDAD	SUBTOTAL	REFERENCIA
5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE NOVAMURO A BASE DE TABIQUE HUECO TIPO VINTEX 12/12 Y TIPO MULTIPLEX 12/12 INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO QUE SEA NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	CALLE UNICA # 74	4.000	0.000	2.54	2.000	M2	19.60	A-C DE 1 A 3
		puerta	0.000	0.940	2.20	1.000	M2	-2.07	A-C DE 1 A 3
		ventana	2.760	0.000	2.45	2.000	M2	13.52	1-3 DE A -C
		pretil	1.32	0.000	1.18	1.000	M2	-1.56	C-C DE 2 A 3
			0.75	0.000	2.56	1.000	M2	1.92	B DE 1 A 2
			4.00	0.000	0.13	2.000	M2	1.04	A-A DE 1 A 3
			2.76	0.000	0.130	2.000	M2	0.72	1-3 DE A A C
						TOTAL	M2	33.170	

SUMA DE ESTA HOJA

M2 33.17

SUMA DE GENERADOR

M2 235.39


 ING. FILEMÓN LÓPEZ LÓPEZ
 URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.




 ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS
 JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA


DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CROQUIS

ARCHIVO NUM. GENERADORES OBRA

OBRA:	"CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA DELEGACION ATEQUIZAYAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO"	LUGAR:	CD. GUZMAN, JAL.	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.
CONTRATISTA:	URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	FECHA:	24 DE NOVIEMBRE DEL 2018	CONTRATO: DOP/FAIS33/2018-07
NIVEL:	EST. No. 1			

5	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE NOVAMURO A BASE DE TABIQUE HUECO TIPO VINTEX 12/12
---	---

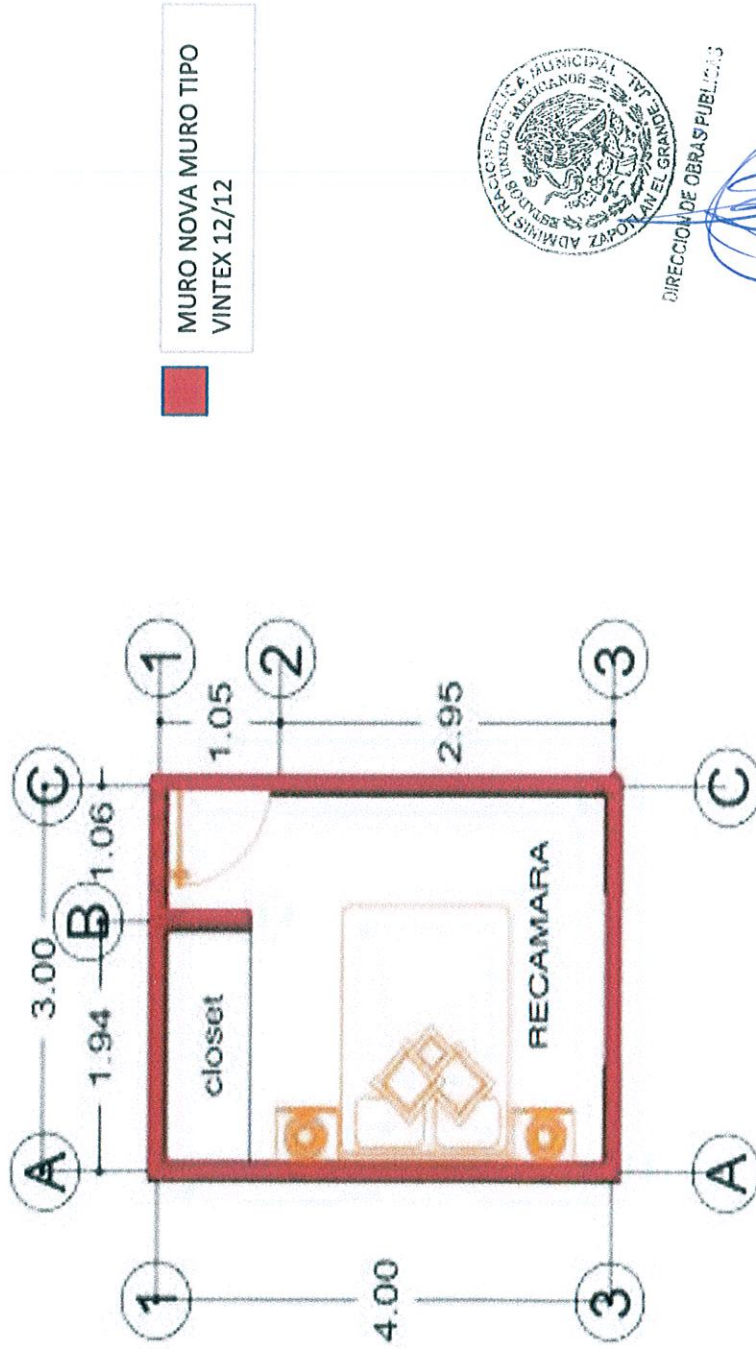


DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

[Handwritten Signature]

ING. FILEMON LÓPEZ LÓPEZ
URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS
JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA

OBRA:	"CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA DELEGACION ATEQUIZAYAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO"		MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.
CONTRATISTA:	URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.		CONTRATO: DOP/FAIS33/2018-07
NIVEL:	EST. No. 1	FECHA:	24 DE NOVIEMBRE DEL 2018
5	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE NOVAMURO A BASE DE TABIQUE HUECO TIPO VINTEX 12/12		

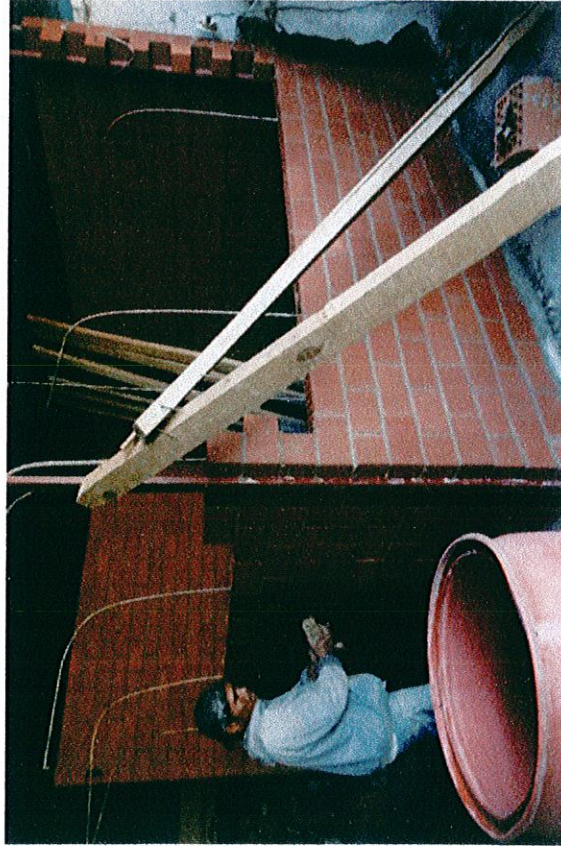


 ING. FILEMON LÓPEZ LÓPEZ
 URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.




 ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS
 JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 ASISTENTES GENERADORES OBRA

REPORTE FOTOGRAFICO

NUMEROS GENERADORES

ARCHIVO NUM. GENERADORES OBRA

	"CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA DELEGACION DE ATEQUIZAYAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO"		
OBRA:	LUGAR: CD. GUZMAN, JALISCO	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.	
CONTRATISTA:	URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V PLANO:	CONTRATO: DOP/FAIS33/2018-07	
NIVEL:	EST. No. 1		
	FECHA: 24 DE NOVIEMBRE DEL 2018		

CLAVE	CONCEPTO	UBICACION	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	UNIDAD	SUBTOTAL	REFERENCIA
	6 ANCLAJE DE 3 VARILLAS DE ACERO CORRUGADO DE 3/8" DE 3 MTS. DE LONGITUD PLOMEADO Y AMARRADO CON ALAMBRE RECOCIDO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO QUE SEA NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	CALLE UNICA #37	0.000	0.000	3.20	9.000	PZA	9.00	EJES A DEL 1 A 2
			0.000	0.000	3.20	8.000	PZA	8.00	C DE 1 A 3
			0.000	0.000	3.20	3.000	PZA	3.00	1 DE 1 A 3
			0.000	0.000	3.20	2.000	PZA	2.00	3 DE A -C
						TOTAL	PZA	22.00	
		CALLE UNICA #40	0.000	0.000	3.20	9.000	PZA	9.00	A DEL 1 A 2
			0.000	0.000	3.20	8.000	PZA	8.00	C DE 1 A 3
			0.000	0.000	3.20	3.000	PZA	3.00	1 DE 1 A 3
			0.000	0.000	3.20	2.000	PZA	2.00	3 DE A -C
						TOTAL	PZA	22.00	
		CALLE UNICA #69	0.000	0.000	3.20	9.000	PZA	9.00	A DEL 1 A 2
			0.000	0.000	3.20	8.000	PZA	8.00	C DE 1 A 3
			0.000	0.000	3.20	3.000	PZA	3.00	1 DE 1 A 3
			0.000	0.000	3.20	2.000	PZA	2.00	3 DE A -C
						TOTAL	PZA	22.00	
							PZA	66.00	

SUMA DE ESTA HOJA



ING. FILEMON LÓPEZ LÓPEZ
URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.



ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS
JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA

NUMEROS GENERADORES

ARCHIVO NUM. GENERADORES OBRA

	"CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA DELEGACION DE ATEQUIZAYAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO"		MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.
OBRA:	LUGAR:		
CONTRATISTA:	URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.		CONTRATO: DOP/FAIS33/2018-07
NIVEL:	EST. No. 1	FECHA:	24 DE NOVIEMBRE DEL 2018

CLAVE	CONCEPTO	UBICACION	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	UNIDAD	SUBTOTAL	REFERENCIA
	6 ANCLAJE DE 3 VARILLAS DE ACERO CORRUGADO DE 3/8" DE 3 MTS. DE LONGITUD PLOMEADO Y AMARRADO CON ALAMBRE RECOCIDO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO QUE SEA NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	CALLE UNICA #74	0.000	0.000	3.20	9.000	PZA	9.00	EJES A DEL 1 A 2
			0.000	0.000	3.20	8.000	PZA	8.00	C DE 1 A 3
			0.000	0.000	3.20	3.000	PZA	3.00	1 DE 1 A 3
			0.000	0.000	3.20	2.000	PZA	2.00	3 DE A -C
						TOTAL	PZA	22.00	

SUMA DE ESTA HOJA

PZA 22.00

SUMA DE GENERADOR

PZA 154.00


 ING. FILEMÓN LÓPEZ LÓPEZ
 URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.




 ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS
 JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA


DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CROQUIS

ARCHIVO NUM. GENERADORES OBRA

OBRA:	"CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA DELEGACION ATEQUIZAYAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO"	LUGAR:	CD. GUZMAN, JAL.
CONTRATISTA:	URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	FECHA:	24 DE NOVIEMBRE DEL 2018
NIVEL:	EST. No. 1	CONTRATO: DOP/FAIS33/2018-07	

6	ANCLAJE DE 3 VARILLAS DE ACERO CORRUGADO DE 3/8"
---	--

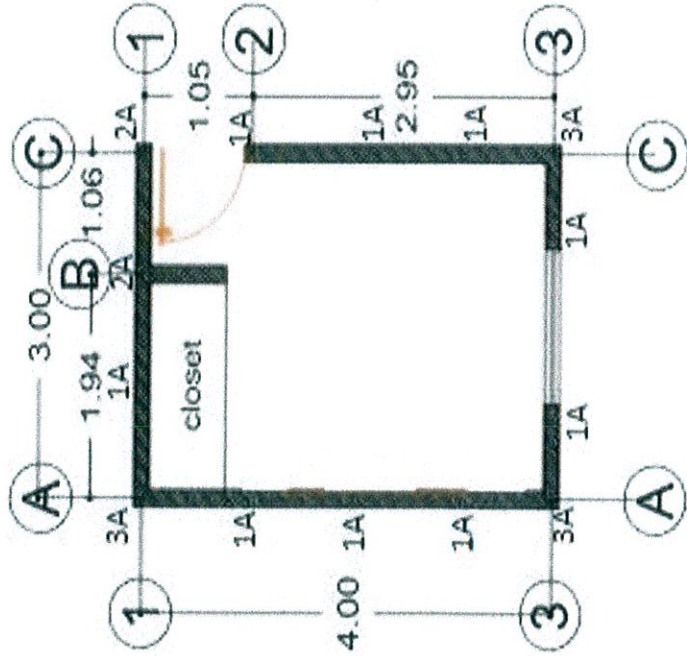

- 3A - 3 VARILLAS DE 3/8"
- 2A - 2 VARILLAS DE 3/8"
- 1A - 1 VARILLAS DE 3/8"

[Signature]
 ING. FILEMÓN LÓPEZ LÓPEZ
 URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.





[Signature]

ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS
 JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

OBRA:	"CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA DELEGACION ATEQUIZAYAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO"			MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.
CONTRATISTA:	URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.			CONTRATO: DOPIFAIS3/2018-07
NIVEL:	EST. No. 1	LUGAR:	CD. GUZMAN, JAL.	FECHA:
			24 DE NOVIEMBRE DEL 2018	
6	ANCLAJE DE 3 VARILLAS DE ACERO CORRUGADO DE 3/8"			

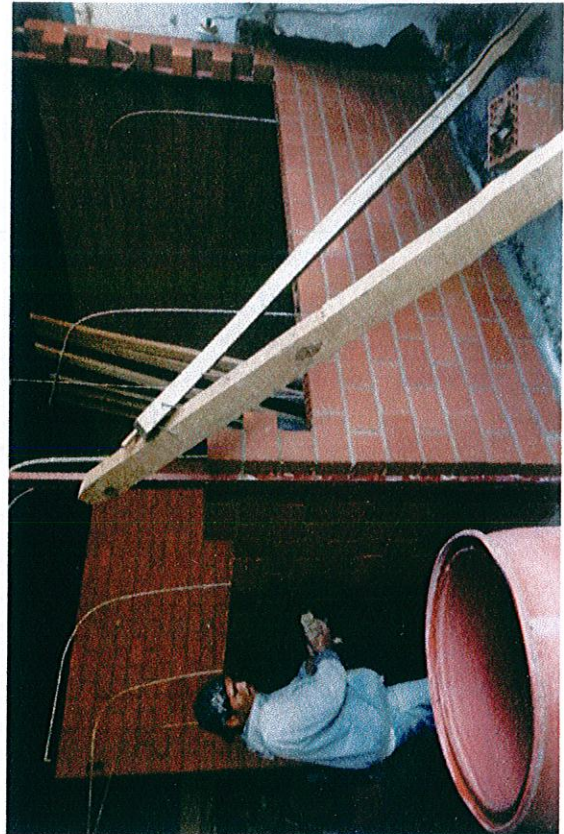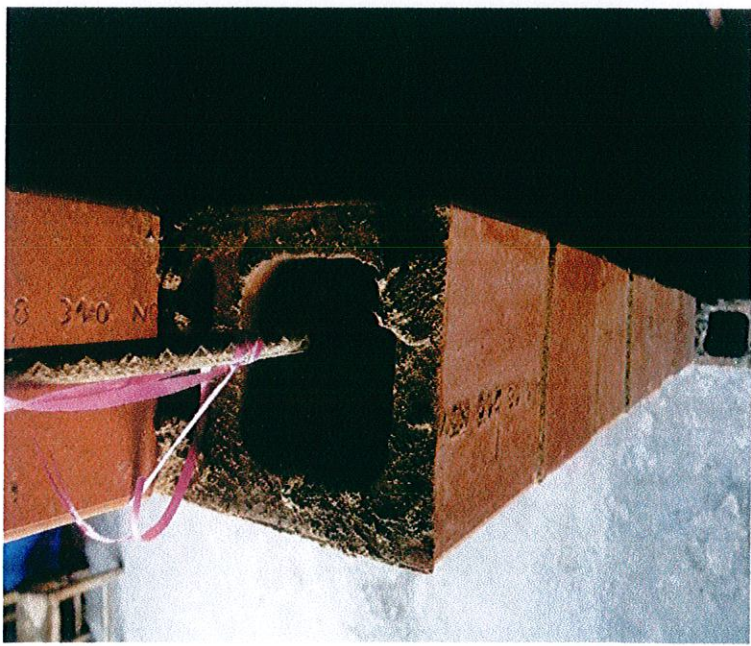


 ING. FILEMÓN LÓPEZ LÓPEZ
 URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.


 ING. JOSÉ SAAVEDRA RÍOS
 JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA

REPORTE FOTOGRAFICO

ARCHIVO NUM. GENERADORES OBRA

NUMEROS GENERADORES

ARCHIVO NUM. GENERADORES OBRA

	"CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA DELEGACION DE ATEQUIZAYAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO"		
OBRA:	LUGAR: CD. GUZMAN, JALISCO	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.	
CONTRATISTA:	URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. PLANO:	CONTRATO: DOP/FAIS33/2018-07	
NIVEL:	EST. No. 1	FECHA:	24 DE NOVIEMBRE DEL 2018

CLAVE	CONCEPTO	UBICACION	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	UNIDAD	SUBTOTAL	REFERENCIA
	7 COLADO DE CASTILLO DE CONCRETO CALLE UNICA #150D (F'C=150KG/CM2) AHOGADO EN MURO SECCION (10X9) CMS. 2 PZAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO QUE SEA NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION								EJES
			0.000	0.090	2.83	7.000	ML	19.81	A-A DE 1A 3
			0.000	0.090	2.83	6.000	ML	16.98	C-C DE 1A 3
			0.000	0.090	2.83	3.000	ML	8.49	1-1 DE A-C
			0.000	0.090	2.83	2.000	ML	5.66	3-3 DE A-C
						TOTAL	ML	50.94	
		CALLE UNICA # 22	0.000	0.090	2.83	7.000	ML	19.81	A-A DE 1A 3
			0.000	0.090	2.83	6.000	ML	16.98	C-C DE 1A 3
			0.000	0.090	2.83	3.000	ML	8.49	1-1 DE A-C
			0.000	0.090	2.83	2.000	ML	5.66	3-3 DE A-C
						TOTAL	ML	50.94	
		CALLE UNICA #285	0.000	0.090	2.73	7.000	ML	19.11	A-A DE 1A 3
			0.000	0.090	2.73	6.000	ML	16.38	C-C DE 1A 3
			0.000	0.090	2.73	3.000	ML	8.19	1-1 DE A-C
			0.000	0.090	2.73	2.000	ML	5.46	3-3 DE A-C
						TOTAL	ML	49.14	
							ML	151.02	


 ING. FILEMÓN LÓPEZ LÓPEZ
 URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.




 ING. JOSÉ DAVID DAMIAN RIOS
 JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA

SUMA DE ESTA HOJA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

NUMEROS GENERADORES

ARCHIVO NUM. GENERADORES OBRA

OBRA:	"CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA DELEGACION DE ATEQUIZAYAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO"	LUGAR:	CD. GUZMAN, JALISCO
CONTRATISTA:	URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V PLANO:	FECHA:	24 DE NOVIEMBRE DEL 2018
NIVEL:	EST. No. 1	CONTRATO: DOP/FAIS33/2018-07	
		MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.	

CLAVE	CONCEPTO	UBICACION	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	UNIDAD	SUBTOTAL	REFERENCIA
	7 COLADO DE CASTILLO DE CONCRETO (F'C=150KG/CM2) AHOGADO EN MURO SECCION (10X9) CMS. 2 PZAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO QUE SEA NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	CALLE UNICA #137	0.000	0.090	2.83	7.000	ML	19.81	EJES A-A DE 1A 3
			0.000	0.090	2.83	6.000	ML	16.98	C-C DE 1A 3
			0.000	0.090	2.83	3.000	ML	8.49	1-1 DE A-C
			0.000	0.090	2.83	2.000	ML	5.66	3-3 DE A-C
						TOTAL	ML	49.14	
		CALLE UNICA # 40	0.000	0.090	2.83	7.000	ML	19.81	A-A DE 1A 3
			0.000	0.090	2.83	6.000	ML	16.98	C-C DE 1A 3
			0.000	0.090	2.83	3.000	ML	8.49	1-1 DE A-C
			0.000	0.090	2.83	2.000	ML	5.66	3-3 DE A-C
						TOTAL	ML	49.14	
		CALLE UNICA #69	0.000	0.090	2.73	7.000	ML	19.11	A-A DE 1A 3
			0.000	0.090	2.73	6.000	ML	16.38	C-C DE 1A 3
			0.000	0.090	2.73	3.000	ML	8.19	1-1 DE A-C
			0.000	0.090	2.73	2.000	ML	5.46	3-3 DE A-C
						TOTAL	ML	49.14	
							ML	147.42	

Filemon Lopez Lopez

SUMA DE ESTA HOJA

ING. FILEMÓN LÓPEZ LÓPEZ
URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.



Jose David Damian Rios

ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS
JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

NUMEROS GENERADORES

ARCHIVO NUM. GENERADORES OBRA

OBRA:	"CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA DELEGACION DE ATEQUIZAYAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO"	LUGAR:	CD. GUZMAN, JALISCO
CONTRATISTA:	URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V	PLANO:	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.
NIVEL:	EST. No. 1	FECHA:	CONTRATO: DOP/FAIS33/2018-07
			24 DE NOVIEMBRE DEL 2018

CLAVE	CONCEPTO	UBICACION	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	UNIDAD	SUBTOTAL	REFERENCIA
	7 COLADO DE CASTILLO DE CONCRETO (F'C=150KG/CM2) AHOGADO EN MURO SECCION (10X9) CMS. 2 PZAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO QUE SEA NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	CALLE UNICA #74	0.000	0.090	2.83	7.000	ML	19.81	EJES A-A DE 1A 3
			0.000	0.090	2.83	6.000	ML	16.98	C-C DE 1A 3
			0.000	0.090	2.83	3.000	ML	8.49	1-1 DE A-C
			0.000	0.090	2.83	2.000	ML	5.66	3-3 DE A-C
						TOTAL	ML	49.14	

SUMA DE ESTA HOJA

ML 49.14


SUMA DE GENERADOR
ING. FILEMÓN LÓPEZ LÓPEZ
URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.


SUMA DE GENERADOR
ING. JOSÉ DAVID DAMIÁN RÍOS
JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA

ML 347.58




DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CROQUIS

ARCHIVO NUM. GENERADORES OBRA

OBRA:	"CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA DELEGACION ATEQUIZAYAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO"		LUGAR:	CD. GUZMAN, JAL.	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.
CONTRATISTA:	URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.		FECHA:	24 DE NOVIEMBRE DEL 2018	CONTRATO: DOPIFAIS33/2018-07
NIVEL:	EST. No. 1				

7	COLADO DE CASTILLO DE CONCRETO (F'c=150KG/CM2)				
---	--	--	--	--	--

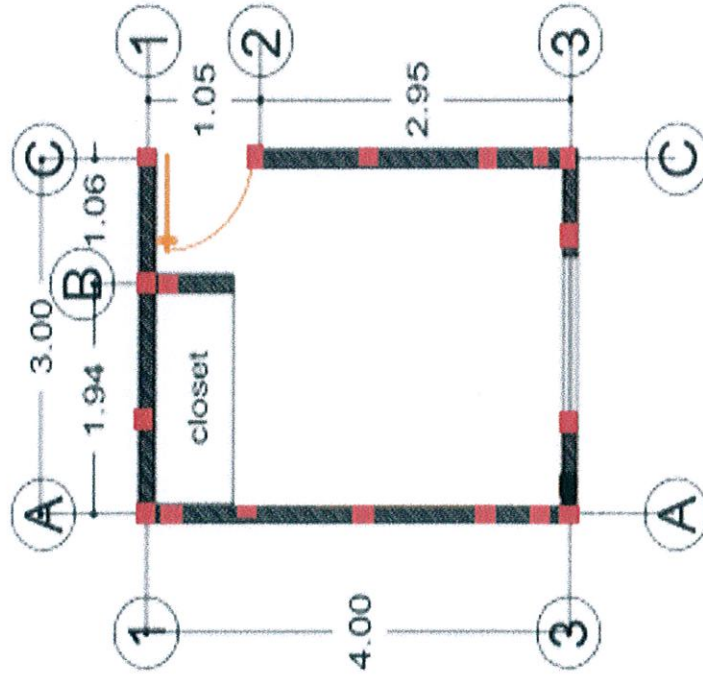

CASTILLOS SECCION
(10X9) MTS



Filemón López López

ING. FILEMÓN LÓPEZ LÓPEZ
URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS
JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA

OBRA: CONTRATISTA: NIVEL:	"CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA DELEGACION ATEQUIZAYAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO" URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. EST. No. 1	LUGAR: FECHA:	CD. GUZMAN, JAL. 24 DE NOVIEMBRE DEL 2018	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL. CONTRATO: DOP/FAIS33/2018-07
7	COLADO DE CASTILLO DE CONCRETO (F'c=150KG/CM2)			



Filemon López López

ING. FILEMÓN LÓPEZ LÓPEZ
 URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

David Damián Ríos
 ING. JOSÉ DAVID DAMIAN RÍOS
 JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA
