



D CONCREFOCC SA DE CV

DCO980225AW7

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
Cardenales, 57, Residencial Santa Bárbara, 28017, COLIMA, Colima, México
Tel. 3123302677

CLIENTE

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE
MZG8501012NA

USO CFDI: G03 - Gastos en general
COLON, 62, Ciudad Guzmán Centro, 49000, Ciudad Guzmán, Zapotlán el Grande,
Jalisco, México

Factura 7056

FOLIO FISCAL (UUID)

C981F031-19EC-4776-860B-EA1BA4445CA4

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000403498740

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000401403109

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2018-12-05T12:36:44

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FLI081010EK2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2018-12-05T12:25:33

LUGAR DE EXPEDICIÓN

28017

CONCEPTOS			Precio Unitario	Importe
Cantidad	Unidad	Descripción		
1.00	E48 - LOTE	RECIBIMOS DE H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO LA CANTIDAD DE \$36,934.04 (TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 04/100 M.N.) POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 1 RELATIVO A LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE DOMO CENTRO BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 226" UBICADO: CALLE ARQUITECTO VICENTE MENDIOLA NO. 26 EN LA COLONIA LOMA BONITA EN CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO; PROGRAMA CORRESPONDIENTE AL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN 2018 CONVENIO B, APROBADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018 CONTRATO DOP/FFIB/2018-04/013 FIANZA DE ANTICIPO NO.4858-00039-9 FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 4858-00040-7 COMPAÑIA AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. DEDUCCIONES 5 AL MILLAR \$2,585.16, 2 AL MILLAR \$1,034.06, MONTO PARA EFECTO DE PAGO \$33,314.82	\$ 31,839.69	\$ 31,839.69

Clave Prod. Serv. - 80111618 Servicios temporales de construcción
Impuestos:
Traslados:
002 IVA Base - \$ 31,839.69 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 5,094.35



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PROGRAMAS COPLADEMUN Y VINCULACIÓN CON DELEGACIONES

11 DIC 2018 Ana

RECIBIDO

IMPORTE CON LETRA

TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS, 04/100 MXN

SUBTOTAL	\$ 31,839.69
TRASLADO IVA TASA 0.160000	\$ 5,094.35
TOTAL	\$ 36,934.04

TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
MONEDA

I - Ingreso
03 - Transferencia electrónica de fondos
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso Mexicano



SELLO DIGITAL DEL CFDI
IAg4AyMyNsZNCfQsIN67JQ+LVnI072+M913shbKkEYAFROXk8mvGHmG32yxHSrnl8i4PV60bK1W1zDddxU7xtXThEb20GSV8ximphVNV1qgZBYV701eeC/ygXIIe0hTGgVUIkAg0wyBz/BWdmZf5CfmEaj8YmzqUGDeUYqGr+EuqHm5Z5gK6FJtIleHDOhtSAbFNRhM6iISWPMrs3I9L4CLDHdmdGjdysiShWujn840Je9/rpCHJPNnm3kd4rGaimeCAaAvvkBYi3TtYK8D6GwnL2zJ7zwbvUtyq1Dd1DxpapwZVnmNMFmZsaQK7r/QOCsbUPnLT/pzxFUEmDg==

SELLO DIGITAL DEL SAT
98jIS8w/K9DZpP7Y/D3cu4Aliv8AGp3RkKdQmaRWk3uspK0uoMDvR22gxmrIPEEcoTsEEvpEE10ILuMV41S/rku5Ga99OYtJUCJkuvuQgbqFJRIYx62waH/guvtviJ0s8adPv8R8Nxj9O/XR+I2CwGYfcij5NkmtogLZbFE1LVNrbJbsIFBW6cWPPB4z6XYwjkp7ugKJx+Ye77/aaKciwC6i7m+tsOP112cbZhdIombOCXsKyc/Dook6vblJ5H2O32IME95AK9jIMz859Yf+tz/hdatvaVcA2hbcypjnq1qmcoGUEiQGDGPbTn6lz7thesi9h3GY//QM1waOQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
||1.1|C981F031-19EC-4776-860B-EA1BA4445CA4|2018-12-05T12:36:44|FLI081010EK2|IAg4AyMyNsZNCfQsIN67JQ+LVnI072+M913shbKkEYAFROXk8mvGHmG32yxHSrnl8i4PV60bK1W1zDddxU7xtXThEb20GSV8ximphVNV1qgZBYV701eeC/ygXIIe0hTGgVUIkAg0wyBz/BWdmZf5CfmEaj8YmzqUGDeUYqGr+EuqHm5Z5gK6FJtIleHDOhtSAbFNRhM6iISWPMrs3I9L4CLDHdmdGjdysiShWujn840Je9/rpCHJPNnm3kd4rGaimeCAaAvvkBYi3TtYK8D6GwnL2zJ7zwbvUtyq1Dd1DxpapwZVnmNMFmZsaQK7r/QOCsbUPnLT/pzxFUEmDg==|00001000000403498740||

11 DIC 2018 Ana

RECIBIDO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONTROL DE OBRA PUBLICA

FECHA: 03/12/2018

Contrato: DOP/FFIB/2018-04/013
 Recurso: "FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN 2018 Convenio B", aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2018,
 Contratista: D' CONCREFOCC SA DE CV
 Obra: "CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CENTO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS No. 226"
 Ubicación: Calle Arq. Vicente Mendiola Número 26, colonia Loma Bonita, entre la calle Maguey y Av. Juan José Arreola en Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán
 Localidad: CIUDAD GUZMAN, JALISCO. Municipio: ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.
 Fecha de Inicio: 07 DE OCTUBRE Fecha de Término: 15 DE DICIEMBRE
 Estimación No.: 1 (UNO) Periodo: 07/10/2018 Al: 20/10/2018

Resumen de Documento		
+ Importe de la Estimación	\$42,452.92	\$42,452.92
+ Aditiva	\$0.00	\$0.00
- Deductiva	\$0.00	\$0.00
+ IVA: 16%	\$6,792.47	\$49,245.39
- Amortización	\$12,311.35	\$36,934.04
Total	\$36,934.04	\$36,934.04

Avance	
Fecha Inicial:	07 DE OCTUBRE
Financiero:	31.16%
Fisico %	8.21%
Fecha:	03/12/2018

Techo Financiero	Importe	Acumulado	Importe
Presupuesto Base	\$599,757.12	Esta Estimacion	\$49,245.39
Convenio Adicional	\$0.00	Acumulado Anterior	\$0.00
Suma Escalatorias	\$0.00	Acumulado Actual	\$49,245.39
Total	\$599,757.12	Saldo	\$550,511.73

Anticipo		
Anticipo	25.00%	\$149,939.28
Amort. Del acumulado		\$0.00
Esta amortización		\$12,311.35
Total Amortizado		\$12,311.35
Saldo por amortizar		\$137,627.93

Detalle	Federal	Estatal	Municipio
Importe	\$31,839.69	\$0.00	\$0.00
Escalatoria	\$0.00	\$0.00	\$0.00
IVA	\$5,094.35	\$0.00	\$0.00
Total a Facturar	\$36,934.04	\$0.00	\$0.00
Deducción del 5 al millar (SFP)	\$2,585.16	\$0.00	\$0.00
Deducción del 2 al millar (CMIC)	\$1,034.06	\$0.00	\$0.00
Total a Pagar	\$33,314.82	\$0.00	\$0.00

Sumas	
	\$31,839.69
	\$0.00
	\$5,094.35
	\$36,934.04
	\$2,585.16
	\$1,034.06
	\$33,314.82

ARQ. JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS


ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS
JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA PUBLICA

EMPRESA D' CONCREFOCC, SA DE CV
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ING. RAUL ROMERO ARELLANO
REPRESENTANTE LEGAL



D' CONCREFOCC, SA DE CV



"CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CENITO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS No. 22s"

domingo, 07 de octubre de 2018
sábado, 15 de diciembre de 2018

FECHA DE INICIO
FECHA DE TERMINO

OBRA:
UBICACIÓN:
CONTRATO:
LOCALIDAD:
MUNICIPIO:
ESTADO:

CBTIS No. 226
DOPIFIB/2018-08/019
CD. GUZMAN
ZAPOTLAN EL GRANDE
JALISCO

PERIODO DE TRABAJO: DEL 07 AL 20 DE OCTUBRE DE 2018

CUERPO DE ESTIMACION

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMENES			IMPORTE				SALDO		
			PRESUP. BASE	ESTIMACION ACUMULADA	ESTA ESTIMACION	SALDO	PRECIO UNITARIO	PRESUP. BASE	ESTIMACION ACUMULADA		ESTA ESTIMACION	
	PRELIMINARES											
TRA-613.1	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO SENCIBLEMENTE PLANO UTILIZANDO EQUIPO TOPOGRAFICO. ESTABLECIENDO BANCOS DE NIVEL Y EJES DE REFERENCIA INCLUYE: ESTACAS, PINTURA Y TODO LO QUE SEA NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	246.60	0.00	246.60	0.00	\$6.70	\$1,652.22	\$0.00	\$1,652.22	\$0.00	
DEM-001	DEMOLICIÓN DE FIRME DE CONCRETO DE 8 CM., DE ESPESOR A MANO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	10.00	0.00	10.00	0.00	\$66.46	\$664.60	\$0.00	\$664.60	\$0.00	
	CIMENTACION											
Z10	ZAPATA AISLADA DE 1.0X1.0X0.2 M. PERALTE PROMEDIO DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=250 KG/CM2. ARMADA CON VARILLA DEL NO. 4 A CADA 0.235 M. EN AMBOS SENTIDOS Y DADO DE 0.4X0.4X1.00 M. DE ALTURA, ARMADO CON 8 VARS # 4, Y ESTRIBOS # 3 @ 0.1 M. INCLUYE: EXCAVACION A MANO EN TERRENO COMPACTO, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HABILITADO, PLANTILLA, CIMBRADO ACABADO COMÚN, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, RELLENO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	10.00	0.00	10.00	0.00	\$3,645.56	\$36,455.60	\$0.00	\$36,455.60	\$0.00	
TOTAL DE HOJA 1										\$38,772.42		



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA PUBLICA
DSE DAVID DAMIAN RIOS

REGISTRACION DE OBRAS PUBLICAS

REPRESENTANTE LEGAL
ING. RAUL ROMERO ARELLANO

[Handwritten signature]

D' CONCREFOCC, SA DE CV



OBRA : "CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS No. 226"
UBICACIÓN : CBTIS No. 226
CONTRATO : DOP/FFIB/2018-08/019
LOCALIDAD : CD. GUZMAN
MUNICIPIO : ZAPOTLAN EL GRANDE
ESTADO : JALISCO

FECHA DE INICIO
FECHA DE TERMINO

domingo, 07 de octubre de 2018
 sábado, 15 de diciembre de 2018

PERIODO DE TRABAJO : DEL 07 AL 20 DE OCTUBRE DE 2018

CUERPO DE ESTIMACION

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMENES			IMPORTE			ESTIMACION ACUMULADA	ESTIMACION ACUMULADA	SALDO
			PRESUP. BASE	ESTIMACION ACUMULADA	ESTA ESTIMACION	SALDO	PRECIO UNITARIO	PRESUP. BASE			
	ALBAÑILERIA										
CON-01	REPOSICIÓN DE PISO DE 6 CM ACABADO ESCOBILLADO, DE CONCRETO FC= 150 KG/CM2. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, NIVELACIÓN, CIMBRADO DE FRONTERAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	\$3,680.50	\$3,680.50	\$0.00	\$0.00
	ESTRUCTURA METALICA										
EST-001	ESTRUCTURA METALICA INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA, APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO, MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	KG	4729.80	0.00	0.00	4729.80	0.00	\$59.70	\$282,366.88	\$0.00	\$282,366.88
	CUBIERTA DE LONA										
CUB-01	CUBIERTA DE NAVE, SISTEMA DE LONA BLACKOUT DE 21 ONZAS O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, ANCLAJES, ELEVACION, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	363.521	0.00	0.00	363.52	0.00	\$427.91	\$155,554.27	\$0.00	\$155,554.27
	PINTURA										
PINT-001	PINTURA DE ESMALTE, EN ESTRUCTURA DE METALICA, APLICADA CON COMPRESORA, A DOS MANOS, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	KG	4729.797	0.00	0.00	4729.80	0.00	\$7.75	\$36,655.93	\$0.00	\$36,655.93
TOTAL DE HOJA 2									\$3,680.50		
SUB-TOTAL									\$42,452.92		
IVA (16%)									\$6,792.47		
TOTAL									\$49,245.39		



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA PUBLICA
 DSE DAVID DAMIAN RIOS

REPRESENTANTE LEGAL
 ING. RAUL ROMERO ARELLANO



H.AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
NUMEROS GENERADORES

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CENITO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS No. 226" DEPENDENCIA: H.AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE ESTIMACION No: 1(UNO)

FECHA:	PERIODO:	EJE	TRAMO	PZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	UNID.	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
01 DE DICIEMBRE DE 2018	07 AL 20 DE OCTUBRE DE 2018	1-5	A-B		18.00	13.70		M2	246.60	
<p>Concepto</p> <p>TRA-813.1 TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO SENCIBLEMENTE PLANO UTILIZANDO EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO BANCOS DE NIVEL Y EJES DE REFERENCIA INCLUYE: ESTACAS, PINTURA Y TODO LO QUE SEA NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p>										

TOTAL: 246.60

ING. RAUL ROMERO ARELLANO


REPRESENTANTE LEGAL



TOTAL: 246.60

ING. JOSE DAVID GUAMAN RIOS

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS




H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CROQUIS

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS No. 226"
DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE ESTIMACIÓN No. 1 (UNO)
FECHA: 01 DE DICIEMBRE DE 2018 PERIODO: 07 AL 20 DE OCTUBRE DE 2018

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO SENCIBLEMENTE PLANO UTILIZANDO EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO BANCOS DE NIVEL Y EJES DE REFERENCIA INCLUYE: ESTACAS, PINTURA Y TODO LO QUE SEA NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

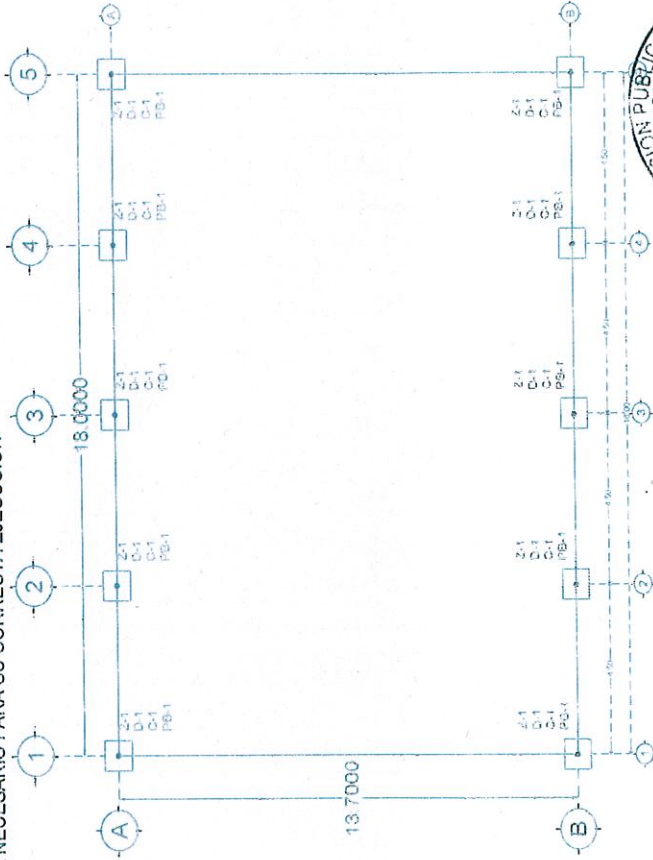

ING. RAUL PONTERO ARELLANO
REPRESENTANTE LEGAL



ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS
COMITÉ DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA


DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS





H. AYUNTAMIENTO DE CD. GUZMAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

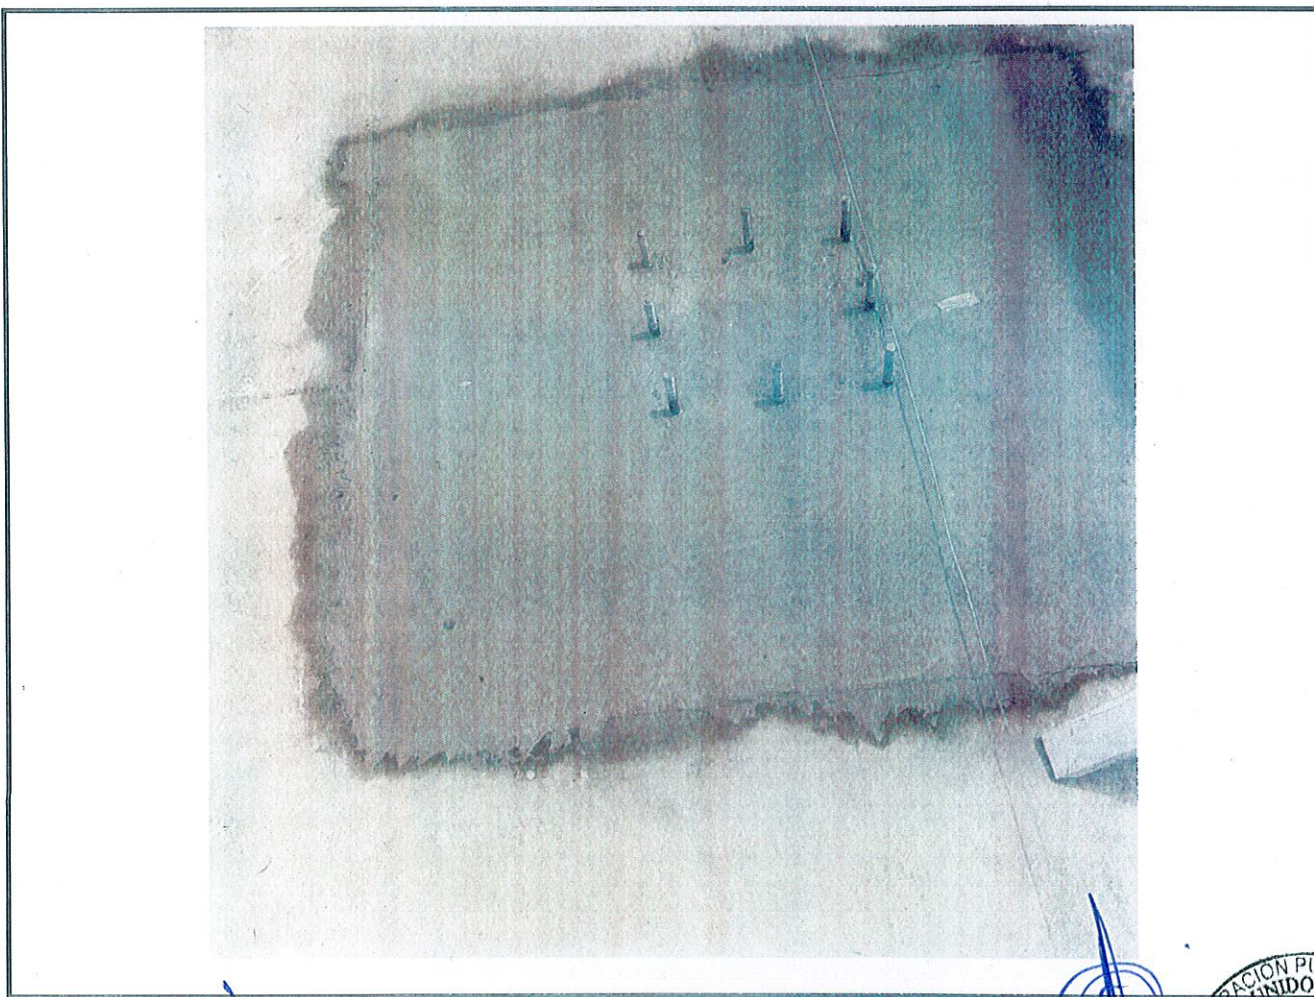OBRA:		CONTRATISTA: D' CONCREFOCC , SA DE CV	
"CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CEN TO DE BACHILLERATO		ESTIMACION N° 1 (UNO)	
TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS No. 226"		LOCALIDAD: CD. GUZMAN JALISCO	
CLAVE	DESCRIPCION		
TRA-613.1	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO SENCIBLEMENTE PLANO UTILIZANDO EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO BANCOS DE NIVEL Y EJES DE REFERENCIA INCLUYE: ESTACAS, PINTURA Y TODO LO QUE SEA NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION		
REPORTE FOTOGRAFICO			




REPRESENTANTE LEGAL
ING. RAUL ROMERO ARELLANO


JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE
OBRA PUBLICA
ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS





DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

H.AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
CROQUIS

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS No. 226"
FECHA: 01 DE DICIEMBRE DE 2018 **PERIODO:** 07 AL 20 DE OCTUBRE DE 2018
DEPENDENC H.AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE ESTIMACION No: 1 (UNO)


DEMOLICIÓN DE FIRME DE CONCRETO DE 8 CM., DE ESPESOR A MANO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

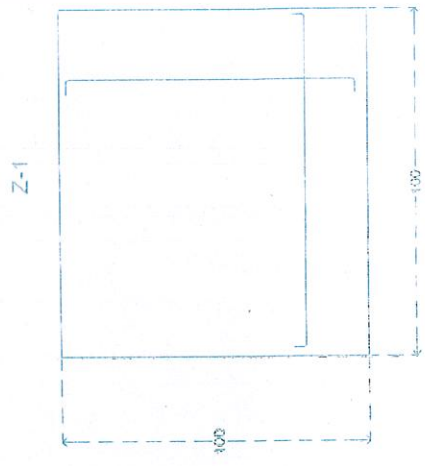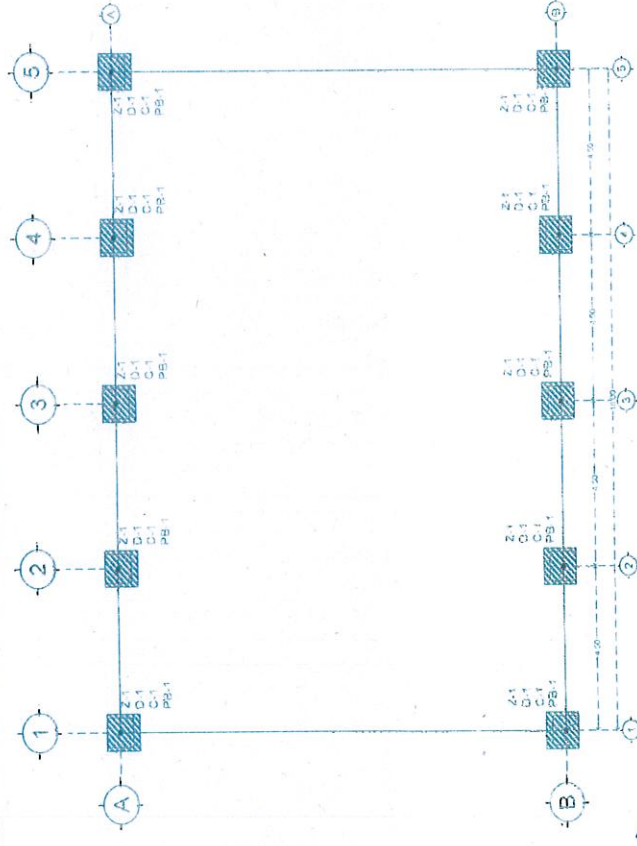

ING. PAUL ROMERO ARELLANO
 REPRESENTANTE LEGAL


 SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA
 ING. JOSE CARLOS DAMIAN RIOS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS




H. AYUNTAMIENTO DE CD. GUZMAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA:		CONTRATISTA: D' CONCREFOCC , SA DE CV
"CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CEN TO DE BACHILLERATO		ESTIMACION N° 1 (UNO)
TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS No. 226"		LOCALIDAD: CD. GUZMAN JALISCO
CLAVE	DESCRIPCION	
DEM-001	DEMOLICIÓN DE FIRME DE CONCRETO DE 8 CM., DE ESPESOR A MANO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	


REPORTE FOTOGRAFICO

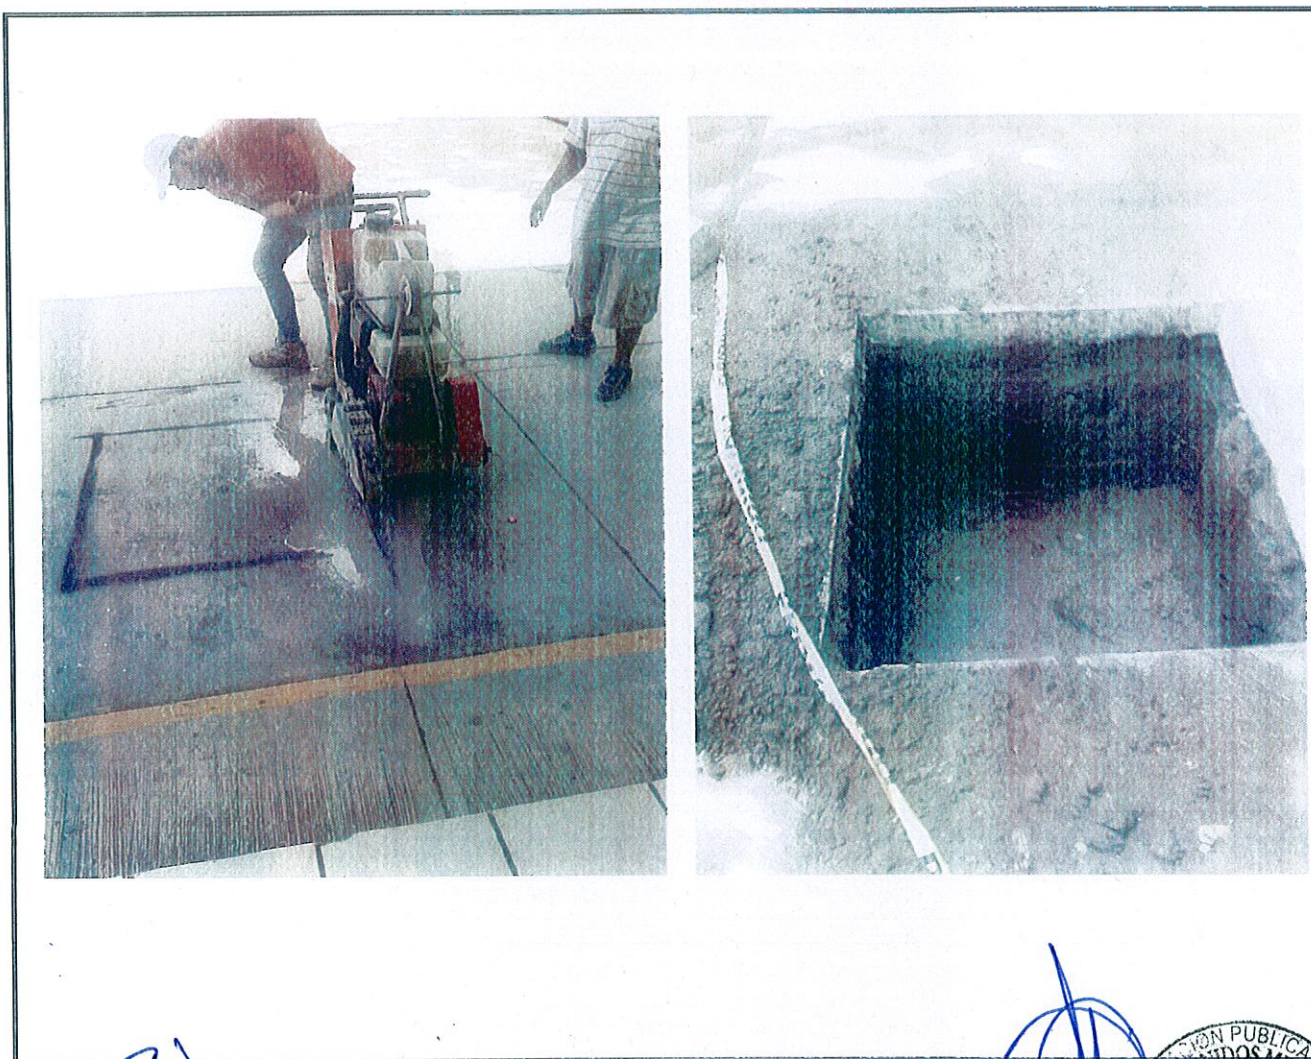


REPRESENTANTE LEGAL
ING. RAUL ROMERO ARELLANO


JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE
OBRA PUBLICA
ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS



H.AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO


DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
CROQUIS

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS No. 226"

DEPENDENCIA: H.AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE ESTIMACION No. 1 (UNO)

FECHA: 01 DE DICIEMBRE DE 2018 PERIODO: 07 AL 20 DE OCTUBRE DE 2018

ZAPATA AISLADA DE 1.0X1.0X0.2 M. PERALTE PROMEDIO DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA DEL NO. 4 A CADA 0.235 M. EN AMBOS SENTIDOS Y DADO DE 0.4X0.4X1.00 M. DE ALTURA, ARMADO CON 8 VARS.# 4, Y ESTRIBOS # 3 @ 0.1 M. INCLUYE: EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO COMPACTO.

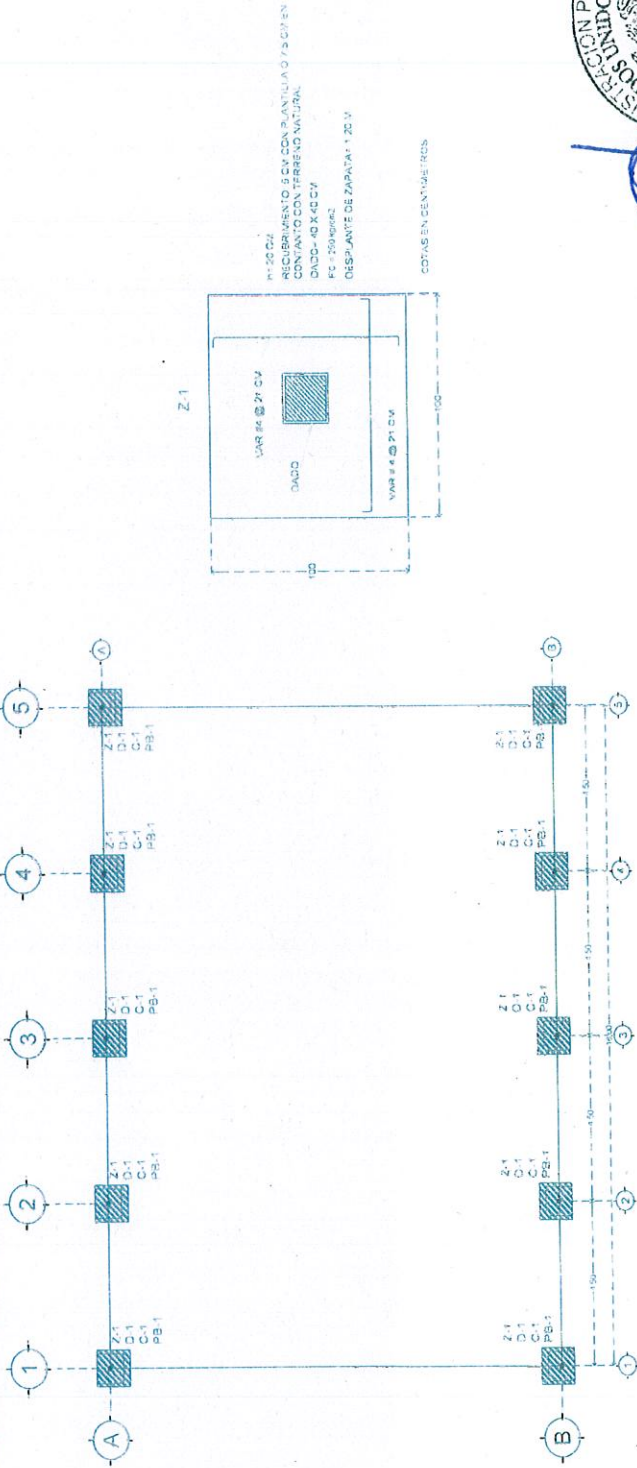

ING. RAJUL ROMERO ARELLANO
REPRESENTANTE LEGAL

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE CD. GUZMAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA:		CONTRATISTA: D' CONCREFOCC , SA DE CV
"CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CEN TO DE BACHILLERATO		ESTIMACION N° 1 (UNO)
TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS No. 226"		LOCALIDAD: CD. GUZMAN JALISCO
CLAVE	DESCRIPCION	
Z10	ZAPATA AISLADA DE 1.0X1.0X0.2 M. PERALTE PROMEDIO, DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA DEL NO. 4 A CADA 0.235 M. EN AMBOS SENTIDOS Y DADO DE 0.4X0.4X1.00 M. DE ALTURA, ARMADO CON 8 VARS.# 4, Y ESTRIBOS # 3 @ 0.1 M. INCLUYE: EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO COMPACTO, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HABILITADO, PLANTILLA, CIMBRADO ACABADO COMÚN, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, RELLENO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	
REPORTE FOTOGRAFICO		




REPRESENTANTE LEGAL
ING. RAUL ROMERO ARELLANO

JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE
OBRA PUBLICA
ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



H.AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
NUMEROS GENERADORES

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CENTO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS No. 226" DEPENDENCIA: H.AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE ESTIMACION No: 1(UNO)

FECHA: 01 DE DICIEMBRE DE 2018 PERIODO: 07 AL 20 DE OCTUBRE DE 2018

CONCEPTO	EJE	TRAMO	PZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	UNID.	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
CON-01 REPOSICIÓN DE PISO DE 6 CM ACABADO ESCOBILLADO, DE CONCRETO F'c= 150 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, NIVELACIÓN, CIMBRADO DE FRONTERAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	A	1-6	5.00	1.00	1.00		M2	5.00	
	B	1-6	5.00	1.00	1.00		M2	5.00	
<p align="right">TOTAL: 10.00</p>									



ING. RAUL ROMERO ARELLANO

REPRESENTANTE LEGAL



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

H.AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
CROQUIS

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS No. 226" ESTIMACION No. 1 (UNO)

FECHA: 01 DE DICIEMBRE DE 2018 PERIODO: 07 AL 20 DE OCTUBRE DE 2018

REPOSICIÓN DE PISO DE 6 CM ACABADO ESCOBILLADO, DE CONCRETO FC= 150 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, NIVELACIÓN, CIMBRADO DE FRONTERAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

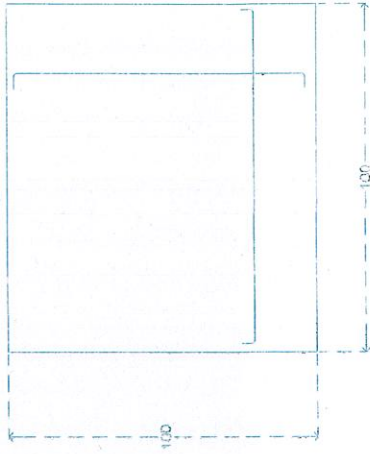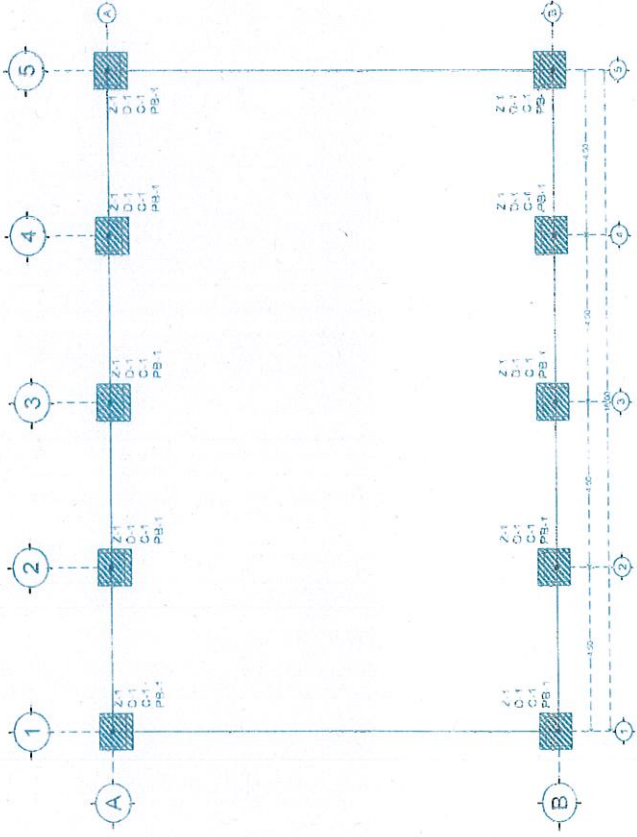

ING RAUL ROMERO ARELLANO
 REPRESENTANTE LEGAL

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ING. JOSE DANIEL CAMIAN RIOS



H. AYUNTAMIENTO DE CD. GUZMAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA:		CONTRATISTA: D' CONCREFOCC , SA DE CV	
"CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CENITO DE BACHILLERATO		ESTIMACION N° 1 (UNO)	
TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS No. 226"		LOCALIDAD: CD. GUZMAN JALISCO	
CLAVE	DESCRIPCION		
CON-01	REPOSICIÓN DE PISO DE 6 CM ACABADO ESCOBILLADO, DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, NIVELACIÓN, CIMBRADO DE FRONTERAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA		
REPORTE FOTOGRAFICO			



REPRESENTANTE LEGAL
ING. RAUL POMERO ARELLANO

JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE
OBRA PUBLICA

ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

