



JOSE HERIBERTO VENEGAS AVIÑA

VEAH820530G35
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
LEONA VICARIO, 244, CENTRO, 49000, CIUDAD GUZMAN, ZAPOTLAN EL GRANDE, Jalisco, México
Tel. 3414101107

CLIENTE

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
MZG8501012NA
USO CFDI: G03 - Gastos en general
COLON, 62, Ciudad Guzmán Centro, 49000, Ciudad Guzmán, Zapotlán el Grande, Jalisco, México

Factura F 215

FOLIO FISCAL (UUID)
13A3FFFD-7E80-462E-A909-B98A954E76EB
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
0000100000040553779
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000404925101
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2018-10-26T11:10:31
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
FMD100203JS7
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2018-10-26T10:59:28
LUGAR DE EXPEDICIÓN
49000

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Descripción, Precio Unitario, Importe. Row 1: 1.00, XLT, RECIBIMOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE LA CANTIDAD DE \$ 64,791.79 (SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 79/100 M.N) POR CONCEPTO DE ESTIMACIÓN 02 (FINIQUITO) A LA OBRA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE ESCUELA PRIMARIA EN LA COLONIA LA PRIMAVERA UBICADA ENTRE LA AVENIDA LAS ROSAS Y LA CALLE LAS PRIMAVERAS EN LA COLONIA LA PRIMAVERA EN CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. RECURSO MUNICIPAL. FIANZA DE ANTICIPO NUMERO 3502-12235-5, FIANZA CUMPLIMIENTO NUMERO 3502-12236-8 AFIANZADORA ASERTA, SA DE CV, GRUPO FINANCIERO ASERTA

Clave Prod. Serv. - 81101701 Servicios de ingeniería eléctrica

Impuestos:

Traslados:

002 IVA Base - \$ 55,854.99 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 8,936.80



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

IMPORTE CON LETRA

SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS, 79/100 MXN

SUBTOTAL \$ 55,854.99
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 8,936.80
TOTAL \$ 64,791.79

TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
CONDICIONES DE PAGO
MONEDA

I - Ingreso
03 - Transferencia electrónica de fondos
PUE - Pago en una sola exhibición
CRÉDITO
MXN - Peso Mexicano

SELLO DIGITAL DEL CFDI

G161GnHKnbErFHn+FuuglecOcv5s7DRSsgYEVmV4b8b/18LbX7AJ8g+XuLci3DUJAhcpqebtGeoD6+OT2YqclwBaMrN8uHoeHCuKsGTi3hA8WXROqZKKNfS8wP6EonqJui79IQK/PJ+dkaa0lyPvyU3rMiG18ssLS1Af3naq8usgLRnrVePXBq3zG3/7OKlghLkFcf0a0nJbCkeMaL8e2IGzg+Io403F9G3dfoC4cMu2GZUmD1PccSeJafRjr7nrJjn1+J5bOa3Ps7SO91VNwU6c/8YRKG9E1lrQ+p6FJzibULQGf6a04pq5mjYR1EZQS1edG2bZorZAA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

OF9IEzmJJ03jNXprwRBue04qZK3H9hWpuZPCK11VIBZE20UFRVH3r/2EjBpX2IXwIG117LWYX9CW7yr5sHDw7FEMyJKI7Zo9m9AsgZqCWh8JdnOuR8jshTSyijOwcvprsY84eN9Sii9SgZ2KayuR1KRVLuB8sAkCCgJi3Kfn/0FNyBLcxIFjMjNB0aEUNCLCjI7CQScskYrOJhwKPFcuXgIHelfz+KvIdCZGSIXGJQnXUMYQV/YJqUZsGjketr+2pVxIKKcKRBfYhg0Ra10ocL6yhPyk6mye6rdsr3DXDWGPwbi1B/b49Hg2LqoTNYgowZIDBRc3QC6IA5Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|13A3FFFD-7E80-462E-A909-B98A954E76EB|2018-10-26T11:10:31|FMD100203JS7|G161GnHKnbErFHn+FuuglecOcv5s7DRSsgYEVmV4b8b/18LbX7AJ8g+XuLci3DUJAhcpqebtGeoD6+OT2YqclwBaMrN8uHoeHCuKsGTi3hA8WXROqZKKNfS8wP6EonqJui79IQK/PJ+dkaa0lyPvyU3rMiG18ssLS1Af3naq8usgLRnrVePXBq3zG3/7OKlghLkFcf0a0nJbCkeMaL8e2IGzg+Io403F9G3dfoC4cMu2GZUmD1PccSeJafRjr7nrJjn1+J5bOa3Ps7SO91VNwU6c/8YRKG9E1lrQ+p6FJzibULQGf6a04pq5mjYR1EZQS1edG2bZorZAA==|0000100000040553779||



DIRECCION DE GESTION
PROGRAMAS COPLADEMUS
VINCULACION CON DELEGACIONES

31 OCT 2018

RECIBIDO
Digitales
No. SAT 55710



H.AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ORAS PUBLICAS

CONTROL DE OBRA PUBLICA

FECHA: 27-sep-18

Contrato: DOP/MUNICIPALZAPOTLAN EL GRANDE/2018-02/011
 Contratista: JOSE HERIBERTO VENEGAS AVIÑA
 Obra: ALIMENTACION ELECTRICA DE ESCUELA PRIMARIA EN LA COLONIA DE LA PRIMAVERA

Localidad: CIUDAD GUZMAN

Municipio: ZAPOTLAN EL GRANDE

Fecha de Inicio: 27-ago-18

Fecha de Término: 27-sep-18

Estimación No.: ESTIMACION 02 (FINIQUITO) Período: 15-sep-18 Al: 27-sep-18

Resumen de Documento			
+ Importe de la Estimación		74,473.33	74,473.33
+ Aditiva		-	-
- Deductiva		-	-
+ IVA: 16%		11,915.73	86,389.06
- Amortización			26,250.00
Total			60,139.06

Avance	
Fecha Inicial:	27/08/2018
Financiero %	100.00%
Físico %	100.00%
Fecha:	27-sep-18

Techo Financiero	Importe	Acumulado	Importe
Presupuesto Base	210,000.00	Esta Estimacion	86,389.06
Convenio Adicional	-	Acumulado Anterior	123,610.94
Suma Escalatorias	-	Acumulado Actual	210,000.00
Total	210,000.00	Saldo	0.00

Anticipo		
Anticipo	25%	52,500.00
Amort. Del acumulado		26,250.00
Esta amortización		26,250.00
Total Amortizado		52,500.00
Saldo por Amortizar		0.00

Detalle	Federal	Estatal	Municipio
Importe	-	-	51,844.02
Escalatoria	-	-	-
IVA	-	-	8,295.04
Total a Facturar	-	-	60,139.06
2 al millar	-	-	-
5 al millar	-	-	-
Sanción	-	-	-
Total a Pagar	-	-	60,139.06



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	ARQ. JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR	ELEVEN ELECTRIFICACIONES
ING. MANUEL MICHEL CHAVEZ	JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA PUBLICA	JOSE HERIBERTO VENEGAS AVIÑA

DIRECCION DE GESTION DE PROGRAMAS COPLADEMUN Y VINCULACION CON DELEGACIONES

3.1 OCT 2018

RECIBIDO

ELECTRIFICACIONES VENEGAS



ESTIMACION 02

HOJA 1 DE 2

OBRA: ALIMENTACION ELECTRICA DE ESCUELA PRIMARIA EN LA COLONIA DE LA PRIMAVERA
 LOCALIDAD: CIUDAD GUZMAN
 CONTRATO No.: DOPMUNICIPALZAPOTLANELGRANDE2018-02011
 FECHA DE INICIO: 27/09/2018
 MUNICIPIO: ZAPOTLAN EL GRANDE
 FECHA DE TERMINO: 27/09/2018

ESTIMACION No.: ESTIMACION 02 (FINQUITO)
 PERIODO DE ESTIMACION: 15/09/2018 AL 27/09/2018
 CONTRATISTA: JOSE HERIBERTO VENEGAS AVINA

CODIGO	CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO BASE		ESTIMACION No. 01		ESTIMACION No. 02		ACUMULADOS		SALDO		
			CANTIDAD	PRECIO UNIT.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE		
SC-TRANSIC 1F	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSICION ELECTRICA AEREO-SUBTERRANEA 1F-2H INCLUYE POSTE DE CONCRETO PGR13-600. HERRAJES, AISLADORES, CRUCETAS, TUBO PAD 4", TERMINAL EN FRIO TIPO EXTERIOR, APARTARRAYO TIPO RISE POLAR, CORTACIRCUITO FUSIBLE, MATERIAL DE FIJACION, HECHURA DE CEPA, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA CALIFICADA.	LOTE	1.000	\$ 18.143.84	\$ 18.143.84	1.000	\$18.143.84	0.000	\$0.00	1.000	\$ 18.143.84	0.000	\$0.00
SC-PAD 3"	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DUCTO PAD RD.17 DE 3" NORMA CFE, INCLUYE COLOCACION DE DUCTO EN ZANJA, RELLENO Y COMPACTADO SEGUN NORMA CFE CON MATERIAL PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION, CINTA DE PRECALCION, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA CALIFICADA (NO INCLUYE EXCAVACION)	ML	5.000	\$ 127.71	\$ 638.55	5.000	\$638.55	0.000	\$0.00	5.000	\$ 638.55	0.000	\$0.00
SC-XLPE 1/0	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE POTENCIA XLPE CALIBRE 1/0 23 KV, INCLUYE FLETE ACARREO, COLOCACION EN DUCTO, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA CALIFICADA	ML	22.000	\$ 207.43	\$ 4.563.46	22.000	\$4.563.46	0.000	\$0.00	22.000	\$ 4.563.46	0.000	\$0.00
SC-TN RMTB4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO NORMA CFE 2005 TN-RMTB-4, INCLUYE FLETE, MANIOBRA DE GRUA, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA CALIFICADA. (NO INCLUYE EXCAVACION)	PZA	1.000	\$ 9.111.38	\$ 9.111.38	1.000	\$9.111.38	0.000	\$0.00	1.000	\$ 9.111.38	0.000	\$0.00
SC-TAP 84B	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA PARA REGISTRO DE CONCRETO POLIMERICO 84B, INCLUYE ARO, NIVELADO, COLADO, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA CALIFICADA	PZA	1.000	\$ 4.453.64	\$ 4.453.64	1.000	\$4.453.64	0.000	\$0.00	1.000	\$ 4.453.64	0.000	\$0.00
SC-BASE TRO	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE DE CONCRETO PARA TRANSFORMADOR, INCLUYE ACARREO, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA CALIFICADA	PZA	1.000	\$ 6.853.22	\$ 6.853.22	1.000	\$6.853.22	0.000	\$0.00	1.000	\$ 6.853.22	0.000	\$0.00
	FIRMA Y FECHA					VALIDO				ELABORÓ			FECHA DE AUTORIZACION
	NOMBRE									JOSE HERIBERTO VENEGAS AVINA			
	CARGO									ELEVEN ELECTRICACIONES			

ING. MANUEL MICHEL CHAVEZ
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR
 JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS PUBLICAS



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ELECTRIFICACIONES VENEGAS



ESTIMACION 02

OBRA: ALIMENTACION ELECTRICA DE ESCUELA PRIMARIA EN LA COLONIA DE LA PRIMAVERA
 LOCALIDAD: CIUDAD GUZMAN
 CONTRATO No.: DOP/MUNICIPAL/ZAPOTLAN/ELGRANDE/2018-02/011
 FECHA DE INICIO: 27/09/2018

MUNICIPIO: ZAPOTLAN EL GRANDE
 PERIODO DE ESTIMACION: 15/09/2018 AL 27/09/2018
 REPRESENTANTE LEGAL: JOSE HERIBERTO VENEGAS AVINA
 FECHA DE TERMINO: 27/09/2018

ESTIMACION No.: ESTIMACION 02 (FINIQUITO)

CODIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRESUPUESTO BASE		ESTIMACION No. 01		ESTIMACION No. 02		ACUMULADOS		SALDO	
				PRECIO UNIT.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
SC-TRO MON PE	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 15 KVA, MONOFASICO, NORMA J, CERTIFICADO ANGE, INCLUYE ACARREO, MANIOBRA, COLOCACION, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MATERIALES MENORES Y MANO DE OBRA CALIFICADA.	PZA	1.000	\$ 54,758.11	\$ 54,758.11	1.000	\$ 54,758.110	0.000	\$ 0.00	1.000	\$ 54,758.11	0.000	\$ 0.00
SC-SIST TF	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE TIERRAS, INCLUYE CABLE CU-2, VARILLA COPPERVELD CON PROTOCOLO, CARGA CADWEL, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA CALIFICADA.	LOTE	1.000	\$ 8,038.95	\$ 8,038.95	1.000	\$ 8,038.95	0.000	\$ 0.00	1.000	\$ 8,038.95	0.000	\$ 0.00
SC-PAD 2º	BAJA TENSION SUMINISTRO Y COLOCACION DE DUCTO PAD 2º RD17, INCLUYE FLETE, ACARREO, COLOCACION DE DUCTO, RELLENO DE ZANJA CON EL MISMO MATERIAL DE LA EXCAVACION, COMPACTADO, CINTA PRECAUCION, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA CALIFICADA (NO INCLUYE EXCAVACION)	MIL	100.000	\$ 94.99	\$ 9,499.00	0.000	\$ 0.00	100.000	\$ 9,499.00	100.000	\$ 9,499.00	0.000	\$ 0.00
SC-SIS-MED	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE MEDICION, INCLUYE BASE PARA MEDICION 5X100, MURETE PARA BASE DE MEDICION, SISTEMA DE TIERRA, INTERRUPTOR GENERAL, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA CALIFICADA.	LOTE	1.000	\$ 10,080.93	\$ 10,080.93	0.000	\$ 0.00	1.000	\$ 10,080.93	1.000	\$ 10,080.93	0.000	\$ 0.00
SC-AL-2+1-1/0	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ALUMINIO 2+1 CALIBRE 1/0-2, INCLUYE ACARREO, TENDIDO EN DUCTO, CONEXIONES, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA CALIFICADA.	MIL	110.000	\$ 123.74	\$ 13,611.40	0.000	\$ 0.00	110.000	\$ 13,611.40	110.000	\$ 13,611.40	0.000	\$ 0.00
SC-REG-33X33	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE CONCRETO 33X33X40, INCLUYE ACARREO, COLOCACION, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA CALIFICADA.	PZA	4.000	\$ 1,328.00	\$ 5,312.00	0.000	\$ 0.00	4.000	\$ 5,312.00	4.000	\$ 5,312.00	0.000	\$ 0.00
TRAM-01	TRAMITOLOGIA	SERV	1.000	\$ 14,388.00	\$ 14,388.00	0.00	\$ 0.00	1.000	\$ 14,388.00	1.000	\$ 14,388.00	0.000	\$ 0.00
CPE-01	APROBACION DE PROYECTO, LIBRANZA, CONEXION Y SUPERVISION DE OBRA POR CPE	SER	1.000	\$ 21,582.00	\$ 21,582.00	0.00	\$ 0.00	1.000	\$ 21,582.00	1.000	\$ 21,582.00	0.000	\$ 0.00
TOTAL				\$ 181,034.48			\$ 74,473.33						

FIRMA Y FECHA

VALIDO

VALIDO

ELABORO

FECHA DE AUTORIZACION

NOMBRE

ING. MANUEL MICHEL CHAVEZ

ARQ. JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR

JOSE HERIBERTO VENEGAS AVINA

CARGO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS PUBLICAS

ELEVEN ELECTRIFICACIONES



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ELECTRIFICACIONES VENEGAS



GENERADORES

OBRA: ALIMENTACION ELECTRICA DE ESCUELA PRIMARIA EN LA COLONIA DE LA PRIMAVERA

ESTIMACION No.: ESTIMACION 02 (FINIQUITO)

LOCALIDAD: CIUDAD GUZMAN

MUNICIPIO: ZAPOTLAN EL GRANDE

PERIODO DE ESTIMACION: 15/09/2018

AL 27/09/2018

CONTRATO No.: DOP/MUNICIPALZAPOTLANELGRANDE/2018-02/011


FECHA DE INICIO: 27/08/2018

CONTRATISTA

JOSE HERIBERTO VENEGAS AVIÑA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE DUCTO PAD 2" RD17. INCLUYE FLETE, AGARREO, COLOCACION DE DUCTO, RELLENO DE ZANJA CON EL MISMO MATERIAL DE LA EXCAVACION, COMPACTADO, CINTA PRECAUCION, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA CALIFICADA. (NO INCLUYE EXCAVACION)

CROQUIS

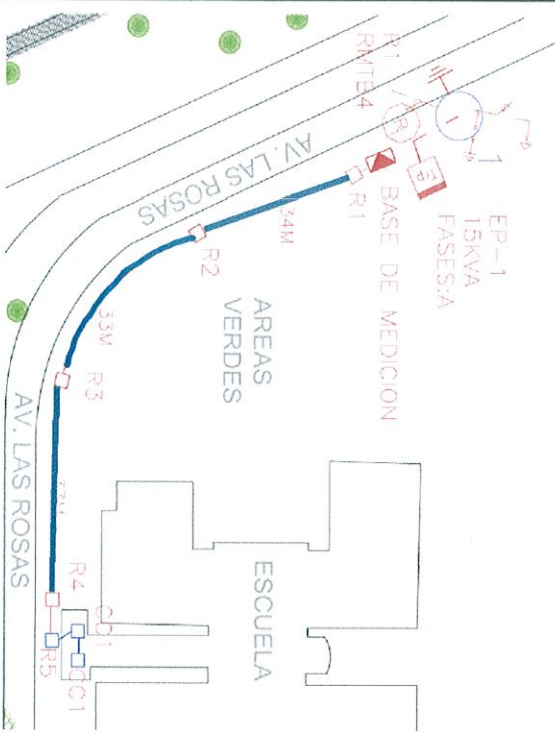

CONCEPTO	REF 1	REF 2	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	UNIDAD	
BASE DE MEDICION	BASE DE MEDICION	CENTRO DE CARGA EXISTENTE	100			100,000	ML	
							TOTAL	
						100,000	ML	

JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR

ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

COTRATISTA

JOSE HERIBERTO VENEGAS AVIÑA
ELEVEN ELECTRICACIONES

ELECTRIFICACIONES VENEGAS




GENERADORES

OBRA: ALIMENTACION ELECTRICA DE ESCUELA PRIMARIA EN LA COLONIA DE LA PRIMAVERA
 LOCALIDAD: CIUDAD GUZMAN
 MUNICIPIO: ZAPOTLAN EL GRANDE

ESTIMACION No.: ESTIMACION 02 (FINIQUITO)
 PERIODO DE ESTIMACION: 15/09/2018 AL 27/09/2018
 CONTRATATISTA: JOSE HERIBERTO VENEGAS AVIÑA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ALUMINIO 2+3 CALIBRE 4/0-2. INCLUYE ACARREO, TENDIDO EN DUCTO, CONEXIONES, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA CALIFICADA.

REF 1	REF 2	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	UNIDAD	
BASE DE MEDICION	REG 1				5.000	ML	
REG 1	REG 2				34.000	ML	
REG 2	REG 3				33.000	ML	
REG 3	REG 4				33.000	ML	
REG 4	REG. EXISTENTE				3.000	ML	
REG. EXISTENTE	CENTRO DE CARGA EXISTENTE				2.000	ML	
TOTAL						110.000	ML

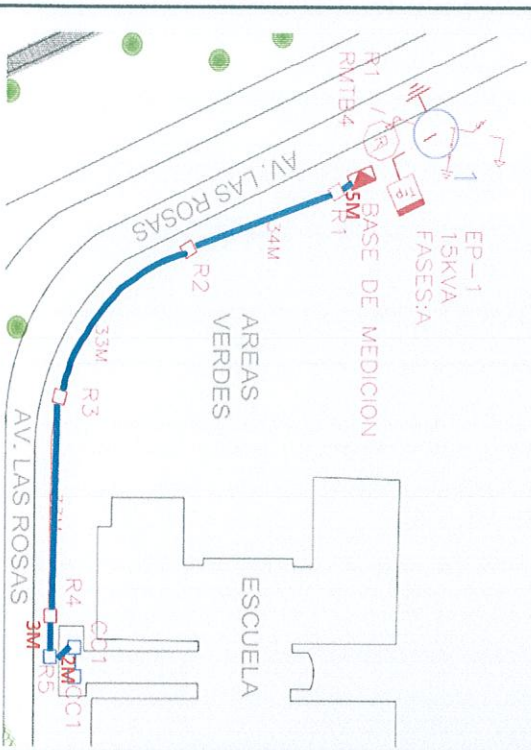

JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR
 ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

JOSE HERIBERTO VENEGAS AVIÑA
 ELEVEN ELECTRIFICACIONES

COTRATISTA


ELECTRIFICACIONES VENEGAS



GENERADORES

OBRA: ALIMENTACION ELECTRICA DE ESCUELA PRIMARIA EN LA COLONIA DE LA PRIMAVERA
LOCALIDAD: CIUDAD GUZMAN
MUNICIPIO: ZAPOTLAN EL GRANDE
CONTRATO No.: DOP/MUNICIPALZAPOTLANELGRANDE/2018-02/011
ESTIMACION No.: ESTIMACION 02 (FINIQUITO)
PERIODO DE ESTIMACION: 15/09/2018 AL 27/09/2018
CONTRATISTA: JOSE HERIBERTO VENEGAS AVINA

APROBACION DE PROYECTO, LIBRANZA, CONEXION Y SUPERVISION DE OBRA POR CFE	REF. 1	REF. 2	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	UNIDAD	
CROQUIS	SER					1.00	SER	
							TOTAL	SER

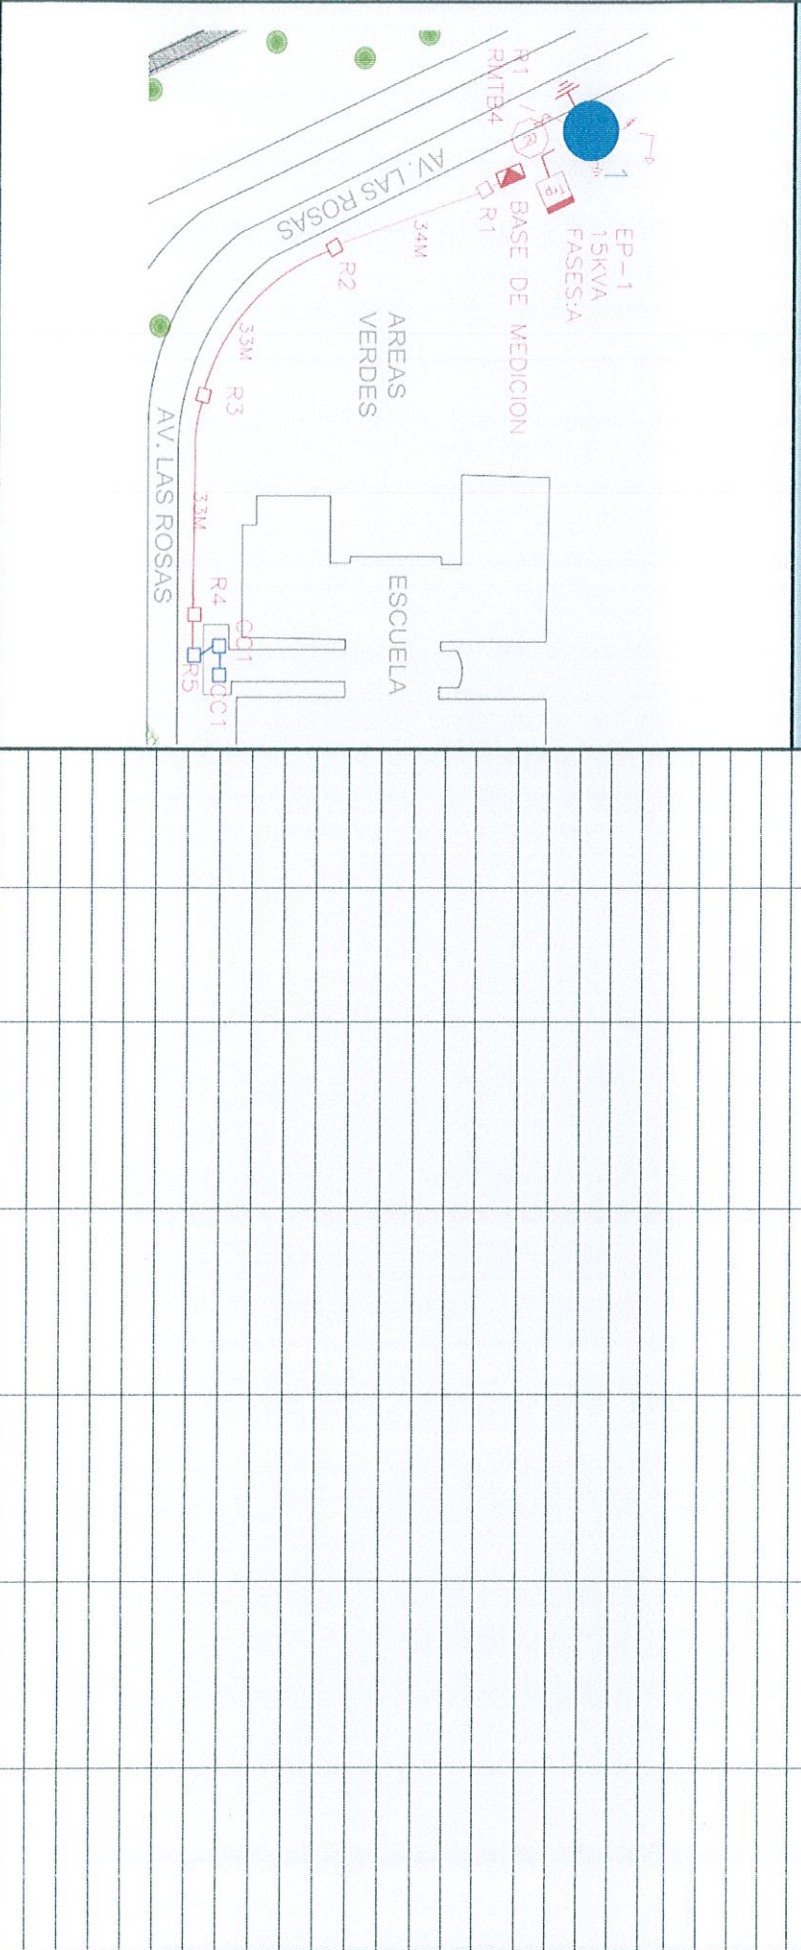

JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR
 ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

COTRATISTA
JOSE HERIBERTO VENEGAS AVINA
 ELEVEN ELECTRIFICACIONES

ELECTRIFICACIONES VENEGAS





REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA: ALIMENTACION ELECTRICA DE LA ESCUELA PRIMARIA EN LA COLONIA DE LA PRIMAVERA
 LOCALIDAD: CIUDAD GUZMAN
 CONTRATO No.: DOP/MUNICIPALZAPOTLANELGRANDE/2018-02/011
 FECHA DE INICIO: 27/08/2018

MUNICIPIO: ZAPOTLAN EL GRANDE
 PERIODO DE ESTIMACION: 15/09/2018 AL 27/09/2018
 CONTRATISTA: JOSE HERIBERTO VENEGAS AVIÑA
 ESTIMACION No.: ESTIMACION 02 (FINIQUITO)

CONCEPTO	CONCEPTO
SUMINISTRO Y COLOCACION DE DUCTO PAD 2" RD17 	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE MEDICION 

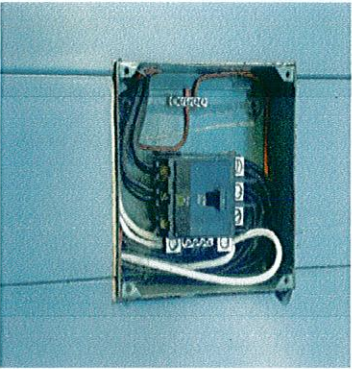CONCEPTO	CONCEPTO
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ALUMINIO 2+1 CAUBRE 1/0-2 	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE CONCRETO 33X33X40. 

JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR
 ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

COTRATISTA

JOSE HERIBERTO VENEGAS AVIÑA
 ELEVEN ELECTRIFICACIONES
