



**OMAR MAGAÑA MORENO**

MAMX790128GK6  
 RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
 MEDELLIN, 101, FRACCIONAMIENTO SAN PEDRO, 49080, ZAPOTLAN EL GRANDE, Jalisco, México  
 Tel. 3414131564

**CLIENTE**

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE  
 MZG8501012NA  
 USO CFDI: G03 - Gastos en general  
 COLON, 62, 49000, Ciudad Guzmán, Zapotlán el Grande, Jalisco, México

**Factura A 254**

FOLIO FISCAL (UUID)  
 EDCDA7E9-F6FC-4873-88D6-3902DAC16B77  
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000405535779  
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000408157776  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN  
 2018-12-20T14:12:54  
 RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN  
 FMD100203JS7  
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI  
 2018-12-20T14:07:04  
 LUGAR DE EXPEDICIÓN  
 49080

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	RECIBIMOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. LA CANTIDAD DE \$6,548.54 M.N. (SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 54/100 M.N.). POR CONCEPTO DE ESTIMACION No.02 (DOS) Y FINIQUITO, RELATIVO A LA OBRA: REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA "MANUEL CHÁVEZ MADRUENO", UBICADO EN CALLE FEDERICO DEL TORO S/N, ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y PASCUAL GALINDO CEBALLOS, EN CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO; CONTRATO NO.: DOP/FFIC/2018-06 RECURSO: "FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN 2018 CONVENIO C", APROBADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018. FIANZA DE ANTICIPO NO. 2274179 FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 2274205 COMPANIA AFIANZADORA: AFIANZADORA SOFIMEX S.A. MONTO PARA EFECTO DE PAGO \$6,548.54  Clave Prod. Serv. - 72103300 Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 5,645.29 Tasa - 0.160000 - \$ 903.25	\$ 5,645.29	\$ 5,645.29



ARQ. JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS  
 JEFE DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA

ARQ. OMAR MAGAÑA MORENO  
 CONTRATISTA

IMPORTE CON LETRA

SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS, 54/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE  
 FORMA DE PAGO  
 MÉTODO DE PAGO  
 MONEDA

I - Ingreso  
 03 - Transferencia electrónica de fondos  
 PPD - Pago en parcialidades o diferido  
 MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 5,645.29  
 TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 903.25  
 TOTAL \$ 6,548.54



**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

VQE3rmBysJ7/2B1PQ0INToaOihlzirJQDTnvw/1vjLL1zGcrDDog40EXbV/KjV6WFjVqzSIXsX+09e791E4ITVnYFsCivAgXUxUjPwPp/ZLnAs7xBG8WIEWwvG+RA+zdisB2FDDkAxS8UU2OxDq4uLayyG8xV0PzcvM4W6ZNLJIIRzhJjap6KI2RESiWQneBERBfNCQbXdoHPDlyssiDeilvTV4YRo0/He3/apjn5ite2yxNblwPjZT/57dyqSo1Y10c1TKLC4yme5D8fkiVnQcsQqoKpb/nPc4a6EKf7VIV7I8ufjBOWCfO8gMblmNqu3RcQZ5FobwneIq==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

AGIhEuYmjGnHds7luNXI2RV/Cq05grf9Ygt+QOZhhskEkOxGXZiNY4upkOCg9dAW2M6RPHC71FdxuTbVnHBLxn/BsRksI9vU0UxKAJRTFvu4Ue2xRCTOjeU56ULnR8GRjwFDUvfw6pGEhDU+A1u3OY+Tu9g7Ab0xglVXF8IQ/uZecmrCbKafLss0HVJCcGgYua1gAtP3BI69N5G6ch+DMFH/ZnG54vukwCEcRmBwPigmlbHsZJ02JILiku8PGo54BsKBYD1SPVmfGlrkifujl8kTdDYLTFU1iBjyYbnwva7eVR3RYx47SP0a22u9b0ujZclwZOEeWDWmO+854pg==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.1|EDCDA7E9-F6FC-4873-88D6-3902DAC16B77|2018-12-20T14:12:54|FMD100203JS7|VQE3rmBysJ7/2B1PQ0INToaOihlzirJQDTnvw/1vjLL1zGcrDDog40EXbV/KjV6WFjVqzSIXsX+09e791E4ITVnYFsCivAgXUxUjPwPp/ZLnAs7xBG8WIEWwvG+RA+zdisB2FDDkAxS8UU2OxDq4uLayyG8xV0PzcvM4W6ZNLJIIRzhJjap6KI2RESiWQneBERBfNCQbXdoHPDlyssiDeilvTV4YRo0/He3/apjn5ite2yxNblwPjZT/57dyqSo1Y10c1TKLC4yme5D8fkiVnQcsQqoKpb/nPc4a6EKf7VIV7I8ufjBOWCfO8gMblmNqu3RcQZ5FobwneIq=||00001000000405535779||

DIRECCION DE GESTION DE PROGRAMAS COPLADEMUNY VINCULACION CON DELEGACIONES

27 DIC 2018

**RECIBIDO**

Folios Digitales®

Proveedor Autorizado de Certificación

No. SAT 55710





**ZAPOTLÁN**  
EL GRANDE  
Gobierno Municipal

**H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS**



**CONTROL DE OBRA PÚBLICA**

**FECHA:** 31-dic-18  
DIRECCIÓN DE GEST.  
PROGRAMAS COPLAD  
VINCULACIÓN CON DELE

**29 DIC 2018**  
Eleny  
**RECIBI**

**Contrato:** DOP/FFIC/2018-06  
**Programa:** FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN 2018 CONVENIO C  
Aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, para el Ejercicio Fiscal 2018

**No. de Obra:** DOP/FFIC/2018-06  
**Nº Compranet:** IO-814023985-E30-2018

**Contratista:** ARQ. OMAR MAGAÑA MORENO.  
**Obra:** REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA "MANUEL CHAVEZ MADRUEÑO".

**Ubicación:** CALLE FEDERICO DEL TORO S/N, ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y PASCUAL GALINDO CEBALLOS, EN CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO.

**Localidad:** CIUDAD GUZMÁN **Municipio:** ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO

**Fecha de Inicio:** 12 DE DICIEMBRE DE 2018 **Fecha de Término:** 31 DE DICIEMBRE DE 2018  
**Estimación No.:** 02 (DOS) FINIQUITO **Periodo:** 29-dic-18 **Al:** 31-dic-18

Resumen de Documento		
+ Importe de la Estimación	\$ 7,527.07	\$ 7,527.07
+ Aditiva	\$ 0.00	\$ 0.00
- Deductiva	\$ 0.00	\$ 0.00
+ IVA: 16%	\$ 1,204.33	\$ 8,731.40
- Amortización	\$ 2,182.85	
<b>Total</b>	<b>\$ 6,548.55</b>	<b>\$ 6,548.55</b>

Avance	
Fecha Inicial:	12 DE DICIEMBRE DE 2018
Financiero:	100.00%
Fisico %	100.00%
Fecha:	31-dic-18

Techo Financiero	Importe	Acumulado	Importe
Presupuesto Base	\$ 1,189,382.30	Esta Estimacion	\$ 8,731.40
Convenio Adicional	\$ 0.00	Acumulado Anterior	\$ 1,180,650.90
Suma Escalatorias	\$ 0.00	Acumulado Actual	\$ 1,189,382.30
<b>Total</b>	<b>\$ 1,189,382.30</b>	<b>Saldo</b>	<b>\$ 0.00</b>

Anticipo		
Anticipo	25%	\$ 297,345.58
Amort. Del acumulado		\$ 295,162.73
Esta amortización		\$ 2,182.85
Total Amortizado		\$ 297,345.58
Saldo por Amortizar		<b>\$ 0.00</b>

Detalle	Federal	Estatal	Municipio
Importe	\$ 5,645.30	\$ 0.00	\$ 0.00
Escalatoria	-	-	-
IVA	\$ 903.25	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>Total a Facturar</b>	<b>\$ 6,548.55</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>
Retención del 5 al millar	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Retención del 2 al millar	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 6,548.55</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

Sumas	
	\$ 5,645.30
	\$ 0.00
	\$ 903.25
	\$ 6,548.55
	\$ 0.00
	\$ 0.00
	\$ 6,548.55

ARQ. JÉSUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. JOSÉ DAVID DAMIAN RIOS

JEFE DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

ARQ. OMAR MAGAÑA MORENO

CONTRATISTA





**ZAPOTLÁN**  
EL GRANDE  
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

**MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO**  
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA  
CUERPO DE LA ESTIMACION



**AROLIOMR**  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

HOJA  
1 DE 4

Contrato No. :	DOPFFIC/2018-06	Estimacion No. :	ESTIMACION 2 (DOS) FINQUITO
Programa:	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN 2018 CONVENIO C	Fecha:	31 DE DICIEMBRE DE 2018
Nº de Compras:	IO-814023985-E30-2018	Periodo de trabajo inicial:	28 DE DICIEMBRE DE 2018
Contratista:	ARQ. OMAR MAGANA MORENO	Periodo de termino:	31 DE DICIEMBRE DE 2018
Obra:	REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA "MANUEL CHAVEZ MADRUENO".	Supervisor:	ING. JOSÉ DAVID DAMIAN RIOS
Ubicación:	CALLE FEDERICO DEL TORO SIN, ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y PASCUAL GALINDO CEBALLOS	Municipio:	ZAPOTLÁN EL GRANDE
		Localidad:	CIUDAD GUZMÁN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PPTO. BASE	VOLUMENES			SALDO	IMPORTE			SALDO					
					ESTA ESTIMACION	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL		ESTA ESTIMACION	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL						
<b>PRELIMINARES</b>																	
DES-111	DESMONTE Y RETIRO DE PUERTA DE MADERA PARA REHABILITAR INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	\$ 484.69	56.0000	0.0000	55.0000	55.0000	1.0000	\$ -	\$ 26.657.95	\$ 26.657.95	\$ 484.69					
CAR-074	CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION Y EXCAVACION FUERA DE LA OBRA. (A 5 KM. DE DISTANCIA).	M3	\$ 156.43	48.0300	0.0000	48.0300	48.0300	0.0000	\$ -	\$ 7.513.33	\$ 7.513.33	\$ -					
DEM-018	DEMOLICION DE MURO DE LADRILLO DE 14 CMS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$ 40.39	22.8200	0.0000	19.1500	19.1500	3.6700	\$ -	\$ 773.47	\$ 773.47	\$ 148.23					
DES-118	DESMONTE Y RETIRO DE MANIPAS DE ACERO EN AREA DE BAÑOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$ 86.55	7.1300	0.0000	32.2100	32.2100	-25.0800	\$ -	\$ 2.787.78	\$ 2.787.78	\$ 2.170.67					
DES-119	DESMONTE Y RETIRO DE WC INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	\$ 283.79	15.0000	0.0000	15.0000	15.0000	0.0000	\$ -	\$ 4.256.85	\$ 4.256.85	\$ -					
DES-120	DESMONTE Y RETIRO DE LAVAMANOS EN AREA DE BAÑOS INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	\$ 283.79	7.0000	0.0000	7.0000	7.0000	0.0000	\$ -	\$ 1.986.53	\$ 1.986.53	\$ -					
DES-121	RETIRO DE VITROBLOC Y ESTRUCTURA DE ACER EN EL AREA DE BAÑOS INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$ 61.97	0.7000	0.0000	0.7000	0.7000	0.0000	\$ -	\$ 43.38	\$ 43.38	\$ -					
RES-020	RESANE PARA MURO CON MORTERO DE CEMENTO GRIS-ARENA DE RIO PROPORCION 1:3 INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION.	M2	\$ 73.70	100.0000	0.0000	189.5900	189.5900	-89.5900	\$ -	\$ 13.972.78	\$ 13.972.78	\$ 6.602.78					
OBSERVACIONES:										TOTAL DE ESTA HOJA (SINI.VA)			\$ -	\$ 57.992.07	\$ 57.992.07	\$ -	\$ 8.140.53
										TOTAL ACUMULADO (SINI.VA)			\$ -	\$ 57.992.07	\$ 57.992.07	\$ -	\$ 8.140.53

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

ARQ. JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA PUBLICA

ARQ. OMAR MAGANA MORENO  
CONTRATISTA





**MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO**  
 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA  
 CUERPO DE LA ESTIMACION



<b>Contrato No. :</b>	DO/PEFIC/2018-06	<b>Estimacion No. :</b>	ESTIMACION 2 (DOS) FINQUITO
<b>Programa:</b>	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2018 CONVENIO C	<b>Fecha:</b>	31 DE DICIEMBRE DE 2018
<b>Nº de Comprasnet:</b>	IO-814023985-E30-2018	<b>Periodo de trabajo inicial:</b>	28 DE DICIEMBRE DE 2018
<b>Contratista:</b>	ARQ. OMAR MAGAÑA MORENO	<b>Periodo de termino:</b>	31 DE DICIEMBRE DE 2018
<b>Obra:</b>	REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA "MANUEL CHAVEZ MADRUENO".	<b>Supervisor:</b>	ING. JOSÉ DAVID DAMIAN RIOS
		<b>Municipio:</b>	ZAPOTLÁN EL GRANDE
<b>Ubicación:</b>	CALLE FEDERICO DEL TORO SIN, ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y PASCUAL GALINDO CEBALLOS	<b>Localidad:</b>	CIUDAD GUZMÁN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMENES			IMPORTE			SALDO			
			PRECIO UNITARIO	P.TO. BASE	ESTA ESTIMACION	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL	ESTA ESTIMACION		ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL	
<b>PRELIMINARES</b>												
DEM-032	DEMOLICION DE MURO DE TABLARROCA INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$ 830.88	84.7200	0.0000	84.7200	84.7200	0.0000	\$ -	\$ 70.392.15	\$ 70.392.15	\$ -
RET-777	RETIRO DE BARANDALDE HERRERIA DE 1.1 MTS DE ALTURA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$ 60.83	5.7600	0.0000	5.7600	5.7600	0.0000	\$ -	\$ 350.38	\$ 350.38	\$ -
DES-067	DESMONTE DE MALLA PALAVERA INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$ 12.46	267.7000	0.0000	273.4100	273.4100	-5.7100	\$ -	\$ 3,406.69	\$ 3,406.69	\$ -71.15
DES-198	RETIRO DE CUBIERTA DE LAMINA SENTADA EN PERFIL MONTEN INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$ 129.30	48.9000	0.0000	47.2500	47.2500	1.6500	\$ -	\$ 6,109.43	\$ 6,109.43	\$ 213.35
<b>PINTURA</b>												
PIN-190	PINTURA ESMALTE 100 EN HERRERIA COLOR PREFERIDO, DOS APLICACIONES O SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$ 119.09	201.5100	0.0000	194.1000	194.1000	17.4100	\$ -	\$ 21,924.47	\$ 21,924.47	\$ 2,073.36
APU-011	APLICACION DE PINTURA VINILICA VINIMEX MARCA COMEX DE 0.00 A 4.00 M. DE ALTURA INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$ 65.28	4119.0100	0.0000	4066.1600	4066.1600	52.8500	\$ -	\$ 265,438.92	\$ 265,438.92	\$ 3,450.05
OBSERVACIONES:												
TOTAL DE ESTA HOJA (SIN I.V.A.) \$ - \$ 367,622.04 \$ 367,622.04												
TOTAL ACUMULADO (SIN I.V.A.) \$ - \$ 425,614.11 \$ 425,614.11 \$ 5,665.61												

ARQ. JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. JOSÉ DAVID DAMIAN RIOS  
 JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA PUBLICA

ARQ. OMAR MAGAÑA MORENO  
 CONTRATISTA





**MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO**  
 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA  
 CUERPO DE LA ESTIMACION



HOJA  
3 DE 4

<b>Contrato No.:</b>	DOPEFFIC/2018-06	<b>Estimacion No.:</b>	ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO
<b>Programa:</b>	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2018 CONVENIO C	<b>Fecha:</b>	31 DE DICIEMBRE DE 2018
<b>Nº de Comprasnet:</b>	IO-814023985-E30-2018	<b>Periodo de trabajo inicial:</b>	28 DE DICIEMBRE DE 2018
<b>Contratista:</b>	ARQ. OMAR MAGAÑA MORENO	<b>Periodo de termino:</b>	31 DE DICIEMBRE DE 2018
<b>Obra:</b>	REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA "MANUEL CHAVEZ MADRUENO".	<b>Supervisor:</b>	ING. JOSÉ DAVID DAMIAN RÍOS
<b>Ubicación:</b>	CALLE FEDERICO DEL TORO S/N, ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y PASCUAL GALINDO CEBALLOS	<b>Municipio:</b>	ZAPOTLAN EL GRANDE
		<b>Localidad:</b>	CIUDAD GUZMÁN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMENES				IMPORTE				SALDO					
			PRECIO UNITARIO	PPTO. BASE	ESTA ESTIMACION	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL	SALDO	ESTA ESTIMACION	ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL				
	<b>PINTURA</b>															
IMP-332	IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA A BASE DE 1 CAPA DE MICRO-PRIMER, 3 CAPAS DE EMUFLEX O EMULSION Y 2 CAPAS DE FESTER-FLEX.	M2	\$ 229.67	727.5800	0.0000	766.2800	766.2800	-38.7200	\$ -	\$ 175,991.53	\$ 175,991.53	\$ -	\$ 8,892.82			
APL-034	APLICACION DE PINTURA VINILICA VINIMEX MARCA COMEX EN PLAFON, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$ 65.28	1393.0600	0.0000	1241.5300	1241.5300	151.5300	\$ -	\$ 81,047.08	\$ 81,047.08	\$ -	\$ 9,891.88			
<b>PUERTAS Y VENTANAS</b>																
PUE-054	SUMINISTRO Y REPARACION DE PUERTA DE MADERA INCLUYE: MADERA DONDE ESTE DANADO, MARCO DE MADERA Y CHAPA CLASICA, LLADA, BARNIZ Y PINTURA MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	\$ 3,699.03	56.0000	0.0000	55.0000	55.0000	1.0000	\$ -	\$ 203,446.65	\$ 203,446.65	\$ -	\$ 3,699.03			
VEN-054	SUMINISTRO, RETIRO E INSTALACION DE CRISTALES PARA VENTANAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	\$ 975.26	25.4000	0.0000	34.6000	34.6000	-9.2000	\$ -	\$ 33,744.00	\$ 33,744.00	\$ -	\$ 8,972.39			
<b>CAMBIO DE RED PLUVIAL</b>																
RAN-580	RANURADO EN MURO PARA CAJILLO (10X7 CMS), INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$ 222.56	17.2000	0.0000	9.0000	9.0000	8.2000	\$ -	\$ 2,003.04	\$ 2,003.04	\$ -	\$ 1,824.99			
PLU-045	COLOCACION DE TUBO PVC DE 4" PARA BAJO DE RED PLUVIA, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$ 137.89	17.2000	0.0000	9.0000	9.0000	8.2000	\$ -	\$ 1,241.01	\$ 1,241.01	\$ -	\$ 1,130.70			
OBSERVACIONES:										TOTAL DE ESTA HOJA (SINI.VA.)		\$ -	\$ 497,473.31	\$ 497,473.31	\$ -	\$ 1,318.61
										TOTAL ACUMULADO (SINI.VA.)		\$ 923,097.42	\$ 923,097.42	\$ 923,097.42	\$ -	\$ 3,793.53

ARQ. JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



ING. JOSÉ DAVID DAMIAN RÍOS

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. OMAR MAGAÑA MORENO

CONTRATISTA





**MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO**  
 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA  
 CUERPO DE LA ESTIMACION



HOLA  
4 DE 4

<b>Contrato No. :</b>	DOPI/FI/2018-06	<b>Estimación No. :</b>	ESTIMACION 2 (DOS) FINQUITO
<b>Programa:</b>	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN 2018 CONVENIO C	<b>Fecha:</b>	31 DE DICIEMBRE DE 2018
<b>Nº de Comprasnet:</b>	IO-814023985-E30-2018	<b>Periodo de trabajo inicial:</b>	28 DE DICIEMBRE DE 2018
<b>Contratista:</b>	ARQ. OMAR MAGAÑA MORENO	<b>Periodo de termino:</b>	31 DE DICIEMBRE DE 2018
<b>Obra:</b>	REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA "MANUEL CHAVEZ MADRUENO".	<b>Supervisor:</b>	ING. JOSÉ DAVID DAMIAN RÍOS
<b>Ubicación:</b>	CALLE FEDERICO DEL TORO SIN, ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y PASCUAL GALINDO CEBALLOS	<b>Municipio:</b>	ZAPOTLAN EL GRANDE
		<b>Localidad:</b>	CIUDAD GUZMÁN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMENES				IMPORTE					
			PRECIO UNITARIO	PPTO. BASE	ESTA ESTIMACION	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL	SALDO	ESTA ESTIMACION	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL	SALDO
MAL-023	MALLA PICHONERA	M2	133.50	267.7000	0.0000	0.0000	0.0000	267.7000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,797.95
SUM-088	AREA DE COCINA SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA A BASE DE LAMINA MULTITECHO CAL.26, INCLUYE: PLACAS DE FIJACION, LAMINA, PLAS DE 4" PUNTA DE BROCA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1,280.77	48.9000	0.0000	64.9700	64.9700	-16.0700	\$ -	\$ 83,211.63	\$ 83,211.63	\$ 20,581.97
LIM-158	AREA DE COCINA LIMPIEZA FINAL	M2	7.42	1033.4370016	1014.4300000	1550.3300	2564.7800	-1531.3230	\$ 7,527.07	\$ 11,503.45	\$ 19,030.52	\$ 11,362.42
<b>TOTAL DE ESTA HOJA (SIN I.V.A.)</b>									\$ 7,527.07	\$ 94,715.08	\$ 102,242.15	\$ 3,793.56
<b>TOTAL ACUMULADO (SIN I.V.A.)</b>									\$ 7,527.07	\$ 1,017,802.50	\$ 1,025,329.57	\$ 0.03

OBSERVACIONES:

ARQ. JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS


ING. JOSÉ DAVID DAMIAN RÍOS

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA PUBLICA

ARQ. OMAR MAGAÑA MORENO

CONTRATISTA






**MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO**  
 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA  
 NUMEROS GENERADORES



HOLA  
1 DE 2

<b>Contrato No. :</b>	DOP/FIC/2018-06	<b>Estimacion No. :</b>	ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO
<b>Programa:</b>	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN 2018 CONVENIO C	<b>Fecha:</b>	31 DE DICIEMBRE DE 2018
<b>Nº de Compraventa:</b>	IO-8140239395-E30-2018	<b>Periodo de trabajo inicial:</b>	29 DE DICIEMBRE DE 2018
<b>Contratista:</b>	ARQ. OMAR MAGAÑA MORENO	<b>Periodo de termino:</b>	31 DE DICIEMBRE DE 2018
<b>Obra:</b>	REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA "MANUEL CHAVEZ MADRUENO".	<b>Supervisor:</b>	ING. JOSÉ DAVID DAMIAN RÍOS
<b>Ubicación:</b>	CALLE FEDERICO DEL TORO S/N, ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y PASCUAL GALINDO CEBALLOS	<b>Municipio:</b>	ZAPOTLÁN EL GRANDE
		<b>Localidad:</b>	CIUDAD GUZMÁN

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION		VOLUMEN					TOTAL	
		EJE	TRAMO	REFERENCIA	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	UNIDAD	TOTAL
LIM-158	LIMPIEZA FINAL (GENERAL) DE OBRA	A-Q	1'-2	PLANTA BAJA	2.0000	18.4650	0.0000	0.0000	M2	36.93
		B-I	1-6	PLANTA ALTA	23.0000	42.5000	0.0000	0.0000	M2	977.50

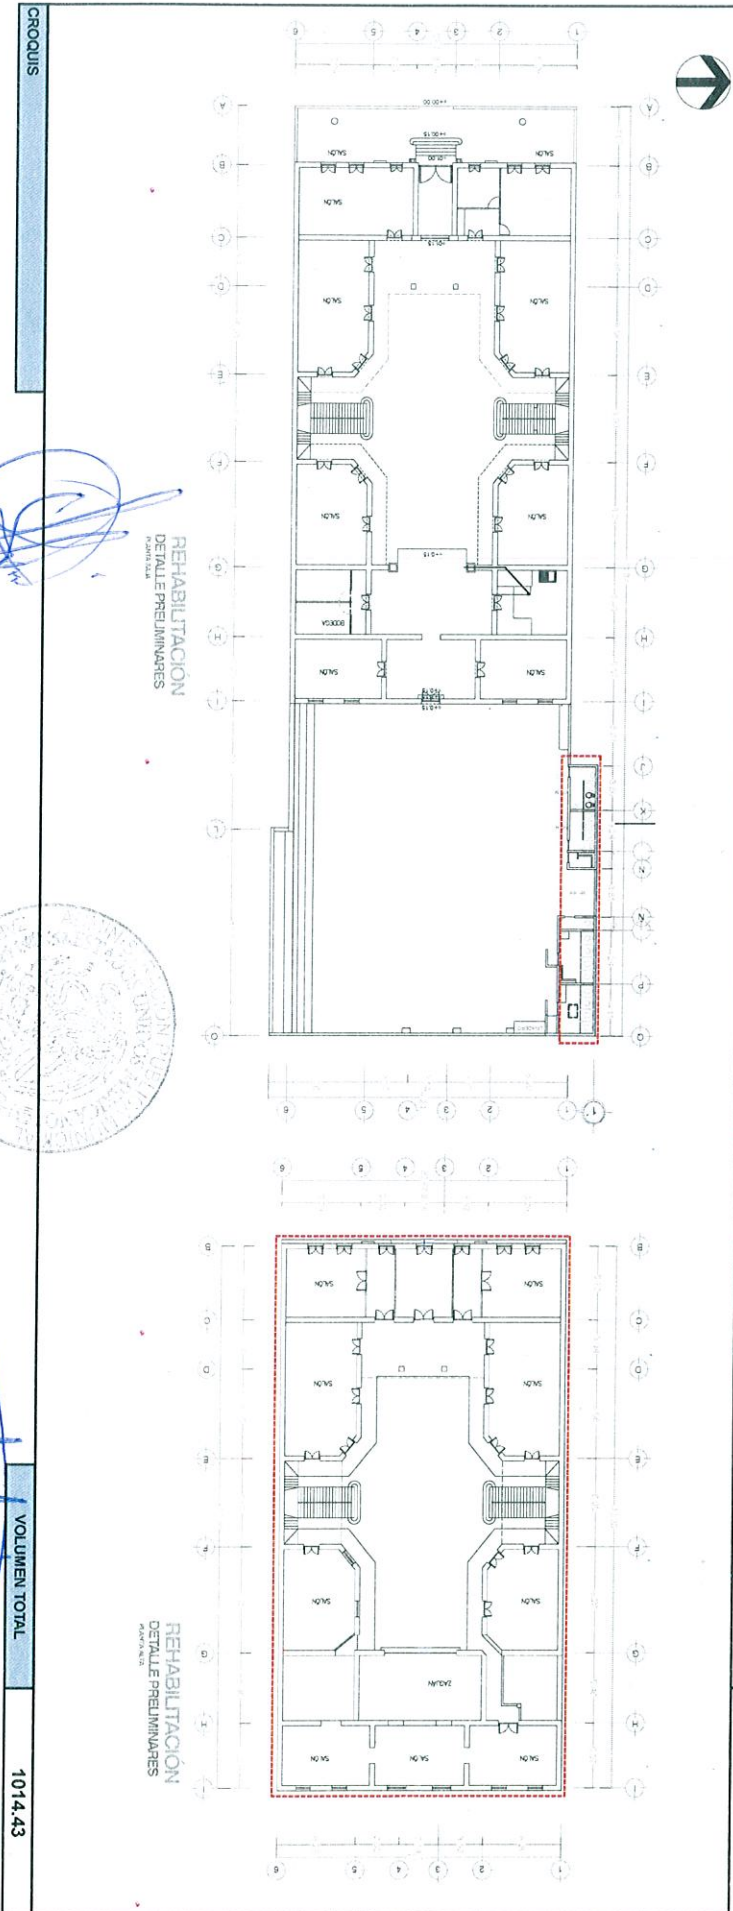


<b>CROQUIS</b>	<b>VOLUMEN TOTAL</b>	<b>1014.43</b>
----------------	----------------------	----------------

ING. JOSÉ DAVID DAMIAN RÍOS  
JEFE DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PUBLICA



ARQ. OMAR MAGAÑA MORENO  
CONTRATISTA





ZAPOTLÁN  
MUNICIPIO

**MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO**  
**DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA**  
**MEMORIA FOTOGRÁFICA**



<b>Contrato No. :</b>	DOP/FIJC/2018-06	<b>Estimacion No. :</b>	ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO
<b>Programa:</b>	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN 2018 CONVENIO C	<b>Fecha:</b>	31 DE DICIEMBRE DE 2018
<b>Nº de Compranet:</b>	IO-814023995-E30-2018	<b>Periodo de trabajo inicial:</b>	29 DE DICIEMBRE DE 2018
<b>Contratista:</b>	ARQ. OMAR MAGAÑA MORENO	<b>Periodo de termino:</b>	31 DE DICIEMBRE DE 2018
<b>Obra:</b>	REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA "MANUEL CHAVEZ MADRUEÑO"	<b>Supervisor:</b>	ING. JOSÉ DAVID DAMIAN RÍOS
<b>Ubicación:</b>	CALLE FEDERICO DEL TORO S/N, ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y PASCUAL GALINDO CEBALLOS	<b>Municipio:</b>	ZAPOTLÁN EL GRANDE
		<b>Localidad:</b>	CIUDAD GUZMÁN

CLAVE	CONCEPTO
Nº	DESCRIPCION GENERAL DEL CONCEPTO
LIM-158	LIMPIEZA FINAL (GENERAL) DE OBRA



ING. JOSÉ DAVID DAMIAN RÍOS  
JEFE DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PUBLICA



ARQ. OMAR MAGAÑA MORENO  
CONTRATISTA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
