



**D CONCREFOCC SA DE CV**

DC0980225AW7  
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales  
Cardenales, 57, Residencial Santa Bárbara, 28017, COLIMA, Colima, México  
Tel. 3123302677

**CLIENTE**

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE  
MZG8501012NA  
USO CFDI: G03 - Gastos en general  
COLON, 62, Ciudad Guzmán Centro, 49000, Ciudad Guzmán, Zapotlán el Grande, Jalisco, México

**Factura 7204**

**FOLIO FISCAL (UUID)**  
90CFAE30-D099-473C-B9B7-0D8D453A6B7E  
**NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT**  
00001000000403498740  
**NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR**  
00001000000401403109  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN**  
2019-01-07T11:14:03  
**RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN**  
FLI081010EK2  
**FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI**  
2019-01-07T11:08:12  
**LUGAR DE EXPEDICIÓN**  
28017

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48 - LOTE	RECIBIMOS DE H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO LA CANTIDAD DE \$19,827.09 (DIEZ Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y SIETE PESOS 09/100 M.N.) POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 (FINIQUITO) RELATIVO A LA CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERICO DEL TORO " UBICADA EN LA CALLE CALDERON, ENTRE LAS CALLES JOSE MARIA MORELOS Y IGNACIO ALDAMA, EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO, PROGRAMA CORRESPONDIENTE AL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2018 CONVENIO B, APROVADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018 CONTRATO DOP/FFIB/2018-05 FIANZA DE ANTICIPO NO. 4858-00051-9, FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 4858-00052-2 COMPANIA AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. MONTO PARA EFECTO DE PAGO \$17,249.57 (DIEZ Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 57/100 M.N.) ESTA FACTURA REPLAZA A LA FACTURA 7150	\$ 14,870.32	\$ 14,870.32
Clave Prod. Serv. - 80111618 Servicios temporales de construcción				
Impuestos:				
Traslados:				
002 IVA Base - \$ 14,870.32 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 2,379.25				

ARQ. JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS  
JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA PUBLICA

REPRESENTANTE LEGAL  
ING. RAUL ROMERO ARELLANO

DIRECCION DE GESTION DE PROGRAMAS COPLADEMUN Y VINCULACION CON SUBLEGAIONES

07 ENE 2019  
RECIBIDO

IMPORTE CON LETRA

DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS.  
57/100 MXN

SUBTOTAL \$ 14,870.32  
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 2,379.25  
TOTAL \$ 17,249.57

TIPO DE COMPROBANTE  
FORMA DE PAGO  
MÉTODO DE PAGO  
MONEDA

I - Ingreso  
03 - Transferencia electrónica de fondos  
PUE - Pago en una sola exhibición  
MXN - Peso Mexicano

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

K2OTDr0YoiITyB5KzX7Ca3YRiRzCwXQWHGk74apE3w6FFZzZjy1jCmD2VLcJK9rUxVnHdf+KA1BDIHk0BLcWYxhnUypJtjXSURYYi+WAdgxZeEs39YQz6qCrVbVzCk/bbnRZ1aEWQrlqPy9pu7CDWH+/AgGY1B8kn21C+wwq5nrolonn+9qqy59tRFd9Duh+WxQbk/Xqy4poTvO4XuzZPkgBA+ZCG27kZS65NXyCtMhNYf0qqXA2SmDzJKfRhWYOaxLw2DYzFHK0F4h2YDKRD61rdPDzCVMj2CAv73omQ8sVUV5sASP2m0AHGgLIbPANNbtigrzKmqQ==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

gXVwCqmZQods0wmtQlSi81+F4JhQm6N4DDxu4iCOGUS9m3ANJmXjPoiN0mxfDYuert4JYKJmaavbcQkUja11Jqkel6owNtCn6BD2AQtk9ZpAN0Yt+Z0W8Stdkpef1Sws2f6mYMK3aWXODDlryY5VLq1UKSfgzZ5pCziDMWyuWdWYfllb2VYQpinFchJyRU282aYshbySIL27S9s5Jir6w8f8r+M0iRgQ4qqCVMmPqAQIBXsuD2EJfNbv9El4RCSeD1O6DgM57hGlt8wQ7s/E7m5g7Opc4SIDIPqXOY9WkfqqaPhCmmPZ64MADiyIAAjqMQoL8hq2la9xHQ==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

l11.1j90CFAE30-D099-473C-B9B7-0D8D453A6B7E|2019-01-07T11:14:03|FLI081010EK2|K2OTDr0YoiITyB5KzX7Ca3YRiRzCwXQWHGk74apE3w6FFZzZjy1jCmD2VLcJK9rUxVnHdf+KA1BDIHk0BLcWYxhnUypJtjXSURYYi+WAdgxZeEs39YQz6qCrVbVzCk/bbnRZ1aEWQrlqPy9pu7CDWH+/AgGY1B8kn21C+wwq5nrolonn+9qqy59tRFd9Duh+WxQbk/Xqy4poTvO4XuzZPkgBA+ZCG27kZS65NXyCtMhNYf0qqXA2SmDzJKfRhWYOaxLw2DYzFHK0F4h2YDKRD61rdPDzCVMj2CAv73omQ8sVUV5sASP2m0AHGgLIbPANNbtigrzKmqQ==|0001000000403498740||



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS





**MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

**CONTROL DE OBRA PUBLICA**

FECHA: 31/12/2018

Contrato: DOP/FFIB/2018-05

Recurso: "FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN 2018 Convenio B", aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2018,

Contratista: D' CONCREFOCC SA DE CV

Obra: CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA FEDERICO DEL TORO

Ubicación: Calle Calderon. entre las calles Jose Maria Morelos y Ignacio Aldama, en Ciudad Guzman, Mpio. De Zapotlan el Grande, Jalisco

Localidad: CIUDAD GUZMAN, JALISCO.

Municipio: ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.

Fecha de Inicio: 03 DE DICIEMBRE

Fecha de Término: 31 DE DICIEMBRE

Estimación No.: 2 (FINIQUITO)

Periodo: 22/12/2018 Al: 31/12/2018

Resumen de Documento		
+ Importe de la Estimación	\$19,827.09	\$19,827.09
+ Aditiva	\$0.00	\$0.00
- Deductiva	\$0.00	\$0.00
+ IVA: 16%	\$3,172.33	\$22,999.43
- Amortización	\$5,749.86	\$17,249.57
<b>Total</b>	<b>\$17,249.57</b>	<b>\$17,249.57</b>

Avance	
Fecha Inicial:	03 DE DICIEMBRE
Financiero:	100.00%
Físico %	100.00%
Fecha:	31/12/2018

Techo Financiero	Importe	Acumulado	Importe
Presupuesto Base	\$688,462.22	Esta Estimación	\$22,999.43
Convenio Adicional	\$0.00	Acumulado Anterior	\$665,462.80
Suma Escalatorias	\$0.00	Acumulado Actual	\$688,462.23
<b>Total</b>	<b>\$688,462.22</b>	<b>Saldo</b>	<b>-\$0.01</b>

Anticipo		
Anticipo	25.00%	\$172,115.56
Amort. Del acumulado		\$166,365.70
Esta amortización		\$5,749.86
<b>Total Amortizado</b>		<b>\$172,115.56</b>
<b>Saldo por amortizar</b>		<b>\$0.00</b>

Detalle	Federal	Estatad	Municipio
Importe	\$14,870.32	\$0.00	\$0.00
Escalatoria	\$0.00	\$0.00	\$0.00
IVA	\$2,379.25	\$0.00	\$0.00
<b>Total a Facturar</b>	<b>\$17,249.57</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Deducción del 5 al millar (SFP)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Deducción del 2 al millar (CMIC)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$17,249.57</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

Sumas	
	\$14,870.32
	\$0.00
	\$2,379.25
	\$17,249.57
	\$0.00
	\$0.00
	\$17,249.57

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE  
PROGRAMAS COPLADEMUN Y  
VINCULACIÓN CON DELEGACIONES

27 DIC 2018

RECIBIDO

ARQ. JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS  
JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL  
DE OBRA PUBLICA

EMPRESA  
D' CONCREFOCC, SA DE CV

ING. RAUL ROMERO ARELLANO  
REPRESENTANTE LEGAL



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

# D' CONCREFOCC , SA DE CV

OBRA : CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA FEDERICO DEL TORO  
 UBICACIÓN : ESCUELA PRIMARIA FEDERICO DEL TORO  
 CONTRATO : DOP/FIB/2018-05  
 LOCALIDAD : CD. GUZMAN  
 MUNICIPIO : ZAPOTLAN EL GRANDE  
 ESTIMACION : 2 (FINIQUITO)

FECHA DE INICIO : lunes, 3 de diciembre de 2018  
 FECHA DE TERMINO : lunes, 31 de diciembre de 2018  
 ESTIMACION : 2 (FINIQUITO)  
 PERIODO DE TRABAJO : DEL 22 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018



## CUERPO DE ESTIMACION

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRESUP. BASE	ESTIMACION ACUMULADA	ESTA ESTIMACION	SALDO	PRECIO UNITARIO	PRESUP. BASE	ESTIMACION ACUMULADA	ESTA ESTIMACION	SALDO	VOLUMENES		IMPORTES		
	PRELIMINARES															
301-PRE-01-001	TRAZO Y NIVELACION MANUAL PARA ESTABLECER EJES, BANCO DE NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	510.00	510.00	0.00	0.00	\$12.26	\$6,252.60	\$6,252.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
301-PRE-04-102	DEMOLICIÓN DE FIRME DE CONCRETO DE 8 CM. DE ESPESOR A MANO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	12.00	12.00	0.00	0.00	\$65.24	\$782.88	\$782.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00				\$0.00
	CIMENTACION															
Z21	ZAPATA AISLADA DE 1.0X1.0X0.2 M. PERALTE PROMEDIO. DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA DEL NO. 4 A CADA 0.235 M. EN AMBOS SENTIDOS Y DADO DE 0.4X0.4X1.00 M. DE ALTURA, ARMADO CON 8 VARS.# 4 Y ESTRIBOS # 3 @ 0.1 M. INCLUYE: EXCAVACION A MANO EN TERRENO COMPACTO, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREROS, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HABILITADO, PLANTILLA, CIMBRADO ACABADO COMÚN, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, RELLENO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	12.00	12.00	0.00	0.00	\$3,617.55	\$43,410.60	\$43,410.60	\$0.00	\$0.00	\$43,410.60				
<b>TOTAL DE HOJA 1</b>																\$0.00

JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA PUBLICA  
 ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

REPRESENTANTE LEGAL  
 ING. RAÚL ROMERO ARELLANO



# D' CONCREFOCC , SA DE CV

OBRA : CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA FEDERICO DEL TORO  
 UBICACION : ESCUELA PRIMARIA FEDERICO DEL TORO  
 CONTRATO : DOP/FIIB/2018-05  
 LOCALIDAD : CD. GUZMAN  
 MUNICIPIO : ZAPOTLAN EL GRANDE  
 ESTIMACION : 2 (FINIQUITO)

FECHA DE INICIO : lunes, 3 de diciembre de 2018  
 FECHA DE TERMINO : lunes, 31 de diciembre de 2018  
 ESTIMACION : 2 (FINIQUITO)  
 PERIODO DE TRABAJO : DEL 22 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018



## CUERPO DE ESTIMACION

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRESUP. BASE	VOLUMENES			SALDO	IMPORTE				
				ESTIMACION ACUMULADA	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA		PRESUP. BASE	ESTIMACION ACUMULADA	ESTA ESTIMACION	SALDO	
304-ALB-06-014	ALBAÑILERIA REPOSICION DE PISO DE 6 CM ACABADO ESCOBILLADO, DE CONCRETO F'c= 150 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, NIVELACION, CIMBRADO DE FRONTERAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	12.00	12.00	0.00	0.00	\$363.51	\$4,362.12	\$4,362.12	\$0.00	\$0.00	
303-EST-02-010	ESTRUCTURA METALICA ESTRUCTURA METALICA INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA, APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO, MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	KG	4547.48	4765.26	0.00	-217.78	\$55.46	\$252,203.07	\$264,281.10	\$0.00	-\$12,078.03	
303-EST-03-001	CUBIERTA DE LONA CUBIERTA DE NAVE, SISTEMA DE LONA BLACKOUT DE 21 ONZAS O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, ANCLAJES, ELEVACION, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	606.03	525.20	47,738.17	33.09	\$415.33	\$251,702.44	\$218,131.32	\$19,827.09	\$13,744.03	
306-PYP-05-013	PINTURA PINTURA DE ESMALTE, EN ESTRUCTURA DE METALICA, APLICADA CON COMPRESORA, A DOS MANOS, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	KG	4547.48	4765.26	0.00	-217.78	\$7.65	\$34,788.20	\$36,454.21	\$0.00	-\$1,666.01	
<b>TOTAL DE HOJA 2</b>								\$19,827.09				
<b>SUB-TOTAL</b>								\$19,827.09				
<b>IVA (16%)</b>								\$3,172.33				
<b>TOTAL</b>								\$22,999.43				

JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA PUBLICA  
 ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

REPRESENTANTE LEGAL  
 ING. RAUL ROMERO ARELLANO







# H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO



## DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

### CROQUIS

OBRA: CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA FEDERICO DEL TORO  
DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE  
ESTIMACION NO: 2 (FINIQUITO)

FECHA: 30 DE DICIEMBRE DE 2018 PERIODO: 22 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUBIERTA DE NAVE. SISTEMA DE LONA BLACKOUT DE 21 ONZAS O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, ANCLAJES, ELEVACION, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

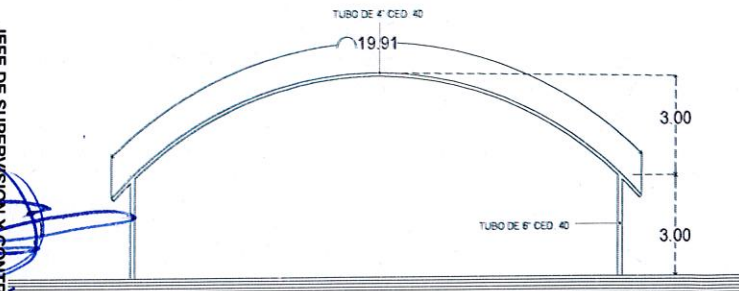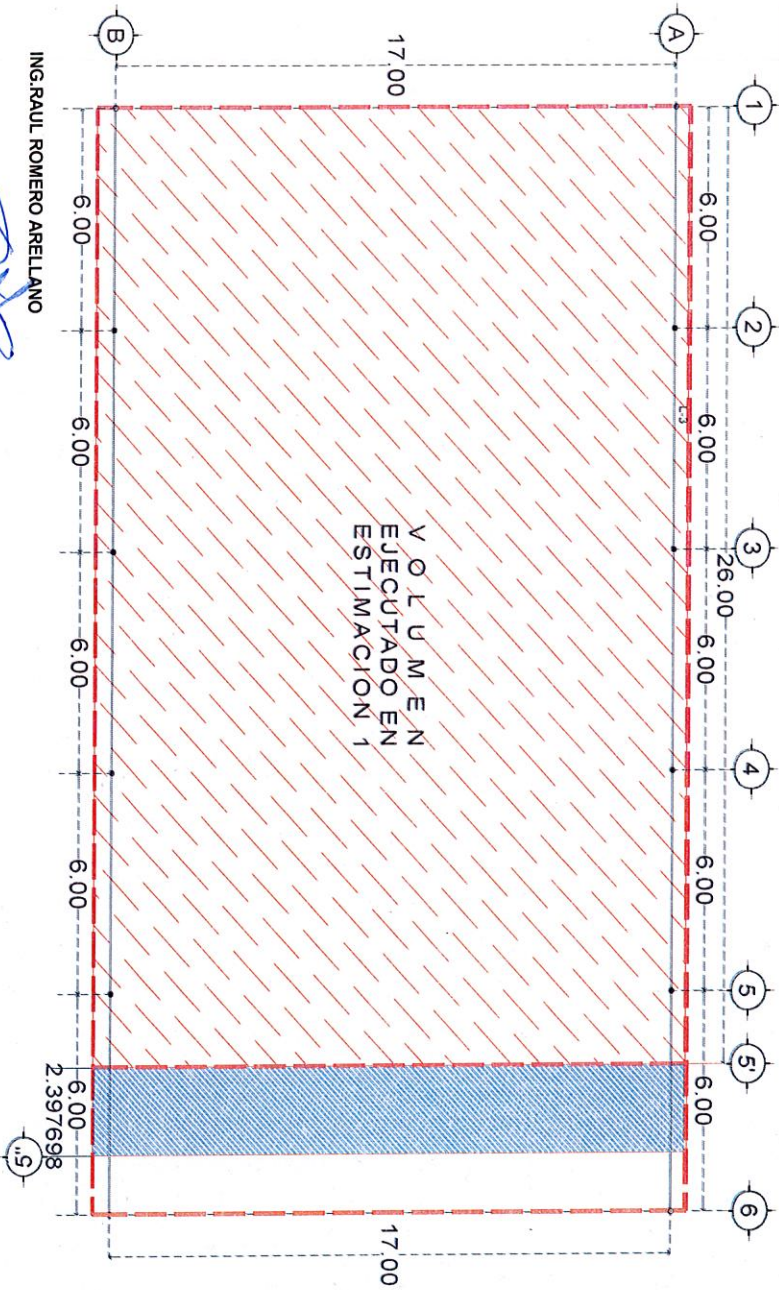

ING. RAUL ROMERO ARELLANO  
REPRESENTANTE LEGAL

JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA PUEBLA  
ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS



151. 2



DIRECCION DE GESTION DE  
PROGRAMAS Y COOPERACIONES  
VINCULADAS CON LAS REGIONES

27 DIC 2018

RECIBIDO
