



SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO

RFC: CATS931108IT6 ABASOLO No. 61 CENTRO, TECALITLAN 49900 TECALITLAN
JALISCO México

I - Ingreso Versión 3.3 Factura Serie y Folio: 8

FECHA: 27/12/2018 10:50:14

Folio Fiscal: B5810F70-916B-4850-B697-6B03828F335E
Fecha y hora de certificación: Diciembre 28 2018 - 10:45:17
Serie del Certificado del emisor: 00001000000412505599
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

CONDICIONES:

USO CFDI: G03 - Gastos en general

EXPEDIDO EN: CP: 49900

CLIENTE: 01 MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO	R.F.C.: MZG8501012NA
DOMICILIO: Av. Colon No. 62, COLONIA: Centro, POBLACION: Ciudad Guzmán, Jalisco, C.P.: 49000	
FORMA DE PAGO: 03 - Transferencia electrónica de fondos, MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición, MONEDA: MXN - Peso Mexicano	
Observaciones: Referencia:	

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	01 SAT: 30191800	RECIBIMOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO LA CANTIDAD DE \$ 1,184.26 (MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO .26/100 M.N.) POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION No 3 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA CONTRUCCION DEL DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA PRIMERO DE MAYO UBICADA EN LA CALLE PRIMERO DE MAYO No. 341 EN LA CIUDAD DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO CONTRATO: DOP/FFIB/2018-08 CON FIANZA DE ANTICIPO # 3502-12219-5 Y FINZA DE CUMPLIMIETO # 3502-12220-7 COMPAÑIA ASERTA AFINZADORA S.A. DE C.V.	1,020.91	002 - IVA - 163.35	1,020.91

IMPORTE CON LETRA	
MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 26/100 M.N.	
Este documento es una representación impresa de un CFDI	
612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales	
CFDI Relacionado:	
Tipo Relación: -	
CFDI Relacionado:	

SUBTOTAL:	1,020.91
Impuestos Traslados	
I.V.A. 16%:	163.35
TOTAL:	1,184.26

Sello digital del CFDI

JFNEg3p+BNc3YqsxLW7D2uVBrdyog5zoM/D3cE2lrhDnNpYKxs78B0XghHdpbe8AD8dMjSIV+AgQBvg/aRp aPz2WYj08N6QBn5DZ6iOaJvWxsC46zayqLBUmOh7WnNgJrzxYLNm0hWLYO97GJsOoCXRh7VgAK9RgpPL p9Z+3VTJA9azmrhJEUtJ8JLauHQku4qC1c1ZK4Ty+KUYEJZzwe+RSX00aZxh3REw/npzFrmjJeTxlYy/O 7A6w9AxeoJUpGk5WY8DRzoKjYAl04valxbY/IWCIRVo2bivUdHDzdYqJAe/v7dEJW8y4ZKJvamqVuEXEIA==

Sello del SAT

RjNxxwjbqCPUVVeaJqBkYZpN6H/f6pvyjlp9+vo1F5i/K3j6DSGXncUWaCZCo49gXpnUhmTgZVpvmvJat NAWGSFwGP6FGCFpJZicqSK4rKvrdVhNFvZK3GYhQ4LsrvaI/sex2weFXs9dkd8xJF8xL3icOsgw B47QRS/ByyM6Tal8rTUWHUC7uONRPNbx1N+TIBXhz7akzJ/CF1ccDAyU5XRHDB++FB7NDHI1DTGJO 78RYLQJ2MWDmG9IAHMDw2XwoPWkqXHVAVW3DWMxKTEUI91K6Gk7JLs2UXZx17SPRIUGTmL2aejx OPuzz3PgZMhwIAWgN2kqA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1].1[B5810F70-916B-4850-B697-6B03828F335E]2018-12-28T10:45:17[MAS0810247C0]JFNE g3p+BNc3YqsxLW7D2uVBrdyog5zoM/D3cE2lrhDnNpYKxs78B0XghHdpbe8AD8dMjSIV+AgQBvg/a RpaPz2WYj08N6QBn5DZ6iOaJvWxsC46zayqLBUmOh7WnNgJrzxYLNm0hWLYO97GJsOoCXRh7VgA K9RgpPLp9Z+3VTJA9azmrhJEUtJ8JLauHQku4qC1c1ZK4Ty+KUYEJZzwe+RSX00aZxh3REw/npzFrmjJeTxlYy/Oy7A6w9AxeoJUpGk5WY8DRzoKjYAl04valxbY/IWCIRVo2bivUdHDzdYqJAe/v7dEJ W8y4ZKJvamqVuEXEIA==[00001000000404486074]]



Banco:

Debe(mos) y pagare(mos) incondicionalmente por este Pagaré a la orden de SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO en TECALITLAN, JALISCO el día la cantidad de: \$1,184.26 (MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 26/100 M.N.), valor recibido en mercancía a mi (nuestra) entera satisfacción. Este pagaré es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su Artículo 173 parte final y artículos correlativos por no ser pagaré domiciliado. De no ser pagado a su vencimiento causara intereses moratorios del 5% mensual, todo cheque devuelto causara un 20% sobre el valor del mismo según artículo 7 y 39 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
Firma de Aceptación



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DIRECCION DE GESTION DE PROGRAMAS COPLADEMUN Y VINCULACION CON DELEGACIONES

27 DIC 2018

RECIBIDO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

**MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

CONTROL DE OBRA PUBLICA

FECHA: 15/12/2018

Contrato: DOP/FFIB/2018-08-019

Recurso: "FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN 2018 Convenio B", aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2018,

Contratista: ING. SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO

Obra: CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA PRIMERO DE MAYO

Localidad: CIUDAD GUZMAN, JALISCO.

Municipio:

ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.

Fecha de Inicio: 07 DE OCTUBRE

Fecha de Término:

15 DE DICIEMBRE

Estimación No.: 3 (FINIQUITO)

Periodo:

07/12/2018

Al:

15/12/2018

Resumen de Documento		
+ Importe de la Estimación	\$1,361.21	\$1,361.21
+ Aditiva	\$0.00	\$0.00
- Deductiva	\$0.00	\$0.00
+ IVA: 16%	\$217.79	\$1,579.00
- Amortización	\$394.74	\$1,184.26
Total	\$1,184.26	\$1,184.26





Avance	
Fecha Inicial:	07 DE OCTUBRE
Financiero:	100.00%
Fisico %	100.00%
Fecha:	15/12/2018

Techo Financiero	Importe	Acumulado	Importe
Presupuesto Base	\$366,628.68	Esta Estimacion	\$1,579.00
Convenio Adicional	\$0.00	Acumulado Anterior	\$365,049.68
Suma Escalatorias	\$0.00	Acumulado Actual	\$366,628.68
Total	\$366,628.68	Saldo	\$0.00

Anticipo		
Anticipo	25.00%	\$91,657.17
Amort. Del acumulado		\$91,262.43
Esta amortización		\$394.74
Total Amortizado		\$91,657.17
Saldo por amortizar		\$0.00

Detalle	Federal	Estatad	Municipio
Importe	\$1,020.91	\$0.00	\$0.00
Escalatoria	\$0.00	\$0.00	\$0.00
IVA	\$163.35	\$0.00	\$0.00
Total a Facturar	\$1,184.26	\$0.00	\$0.00
Deducción del 5 al millar (SFP)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Deducción del 2 al millar (CMIC)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total a Pagar	\$1,184.26	\$0.00	\$0.00

Sumas	
	\$1,020.91
	\$0.00
	\$163.35
	\$1,184.26
	\$0.00
	\$0.00
	\$1,184.26

 ARQ. JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	 ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA PUBLICA
EMPRESA	
 ING. SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO REPRESENTANTE LEGAL	
DIRECCION DE GESTION DE PROGRAMAS COPLADEMUN Y VINCULACION CON DELEGACIONES 27 DIC 2018 	

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CUERPO DE ESTIMACION

GOBIERNO DE ZAPOTLAN EL GRANDE		CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA PRIMERO DE MAYO											
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		ESTIMACION 3 (FINIQUITO)		MUNICIPIO: ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO		AL: 15/12/2018		PERIODO DE TRABAJO DEL: 07/12/2018		HOJA: 1 DE 2			
ESTIMACION DE TRABAJOS		No. DE CONTRATO: DOP/FFIB/2018-08/019		PRECIO UNITARIO		PRESUP. BASE		ESTIM. ACUM.		ESTIMA ESTIMACION		SALDO	
CONCEPTOS		U		CANTIDADES		PRESUP. BASE		ESTIM. ACUM.		ESTIMA ESTIMACION		SALDO	
PRELIMINARES													
301-PRE-01-001	TRAZO Y NIVELACION MANUAL PARA ESTABLECER EJES, BANCO DE NIVEL Y REFERENCIAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2		270.00	570.00	0.00	-300.0	\$ 6.01	\$ 1,622.70	\$ 3,425.70	0.00		-\$1,803.00
301-PRE-04-102	DEMOLICION DE FIRME DE CONCRETO DE 8 CM., DE ESPESOR A MANO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2		12.00	12.00	0.00	0.0	\$ 23.63	\$ 283.56	\$ 283.56	-		\$ 0.00
Z21	ZAPATA AISLADA DE 1.0X1.0X0.2 M. PERALTE PROMEDIO, DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC=250 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA DEL NO. 4 A CADA 0.235 M. EN AMBOS SENTIDOS Y DADO DE 0.4X0.4X1.00 M. DE ALTURA, ARMADO CON 8 VARS # 4, Y ESTRIBOS # 3 @ 0.1 M. INCLUYE: EXCAVACION A MANO EN TERRENO COMPACTO, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HABILITADO, PLANTILLA, CIMBRADO ACABADO COMUN, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, RELLENO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA		12.00	12.00	0.00	0.0	\$ 3,228.45	\$ 38,741.40	\$ 38,741.40	-		\$ 0.00
304-ALB-05-014	REPOSICION DE PISO DE 6 CM ACABADO ESCOBILLADO, DE CONCRETO FC=150 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, NIVELACION, CIMBRADO DE FRONTERAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2		12.00	12.00	0.00	0.0	\$ 229.13	\$ 2,749.56	\$ 2,749.56	-		\$ 0.00
Subtotal esta Hoja									\$ 43,397.22	\$ 45,200.22	\$ 0.00		-\$1,803.00
Total									\$ 43,397.22	\$ 45,200.22	\$ 0.00		\$ 0.00



OBRAS PUBLICAS

 DIRECTOR

JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL
 DE OBRA PUBLICA


ING. SIAMIR YOSAMI CARDENAS DEL TORO

ARQ. JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR
 DIRECTOR


DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS


CUERPO DE ESTIMACION


GOBIERNO DE ZAPOTLAN EL GRANDE
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE TRABAJOS

OBRA: CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA PRIMERO DE MAYO
ESTIMACION PERIODO DE TRABAJO: 3 (FINIQUITO) DEL: 07/12/2018 AL: 15/12/2018
MUNICIPIO: ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
No. DE CONTRATO: DOP/FFIB/2018-08/019 **HOJA:** 2 DE 2

CLAVE	CONCEPTOS	U	CANTIDADES			IMPORTE			ESTIMA ESTIMACION	SALDO
			PRESUP. BASE	ESTIM. ACUM.	ESTA ESTIM.	SALDO	PRECIO UNITARIO	PRESUP. BASE		
	ESTRUCTURA METALICA									
303-EST-02-010	ESTRUCTURA METALICA INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA, APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO, MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	KG	3,524,760	3524.76	0.00	0.0	\$ 48.42	\$ 170,668.88	\$ -	\$ 0.00
	CUBIERTA DE LONA									
303-EST-03-001	CUBIERTA DE NAVE, SISTEMA DE LONA BLACKOUT DE 21 ONZAS O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, ANCLAJES, ELEVACION, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	316,497.62	311.68292	4.81468	0.0	\$ 282.72	\$ 88,119.00	\$ 1,361.21	\$ 0.00
	PINTURA									
306-PYP-05-013	PINTURA DE ESMALTE, EN ESTRUCTURA DE METALICA, APLICADA CON COMPRESORA, A DOS MANOS, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	KG	3,524,760	3524.76	0.00	0.0	\$ 3.55	\$ 12,512.90	\$ -	\$ 0.00
			Subtotal esta Hoja					\$ 272,661.99	\$ 1,361.21	\$ 0.00
			Total					\$ 316,059.21	\$ 1,361.21	\$ 0.00

REPRESENTANTE LEGAL

ING. SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO

OBRA PUBLICAS

ARQ. JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR
DIRECTOR



JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA PUBLICAS

ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


GOBIERNO DE ZAPOTLAN EL GRANDE DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		CONTRATO No. DOP/FFIB/2018-08/019		OBSERVACIONES						
OBRA: CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA PRIMERO DE MAYO UBICACION: CIUDAD GUZMAN, JALISCO. CONTRATISTA: ING. SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO		ESTIMACION No. 3 (FINIQUITO) HOJA 1 DE 1								
NUMEROS GENERADORES DE OBRA										
No.	CONCEPTO	ELEMENTO.REFERENCIA	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	PESO	TOTAL	U	OBSERVACIONES

309-EST-03-001	CUBIERTA DE NAVE, SISTEMA DE LONA BLACKOUT DE 21 ONZAS O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, ANCLAJES, ELEVACION, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	CUBIERTA	0.456368	10.55				4.81468	M2	
								4.81468	M2	
								TOTAL:		


REPRESENTANTE LEGAL  _____ ING. SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO	JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA PUBLICA  _____ ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS
--	--



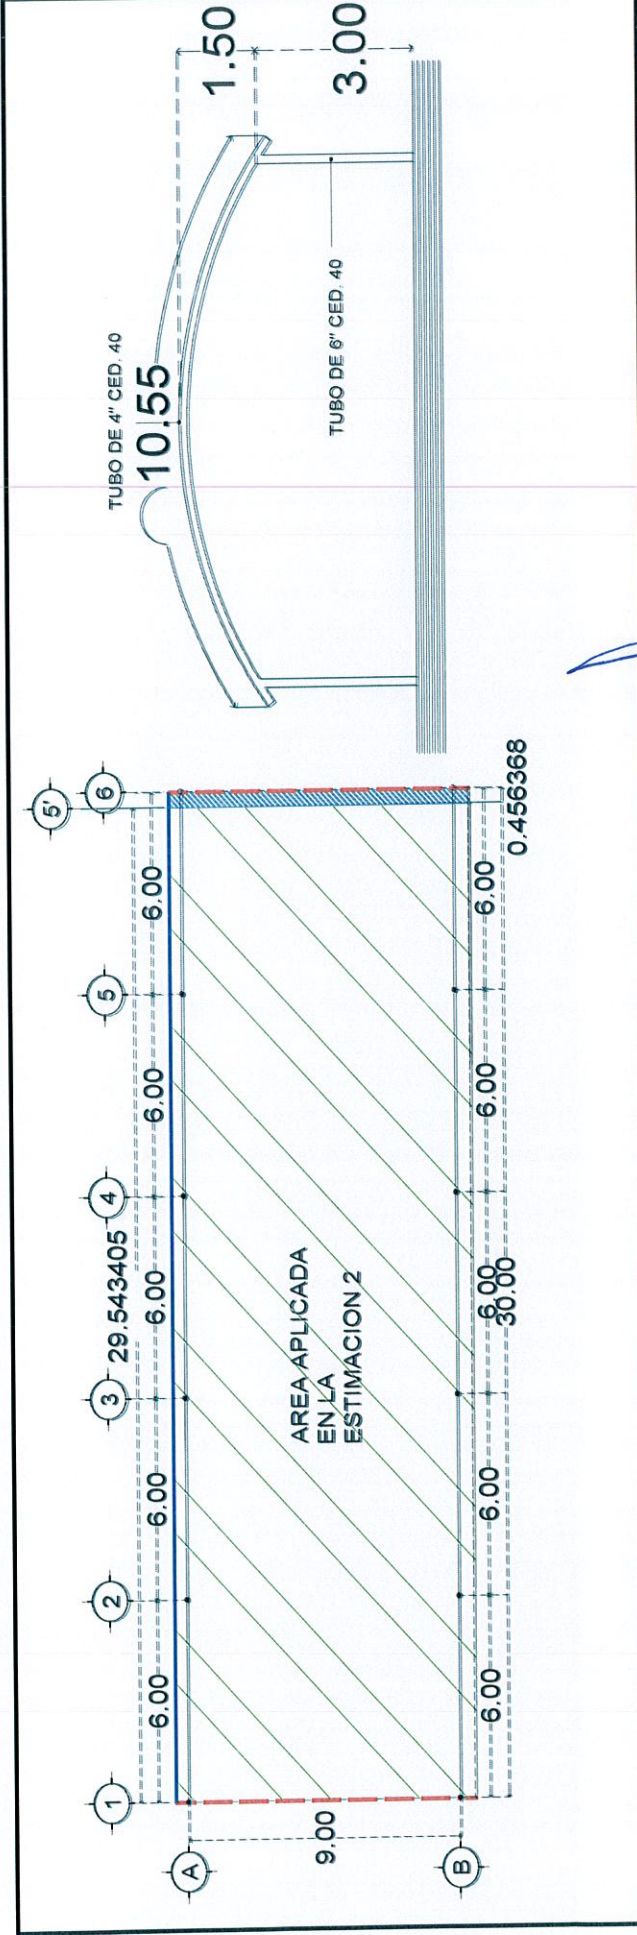

GOBIERNO DE ZAPOTLAN EL GRANDE DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO No.	DOP/FFIB/2018-08/019
	OBRA:	CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA PRIMERO DE MAYO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	UBICACION:	CIUDAD GUZMAN, JALISCO.
	CONTRATISTA:	ING. SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO
CROQUIS		
303-EST-03-001	CUBIERTA DE NAVE, SISTEMA DE LONA BLACKOUT DE 21 ONZAS O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, ANCLAJES, ELEVACION, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	



REPRESENTANTE LEGAL


 ING. SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO

JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA PUBLICA

 ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS


 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

GOBIERNO DE ZAPOTLAN EL GRANDE DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBRA: UBICACION: CONTRATISTA:	"CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA PRIMERO DE MAYO" CIUDAD GUZMAN, JAL. ING. SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO	ESTIMACION 3 FINIQUITO
REPORTE FOTOGRAFICO			
			
OBRAS PUBLICAS			
			
ING. SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO Representante Legal.	ARQ. JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR Director de Obras Publicas.	ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS Jefe de Supervision y Control de Obra Publica.	
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			

DIRECCION DE GESTION DE PROGRAMAS COPLEADENUR Y VINCULACION CON ELECCIONES

27 DIC 2018 And

RECIBIDO
