

**RODOLFO NAVARRO IBARRA**

NAIR8303248D2  
 RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal  
 SALVADOR DIAZ MIRON, 30, LOMA BONITA, 49020, CIUDAD GUZMAN, ZAPOTLAN  
 EL GRANDE, Jalisco, México  
 Tel. 3414125829

**CLIENTE**

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE  
 MZG8501012NA  
 USO CFDI: G03 - Gastos en general  
 COLON, 62, Ciudad Guzmán Centro, 49000, Ciudad Guzmán, Zapotlán el Grande,  
 Jalisco, México

**Factura 54**

FOLIO FISCAL (UUID)  
 455339DB-92BC-44F9-997E-BA66635BD562  
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000405535779  
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000409185865  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN  
 2018-12-28T11:31:35  
 RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN  
 FMD100203JS7  
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI  
 2018-12-28T11:24:42  
 LUGAR DE EXPEDICIÓN  
 49020

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	FACTURA ESTIMACIÓN #3 FINIQUITO: OBRA "CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESCUELA ANEXA A LA NORMAL", ubicado en calzada Madero I Carranza entre estadio Santa Rosa y Centro regional de Educación normal, en Cd. Guzmán Mpio de Zapotlán el Grande, No. Obra DOP/FFIB/2018-01/023 FIANZA DE ANTICIPO: 2260157 Afanzadora SOFIMEX, S.A. de C.V. por \$192484.75; FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 2260159 Afanzadora SOFIMEX, S.A. de C.V. por \$76,993.90;  Clave Prod. Serv. - 72101500 Servicios de apoyo para la construcción Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 3,410.24 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 545.64	\$ 3,410.24	\$ 3,410.24

IMPORTE CON LETRA

TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS, 88/100  
 MXN

TIPO DE COMPROBANTE  
 FORMA DE PAGO  
 MÉTODO DE PAGO  
 MONEDA

I - Ingreso  
 99 - Por definir  
 PPD - Pago en parcialidades o diferido  
 MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 3,410.24  
 TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 545.64  
 TOTAL \$ 3,955.88

ARQ. JESÚS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS  
 JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA PUBLICA

ING. RODOLFO NAVARRO IBARRA  
 CONTRATISTA



**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

KboK2GlgN3hF0AijE3xgGfekWpPq2NkxSi2EmaHBwFzj/XhYRdP8G8/ziQCSmHW6Ypospl18k5i8k25sg9+Spx1gFiteHr196NICP6YIODcm0VdeEWWa5A++liqcRRLZeOV  
 PrS6wREfY2NPNiQ0+C4XLh2FFBwJlPk+1VlaUr8j0j7wEzjcs9/+KhAdgLIISiH01qhEXwPAFAqeWOG6Kd1sDI9G88mvaV0XTjaY08HXgXB2L5uybMGXDzAafDyFip  
 6XIDITd3AvhsTofupDIWgK00SYo4SEswLjTouvamxCYnKQxBKVMu7CYTtbCvqCY2sUvVrhYjUzPzTg==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

NIAEm3JYRgTjZv8tatVcSjcmKQqPdt5vHjwhjgEHOBI++BbVA/QSuPtcB5f6EwLzTKyRSXGjHanV0dibcrg3LLg7spV0P87sDYZIHcvAM/e1KJM2x3H4TXXTPxetbvqxm  
 XeurESjDpZ25MPRFycn9/Wm/U4fNqZktWB0G672nwVApXNRAJc0WmtC3DN3UJyDplIEK7n/R34Dkhoa2FGRPEFyCEN9+0TxF5lGr5Zn8NydQOdXRPIQ0KJhXzie  
 gncCS3PfkAne+6cLpGeupCLClrZIF2nqFhE9JIIDADRig4XekQ+wD/8WmCg/8u1CaXK3jPDBr6DolRIA==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.1|455339DB-92BC-44F9-997E-BA66635BD562|2018-12-28T11:31:35|FMD100203JS7|KboK2GlgN3hF0AijE3xgGfekWpPq2NkxSi2EmaHBwFzj/XhYRdP8G8/ziQCSmHW6Ypospl18k5i8k25sg9+Spx1gFiteHr196NICP6YIODcm0VdeEWWa5A++liqcRRLZeOVPrS6wREfY2NPNiQ0+C4XLh2FFBwJlPk+1VlaUr8j0j7wEzjcs9/+KhAdgLIISiH01qhEXwPAFAqeWOG6Kd1sDI9G88mvaV0XTjaY08HXgXB2L5uybMGXDzAafDyFip6XIDITd3AvhsTofupDIWgK00SYo4SEswLjTouvamxCYnKQxBKVMu7CYTtbCvqCY2sUvVrhYjUzPzTg==|00001000000405535779||



DIRECCION DE GESTIÓN DE SERVICIOS EN DELEGACIONES  
 27 DIC 2018  
**RECIBIDO**

Folios Digitales®  
 Proveedor Autorizado de Certificación  
 No. SAT 55710



**MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**



**CONTROL DE OBRA PUBLICA**

FECHA: 15/12/2018

Contrato: DOP/FFIB/2018-01/023  
 Recurso: "FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN 2018 Convenio B", aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2018,  
 Contratista: ING. RODOLFO NAVARRO IBARRA  
 Obra: "CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESC. ANEXA A LA NORMAL"  
 Ubicación: Calle Arq. Vicente Mendiola Número 26, colonia Loma Bonita, entre la calle Maguey y Av. Juan José Arreola en Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán

Localidad: CIUDAD GUZMAN, JALISCO. Municipio: ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.  
 Fecha de Inicio: 07 DE OCTUBRE Fecha de Término: 15 DE DICIEMBRE  
 Estimación No.: 3 TRES (FINIQUITO) Periodo: 08/12/2018 Al: 15/12/2018

Resumen de Documento		
+ Importe de la Estimación	\$4,546.98	\$4,546.98
+ Aditiva	\$0.00	\$0.00
- Deductiva	\$0.00	\$0.00
+ IVA: 16%	\$727.52	\$5,274.50
- Amortización	\$1,318.63	\$3,955.88
<b>Total</b>	<b>\$3,955.88</b>	<b>\$3,955.88</b>

Avance	
Fecha Inicial:	07 DE OCTUBRE
Financiero:	100.00%
Físico %	100.00%
Fecha:	15/12/2018

Techo Financiero	Importe	Acumulado	Importe
Presupuesto Base	\$769,939.00	Esta Estimación	\$5,274.50
Convenio Adicional	\$0.00	Acumulado Anterior	\$764,664.50
Suma Escalatorias	\$0.00	Acumulado Actual	\$769,939.00
<b>Total</b>	<b>\$769,939.00</b>	<b>Saldo</b>	<b>\$0.00</b>

Anticipo		
Anticipo	25.00%	\$192,484.75
Amort. Del acumulado		\$191,166.13
Esta amortización		\$1,318.63
Total Amortizado		\$192,484.75
Saldo por amortizar		\$0.00

Detalle	Federal	Estatad	Municipio
Importe	\$3,410.24	\$0.00	\$0.00
Escalatoria	\$0.00	\$0.00	\$0.00
IVA	\$545.64	\$0.00	\$0.00
Total a Facturar	\$3,955.88	\$0.00	\$0.00
Deducción del 5 al millar (SFP)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Deducción del 2 al millar (CMIC)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total a Pagar	\$3,955.88	\$0.00	\$0.00

Sumas	
	\$3,410.24
	\$0.00
	\$545.64
	\$3,955.88
	\$0.00
	\$0.00
	\$3,955.88

ARQ. JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS  
JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA PUBLICA

EMPRESA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ING. RODOLFO NAVARRO IBARRA  
REPRESENTANTE LEGAL

DIRECCION DE GESTION DE PROGRAMAS COPLADEMUN Y VINCULACION CON DELEGACIONES

**27 DIC 2018**

RECIBIDO



## H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO


### DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES


OBRA: \*CONSTRUCCION DE DOMO EN ESC. ANEXA A LA NORMAL  
 CONTRATISTA: ING. RODOLFO NAVARRO IBARRA  
 LOCALIDAD: CD. GUZMAN JALISCO  
 MUNICIPIO: ZAPOTLÁN EL GRANDE  
 ESTIMACION: 3 TRES (TROCEN) TRES (TROCEN) TRES (TROCEN)  
 PERIODO DE EJECUCION: DEL 08 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2018


FECHA: 15/12/2018



No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	ESTIMADA	VOLUMENES			MONTOS			
					ACUMULADO ANTERIOR	SALDO	P.U.	PRESUPUESTO BASE	ESTA EST.	ACUMULADO ANTERIOR	SALDO
<b>*CONSTRUCCION DE DOMO EN ESC. ANEXA A LA NORMAL PRELIMINARES</b>											
301-PRE-01-001	TRAZO Y NIVELACION MANUAL PARA ESTABLECER EIES, BANCO DE NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	570.00	0.00	570.00	-	\$ 12.48	\$ 7,113.60	-	7,113.60	7,113.60
301-PRE-04-102	DEMOLICIÓN DE FIRME DE CONCRETO DE 8 CM., DE ESPESOR A MANO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	12.00	0.00	12.00	-	\$ 66.67	\$ 800.04	-	800.04	800.04
<b>CIMENTACION</b>											
Z21	ZAPATA AISLADA DE 1.0X1.0X0.2 M. PERALTE PROMEDIO, DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA DEL NO. 4 A CADA 0.235 M. EN AMBOS SENTIDOS Y DADO DE 0.4X0.4X1.00 M. DE ALTURA, ARMADO CON 8 VARIS. # 4 Y ESTRIBOS # 3 @ 0.1 M. INCLUYE: EXCAVACION A MANO EN TERRENO COMPACTO, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HABILITADO, PLANTILLA, CIMBRADO ACABADO COMÚN, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, RELLENO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	12.00	0.00	12.00	-	\$ 3,650.57	\$ 43,806.84	-	43,806.84	43,806.84
<b>ALBANILERIA</b>											
304-ALB-06-014	REPOSICIÓN DE PISO DE 6 CM ACABADO ESCOBILLADO, DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, NIVELACION, CIMBRADO DE FRONTERAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	12.00	0.00	12.00	-	\$ 368.94	\$ 4,427.28	-	4,427.28	4,427.28
SUMA ESTA HOJA      \$      -      -      -      -      -      -      -      -      - ACUMULADO      \$      56,147.76      56,147.76      56,147.76											

  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 ING. RODOLFO NAVARRO IBARRA

  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
 ARO. JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR

  
 JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA PUBLICAS  
 ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

## H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO

### DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

OBRA: CONSTRUCCION DE DOMO EN ESC. ANEXA A LA NORMAL  
 CONTRATISTA: ING. RODOLFO NAVARRO IBARRA  
 LOCALIDAD: CD. GUZMAN JALISCO  
 MUNICIPIO: ZAPOTLÁN EL GRANDE  
 ESTIMACION: 3 TRES (TRINQUITO)  
 PERIODO DE EJECUCION: DEL 08 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA: 15/12/2018



No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	ESTIMADA	VOLUMENES			MONITOS			
					ACUMULADO ANTERIOR	SALDO	P.U.	PRESUPUESTO BASE	ESTA EST.	ACUMULADO ANTERIOR	SALDO
<b>ESTRUCTURA METALICA</b>											
303-EST-02-010	ESTRUCTURA METALICA INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TRAZO, HABITADO, SOLDADURA, APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO, MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	KG	5,440.74	0.00	5512.60	-71,858	\$ 56.82	\$ 309,142.96	-	313,225.93	309,142.96
<b>CUBIERTA DE LONA</b>											
303-EST-03-001	CUBIERTA DE NAVE, SISTEMA DE LONA BLACKOUT DE 21 ONZAS O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, ANCLAJES, ELEVACION, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	610,7448	10,84732	588.82	11,077,7812	\$ 419.18	\$ 256,012.01	4,546.98	246,821.57	251,465.03
<b>PINTURA</b>											
306-FYP-05-013	PINTURA DE ESMALTE, EN ESTRUCTURA DE METALICA, APLICADA CON COMPRESORA, A DOS MANOS, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	KG	5,440.74200	0.00	5512.60	-71,858	\$ 7.80	\$ 42,437.79	-	42,998.28	42,437.79
SUMA ESTA HOJA											
					ACUMULADO	4546.98	603045.78	603,045.78	603,045.78	659,193.54	

SUB-TOTAL 4,546.98  
 IVA (16%) 727.52  
 TOTAL 5,274.50

REPRESENTANTE LEGAL ING. RODOLFO NAVARRO IBARRA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ARC. JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR
JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA PUBLICAS ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS	



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS





PROYECTO  
UBICACIÓN  
MUNICIPIO  
CONTRATISTA

"CONSTRUCCION DE DOMO EN ESC. ANEXA A LA NORMAL  
ESCUELA ANEXA A LA NORMAL  
ZAPOTLAN EL GRANDE  
ING. ADOLFO NAVARRO IBARRA

FECHA  
ESTIMACION


15/12/2018  
3 TRES (FINIQUITO)

CONCEPTO


303-EST-03-001

CUBIERTA DE NAVE, SISTEMA DE LONA BLACKOUT DE 21 ONZAS O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, ANCLAJES, ELEVACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

**CROQUIS**

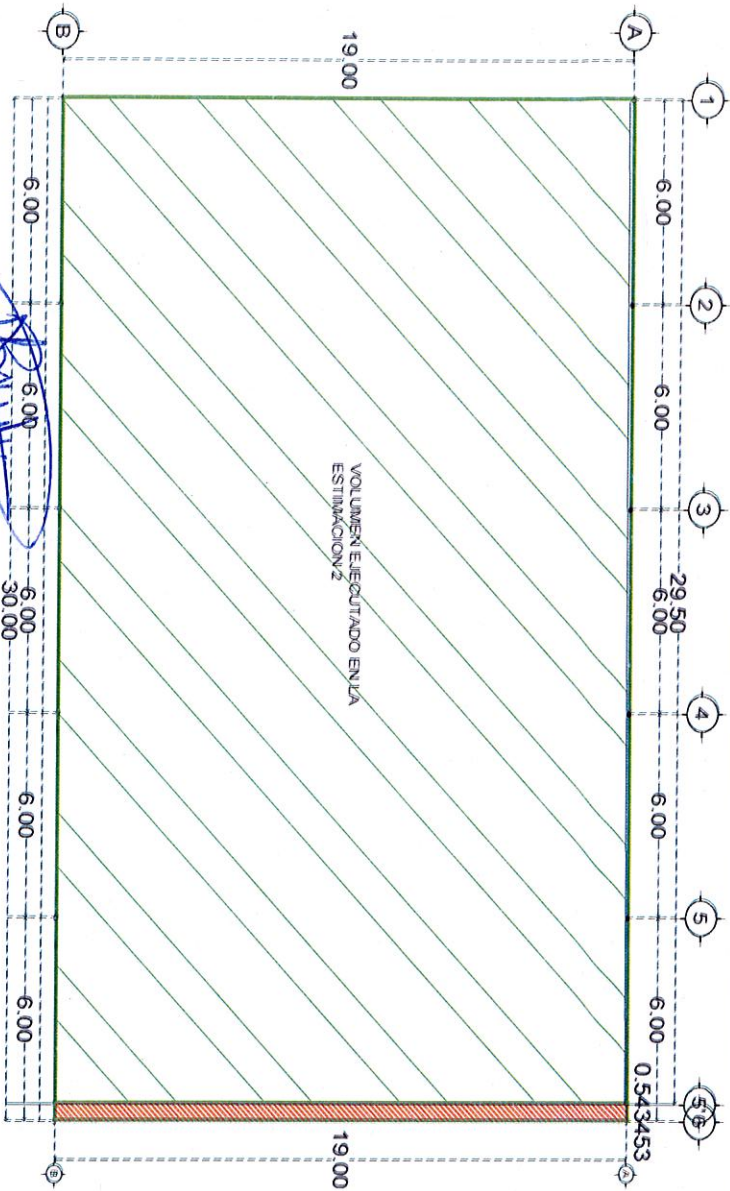

REPRESENTANTE LEGAL  
ING. RODOLFO NAVARRO IBARRA

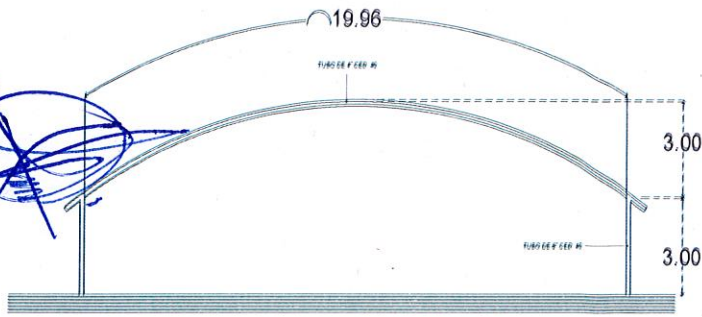

JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA PUBLICA  
ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS

