

D CONCREFOCC SA DE CV

DCO980225AW7
RÉGIMEN FISCAL: 801 - General de Ley Personas Morales
Cardenales, 57, Residencial Santa Bárbara, 28017, COLIMA, Colima, México
Tel. 3123302677

CLIENTE

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE
MZO8501012NA
USO CFDI: G03 - Gastos en general
COLON, 62, Ciudad Guzmán Centro, 49000, Ciudad Guzmán, Zapotlán el Grande, Jalisco, México

Factura 7201

FOLIO FISCAL (UUID)
CB76E3DE-8A8D-49A1-9BE4-FA83B77E3169
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000403498740
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000401403109
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2019-01-07T11:01:03
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
FLI081010EK2
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2019-01-07T11:05:00
LUGAR DE EXPEDICIÓN
28017

Table with columns: Cantidad, Unidad, Descripción, Precio Unitario, Importe. Row 1: 1.00, E48 - LOTE, RECIBIMOS DE H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO LA CANTIDAD DE \$2,940.40...

Clave Prod. Serv. - 80111618 Servicios temporales de construcción
Impuestos:
Traslados:
002 IVA Base - \$ 2,205.30 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 352.85

ARQ. JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS
JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA PUBLICA

REPRESENTANTE LEGAL
ING. RAUL ROMERO ARELLANO

DIRECCION DE GESTION DE PROGRAMAS DE COPLADEMUN Y VINCULACION CON LAS DELEGACIONES
07 ENE 2019 H

IMPORTE CON LETRA

DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS, 15/108 MXN

SUBTOTAL \$ 2,205.30
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 352.85
TOTAL \$ 2,558.15

TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
MONEDA

I - Ingreso
03 - Transferencia electrónica de fondos
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso Mexicano

SELLO DIGITAL DEL CFDI

UICi50v8z+KZiZf5V3Nzm8GAu+HorY6dYMiFhSdN33LC23VSDXx4hakiFKZ9pxYG+KGCjJ20mWAg9z72LZgu4Jrp2+qrrTJvJFNQJDAIMZif7evgC57UJ06cT0gkrBKB... (QR code)

SELLO DIGITAL DEL SAT

VrAgGxa9hyKVin5USDiR7UqWOBAMHhAInju0HAJgxafi7iUWuBycXpTocEBTF3vN175nwy3daJfrBJLpWAKGGuuhWjH5fN+bC4tAFIP7eOJYsG7MMfAxQmN1+Kx... (QR code)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|CB76E3DE-8A8D-49A1-9BE4-FA83B77E3169|2019-01-07T11:01:03|FLI081010EK2|UICi50v8z+KZiZf5V3Nzm8GAu+HorY6dYMiFhSdN33LC23VSDXx4hakiFKZ9pxYG+KGCjJ20mWAg9z72LZgu4Jrp2+qrrTJvJFNQJDAIMZif7evgC57UJ06cT0gkrBKB... (QR code)





**MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

**CONTROL DE OBRA PUBLICA**

FECHA: 15/12/2018

Contrato: DOP/FFIB/2018-08/019

Recurso: "FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN 2018 Convenio B", aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2018,

Contratista: D' CONCREFOCC SA DE CV

Obra: "CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CENITO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS No. 226"

Ubicación: Calle Arq. Vicente Mendiola Número 26, colonia Loma Bonita, entre la calle Maguey y Av. Juan José Arreola en Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán

Localidad: CIUDAD GUZMAN, JALISCO.

Municipio: ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.

Fecha de Inicio: 07 DE OCTUBRE

Fecha de Término: 15 DE DICIEMBRE

Estimación No.: 3 (FINIQUITO)

Periodo: 09/12/2018 Al: 15/12/2018

Resumen de Documento		
+ Importe de la Estimación	\$2,940.40	\$2,940.40
+ Aditiva	\$0.00	\$0.00
- Deductiva	\$0.00	\$0.00
+ IVA: 16%	\$470.46	\$3,410.86
- Amortización	\$852.71	\$2,558.15
<b>Total</b>	<b>\$2,558.15</b>	<b>\$2,558.15</b>

Avance	
Fecha Inicial:	07 DE OCTUBRE
Financiero:	100.00%
Físico %	100.00%
Fecha:	15/12/2018

Techo Financiero	Importe	Acumulado	Importe
Presupuesto Base	\$599,757.12	Esta Estimación	\$3,410.86
Convenio Adicional	\$0.00	Acumulado Anterior	\$596,346.26
Suma Escalatorias	\$0.00	Acumulado Actual	\$599,757.12
<b>Total</b>	<b>\$599,757.12</b>	<b>Saldo</b>	<b>\$0.00</b>

Anticipo		
Anticipo	25.00%	\$149,939.28
Amort. Del acumulado		\$149,086.57
Esta amortización		\$852.71
Total Amortizado		\$149,939.28
Saldo por amortizar		\$0.00

Detalle	Federal	Estatal	Municipio
Importe	\$2,205.30	\$0.00	\$0.00
Escalatoria	\$0.00	\$0.00	\$0.00
IVA	\$352.85	\$0.00	\$0.00
Total a Facturar	\$2,558.15	\$0.00	\$0.00
Deducción del 5 al millar (SFP)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Deducción del 2 al millar (CMIC)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total a Pagar	\$2,558.15	\$0.00	\$0.00

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PROGRAMAS COPLADEMUNICIPALES DE INCULCACIÓN CON DELEGACIONES

27 DIC 2018

Sumas
\$2,205.30
\$0.00
\$352.85
\$2,558.15
\$0.00
\$0.00
\$2,558.15

**RECIBIDO**

 <b>ARQ. JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR</b> DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	 <b>ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS</b> JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA PUBLICA
EMPRESA <b>D' CONCREFOCC, SA DE CV</b>  <b>ING. RAUL ROMERO ARELLANO</b> REPRESENTANTE LEGAL	 DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

# D' CONCREFOCC , SA DE CV

OBRA : "CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS No. 226"


UBICACIÓN : CETIS No. 226  
 CONTRATO : DOP/FIIB/2018-08/019  
 LOCALIDAD : CD. GUZMAN  
 MUNICIPIO : ZAPOTLAN EL GRANDE  
 ESTADO : JALISCO

FECHA DE INICIO : domingo, 7 de octubre de 2018  
 FECHA DE TERMINO : sábado, 15 de diciembre de 2018

ESTIMACION : 3 (FINQUITO)  
 PERIODO DE TRABAJO : DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2018

## CUERPO DE ESTIMACION

CANTIDAD	CONCEPTO	CORRIENTES					CORTES				
		UNIDAD	RESERVA BASE	ESTIMACION AGUINIDAD	ESTIMACION	CAJUDO	IMPORTE INICIAL	RESERVA BASE	ESTIMACION AGUINIDAD	ESTIMACION	CAJUDO
<b>PRELIMINARES</b>											
TRA-613.1	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO SENCILLAMENTE PLANO UTILIZANDO EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO BANCOS DE NIVEL Y EJES DE REFERENCIA INCLUYE: ESTACAS, PINTURA Y TODO LO QUE SEA NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	246.60	246.60	0.00	246.60	\$6.70	\$1,652.22	\$1,652.22	\$0.00	\$0.00
DEM-001	DEMOLICIÓN DE FIRME DE CONCRETO DE 8 CM. DE ESPESOR A MANO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	10.00	10.00	0.00	10.00	\$66.46	\$664.60	\$664.60	\$0.00	\$0.00
<b>CIMENTACION</b>											
Z10	ZAPATA AISLADA DE 1.0X1.0X0.2 M. PERALTE PROMEDIO, DE CONCRETO HECHO EN OBRA, F.C=250 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA DEL NO. 4 A CADA 0.235 M. EN AMBOS SENTIDOS Y DADO DE 0.4X0.4X1.00 M. DE ALTURA, ARMADO CON 8 VARS # 4, Y ESTRIBOS # 3 @ 0.1 M. INCLUYE: EXCAVACION A MANO EN TERRENO COMPACTO, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HABILITADO, PLANTILLA, CIMBRADO ACABADO COMÚN, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, RELLENO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	10.00	10.00	0.00	10.00	\$3,645.56	\$36,455.60	\$36,455.60	\$0.00	\$36,455.60
<b>TOTAL DE HOJA 1</b>											<b>\$0.00</b>



JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA PUBLICA  
 ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



REPRESENTANTE LEGAL  
 ING. RAUL ROMERO ARELLANO


*[Handwritten signature]*

# D' CONCREFOCC, SA DE CV

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS No. 228"  
 UBICACIÓN: CBATIS No. 226  
 CONTRATO: DOP/FIB/2018-08/019  
 LOCALIDAD: CD. GUZMAN  
 MUNICIPIO: ZAPOTLAN EL GRANDE  
 ESTADO: JALISCO

## CUERPO DE ESTIMACION

FECHA DE INICIO: domingo, 7 de octubre de 2018  
 FECHA DE TERMINO: sábado, 15 de diciembre de 2018  
 ESTIMACION: 3 (FINIQUITO)  
 PERIODO DE TRABAJO: DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2018



ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE																																												
CON-01	REPOSICIÓN DE PISO DE 6 CM ACABADO ESCOBILLADO, DE CONCRETO F.C= 150 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, NIVELACION, CIMBRADO DE FRONTERAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	\$368.05	\$3,680.50	\$3,680.50	\$0.00	\$0.00																																										
EST-001	ESTRUCTURA METALICA INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA, APLICACION DE PRIMER ANTI CORROSIVO, MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	KG	4729.80	4877.70	0.00	4729.80	\$59.70	\$282,388.88	\$291,198.69	\$0.00	\$0.00	-\$8,829.81																																										
CUB-01	CUBIERTA DE NAVE, SISTEMA DE LONA BLACKOUT DE 21 ONZAS O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, ANCLAJES, ELEVACION, TUBACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	363.521	333.34	6.87152764	356.65	\$427.91	\$155,554.27	\$142,637.81	\$2,940.40	\$9,976.07																																											
PINT-001	PINTURA DE ESMALTE, EN ESTRUCTURA DE METALICA, APLICADA CON COMPRESORA, A DOS MANOS, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	KG	4729.797	4877.70	0.00	4729.80	\$7.75	\$36,655.93	\$37,802.18	\$0.00	\$0.00	-\$1,146.25																																										
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL DE HOJA 2</td> <td>\$2,940.40</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SUB-TOTAL</td> <td>\$2,940.40</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>IVA (16%)</td> <td>\$470.46</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>\$3,410.86</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>											TOTAL DE HOJA 2	\$2,940.40										SUB-TOTAL	\$2,940.40										IVA (16%)	\$470.46										TOTAL	\$3,410.86									
TOTAL DE HOJA 2	\$2,940.40																																																					
SUB-TOTAL	\$2,940.40																																																					
IVA (16%)	\$470.46																																																					
TOTAL	\$3,410.86																																																					

JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA PUBLICA  
 ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS


*damian*

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS



REPRESENTANTE LEGAL  
 ING. RAUL ROMERO ARELLANO







**H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO**  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**  
**CROQUIS**

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS No. 226" DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE ESTIMACION No: 3 (FINIQUITO)

FECHA: 15 DE DICIEMBRE DE 2018 PERIODO: DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2018

CUBIERTA DE NAVE, SISTEMA DE LONA BLACKOUT DE 21 ONZAS O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, ANCLAJES, ELEVACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

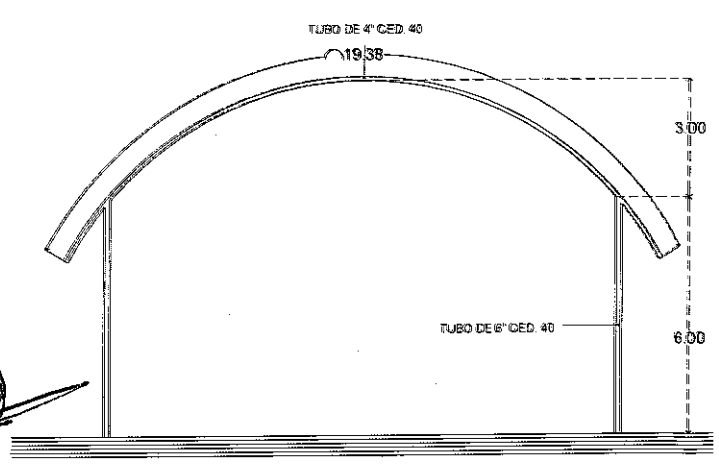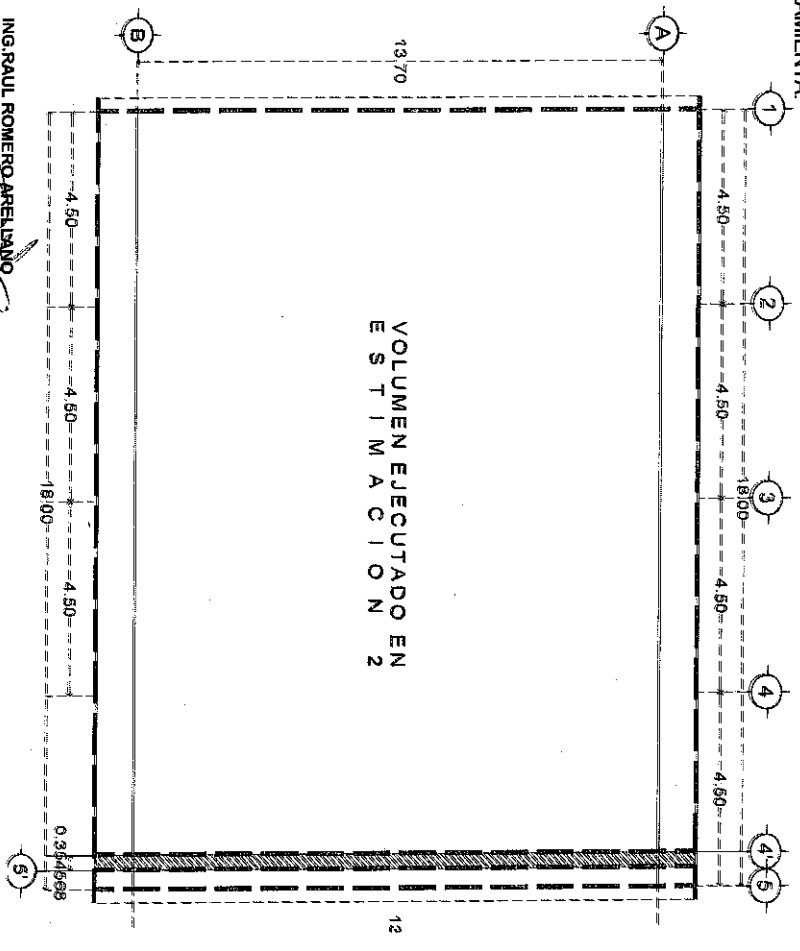

ING. RAUL ROMERO ARELLANO  
 REPRESENTANTE LEGAL

JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA PUBLICA  
 ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS

