

D CONCREFOCC SA DE CV

DCO980225AW7
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
Cardenales, 57, Residencial Santa Bárbara, 28017, COLIMA, Colima, México
Tel. 3123302877

CLIENTE

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE
MZG8501012NA

USO CFDI: G03 - Gastos en general
COLON, 62, Ciudad Guzmán Centro, 49000, Ciudad Guzmán, Zapotlán el Grande, Jalisco, México

Factura 7203

FOLIO FISCAL (UUID)

EA3FDBE1-99DD-4DFB-B60A-BFA647327C47

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000403498740

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000401403109

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-01-07T11:10:50

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FLI081010EK2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-01-07T11:04:59

LUGAR DE EXPEDICIÓN

28017

Table with columns: Cantidad, Unidad, Descripción, Precio Unitario, Importe. Row 1: 1.00, E48 - LOTE, RECIBIMOS DE H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE... \$ 1,126.51, \$ 1,126.51

RECIBIMOS DE H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO LA CANTIDAD DE \$1,502.02 (MIL QUINIENTOS DOS PESOS 02/100 M.N.) POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACION No. 3 (FINIQUITO) RELATIVO A LA OBRA "CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA RAMON CORONA" UBICADO: CALLE DAVID ALFARO SIQUEIROS S/N, ENTRE AV OBISPO SERAFIN VAZQUEZ ELIZALDE Y CALLE LAURA DE APODACA EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO; PROGRAMA CORRESPONDIENTE AL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018 CONTRATO DOP/FFIB/2018-03/014 FIANZA DE ANTICIPO NO.4858-00037-5 FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 4858-00038-0 COMPANIA AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. MONTO PARA EFECTO DE PAGO \$1,306.75 (MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS 75/100 M.N.) ESTA FACTURA REPLAZA A LA FACTURA 7148

Clave Prod. Serv. - 80111618 Servicios temporales de construcción

Impuestos:

002 IVA Base - \$ 1,126.51 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 180.24

ARQ. JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS

JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE

OBRA PUBLICA

DIRECCION DE GESTION DE PROGRAMAS COPLADEMUN Y VINCULACION CON LAS DELEGACIONES

07 ENE 2019

RECIBIDO

Handwritten signature of Raul Romero Arellano

REPRESENTANTE LEGAL

ING. RAUL ROMERO ARELLANO

IMPORTE CON LETRA

MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS, 75/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

1 - Ingreso

FORMA DE PAGO

03 - Transferencia electrónica de fondos

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 1,126.51
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 180.24
TOTAL \$ 1,306.75

SELLO DIGITAL DEL CFDI

DniagJKgDfSCpJlICuBv3pAH+Z4e1FrtvNl6Jc7t4At1ByMkDlpXzf1RoYYmicec8PymcHME+HYZhoAYVnzRkb1YpvbR9VBWok2L2P5IEG9scptnBdPvVJbzdmeJb2Qw1U86f3tg3z3xllAYwKMidY1U+YttrkAPjd8xDjpEJ75Hg1n4e5foydQTelsrGBptkUhxmdx+jeXsQnW-HOZ8imf+L+XVM+XFAdHoUAlUvMQGLV95IEJLb+UPjBqXusS8A vDXUqVHVvdTKINLZ6JgYNbfp0GajytlbQQRAD+rk327aKnM7TQyu+H5Kq4z9XKMU1Q9mwjZw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

L/MHfKpuLe5XlFInC8kzXrhMzh10S9GJTXV8k0C641KcNdfACKLEzLMjOYYtlnLWVQqJ7SN1x8aY7QHj/gg+c5SclstNU+wh9xUmH8fgo5X/Lz/CzknDArma2tdN0qVufKdv cNDJN3IYPK5/IN+/LNgSvoO+6o/COQ7P3JgRaJZAUDZmyrz32qR+OT4oc10CZRwuAwBa+tda+NFet6/r7SYaac9/hOjpeE0TndHbkl.SSA7DGZfSmUsP8S9pJtvaVKOP kZJTDkxqYrYtpj966c2JrZLgzAmGgAtrZ6i84K8RW98pHqMg7w4YUTHKbWfSislxuAVTPIeTFZ/Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

111EA3FDBE1-99DD-4DFB-B60A-BFA647327C47|2019-01-07T11:10:50|FLI081010EK2|DniagJKgDfSCpJlICuBv3pAH+Z4e1FrtvNl6Jc7t4At1ByMkDlpXzf1RoYYmicec8PymcHME+HYZhoAYVnzRkb1YpvbR9VBWok2L2P5IEG9scptnBdPvVJbzdmeJb2Qw1U86f3tg3z3xllAYwKMidY1U+YttrkAPjd8xDjpEJ75Hg1n4e5foydQTelsrGBptkUhxmdx+jeXsQnW-HOZ8imf+L+XVM+XFAdHoUAlUvMQGLV95IEJLb+UPjBqXusS8AvDXUqVHVvdTKINLZ6JgYNbfp0GajytlbQQRAD+rk327aKnM7TQyu+H5Kq4z9XKMU1Q9mwjZw==|00001000000403498740|



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



**MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

**CONTROL DE OBRA PUBLICA**

FECHA: 15/12/2018

Contrato: DOP/FFIB/2018-03/014

Recurso: "FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN 2018 Convenio B", aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2018,

Contratista: D' CONCREFOCC SA DE CV

Obra: CONSTRUCCION DE DOMO EN ESC. PRIM. RAMON CORONA

Ubicación: Calle David Alfaro Siqueiros s/n, entre Av. Obispo Serafín Vázquez Elizalde y Calle Laura de Apodaca

Localidad: CIUDAD GUZMAN, JALISCO.

Municipio: ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.

Fecha de Inicio: 07 DE OCTUBRE

Fecha de Término: 15 DE DICIEMBRE

Estimación No.: 3 (FINIQUITO)

Periodo: 09/12/2018 Al: 15/12/2018

Resumen de Documento		
+ Importe de la Estimación	\$1,502.02	\$1,502.02
+ Aditiva	\$0.00	\$0.00
- Deductiva	\$0.00	\$0.00
+ IVA: 16%	\$240.32	\$1,742.34
- Amortización	\$435.59	\$1,306.76
<b>Total</b>	<b>\$1,306.76</b>	<b>\$1,306.76</b>

Avance	
Fecha Inicial:	07 DE OCTUBRE
Financiero:	100.00%
Físico %	100.00%
Fecha:	15/12/2018

Techo Financiero	Importe	Acumulado	Importe
Presupuesto Base	\$769,315.70	Esta Estimacion	\$1,742.34
Convenio Adicional	\$0.00	Acumulado Anteri	\$767,573.36
Suma Escalatorias	\$0.00	Acumulado Actua	\$769,315.70
<b>Total</b>	<b>\$769,315.70</b>	<b>Saldo</b>	<b>\$0.00</b>

Anticipo		
Anticipo	25.00%	\$192,328.93
Amort. Del acumulado		\$191,893.34
Esta amortización		\$435.59
Total Amortizado		\$192,328.92
Saldo por amortizar		\$0.00

Detalle	Federal	Estatad	Municipio
Importe	\$1,126.51	\$0.00	\$0.00
Escalatoria	\$0.00	\$0.00	\$0.00
IVA	\$180.24	\$0.00	\$0.00
Total a Facturar	\$1,306.75	\$0.00	\$0.00
Deducción del 5 al millar (SFP)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Deducción del 2 al millar (CMIC)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total a Pagar	\$1,306.75	\$0.00	\$0.00

Sumas	
	\$1,126.51
	\$0.00
	\$180.24
	\$1,306.75
	\$0.00
	\$0.00
	\$1,306.75

**ARQ. JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR**  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

**ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS**  
 JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA PUBLICA

EMPRESA  
D' CONCREFOCC, SA DE CV


**ING. RAUL ROMERO ARELLANO**  
 REPRESENTANTE LEGAL

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

# D' CONCREFOCC, SA DE CV

OBRA : CONSTRUCCION DE DOMO EN ESC. PRIM. RAMON CORONA  
 UBICACION : ESCUELA RAMON CORONA  
 CONTRATO : DOP/FFIB/2018-03/014  
 LOCALIDAD : CD. GUZMAN  
 MUNICIPIO : ZAPOTLAN EL GRANDE  
 ESTADO : JALISCO

FECHA DE INICIO : domingo, 7 de octubre de 2018  
 FECHA DE TERMINO : sábado, 15 de diciembre de 2018  
 ESTIMACION : 3 (FINQUITO)  
 PERIODO DE EJECUCION : DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2018



## CUERPO DE ESTIMACION

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	RECURSOS BASES	ESTIMACION ACUMULADA	ESTI. ESTIMACION	GASTO	MATERIAL UNITARIO	RECURSOS BASES	ESTIMACION ACUMULADA	ESTIMACION	GASTO	
												VOLUMENES
<b>PRELIMINARES</b>												
301-PRE-01-001	TRAZO Y NIVELACION MANUAL PARA ESTABLECER EJES, BANCO DE NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	570.00	570.00	0.00	570.00	\$12.45	\$7,096.50	\$7,096.50	\$0.00	\$0.00	
301-PRE-04-102	DEMOLICION DE FIRME DE CONCRETO DE 8 CM. DE ESPESOR A MANO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	12.00	12.00	0.00	12.00	\$66.47	\$797.64	\$797.64	\$0.00	\$0.00	
<b>CIMENTACION</b>												
Z21	ZAPATA AISLADA DE 1.0X1.0X0.2 M. PERALTE PROMEDIO, DE CONCRETO HECHO EN OBRA F.C.=250 KG/CM2. ARMADA CON VARILLA DEL NO. 4 A CADA 0.235 M. EN AMBOS SENTIDOS Y DADO DE 0.4X0.4X1.00 M. DE ALTURA, ARMADO CON 8 VARS # 4 Y ESTRIOS # 3 @ 0.1 M. INCLUYE: EXCAVACION A MANO EN TERRENO COMPACTO, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HABILITADO, PLANTILLA, CIMBRADO ACABADO COMUN, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, RELLENO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	12.00	12.00	0.00	12.00	\$3,646.53	\$43,758.36	\$43,758.36	\$0.00	\$43,758.36	
<b>TOTAL DE HOJA 1</b>												<b>\$0.00</b>

JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA PUBLICA  
 ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS




DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

REPRESENTANTE LEGAL  
 ING. RAUL ROMERO ARELLANO

# D' CONCREFOCC, SA DE CV

OBRA: CONSTRUCCION DE DOMO EN ESC. PRIM. RAMON CORONA  
 UBICACION: ESCUELA RAMON CORONA  
 CONTRATO: DOP/FFIB/2018-03/014  
 LOCALIDAD: CD. GUZMAN  
 MUNICIPIO: ZAPOTLAN EL GRANDE  
 ESTADO: JALISCO

FECHA DE INICIO: domingo, 7 de octubre de 2018  
 FECHA DE TERMINO: sabado, 15 de diciembre de 2018  
 ESTIMACION: 3 (FINIQUITO)  
 PERIODO DE EJECUCION: DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2018



## CUERPO DE ESTIMACION


CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	MATERIAS PRIMAS			MANTENIMIENTO					
			ESTIMACION ACUMULADA	ESTIMACION	ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA	ESTIMACION	ESTIMACION			
303-EST-03-001	M2	REPOSICION DE PISO DE 6 CM ACABADO ESCOBILLADO, DE CONCRETO F.C= 150 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, NIVELACION, CIMBRADO DE FRONTERAS; MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	12.00	12.00	0.00	12.00	\$368.10	\$4,417.20	\$4,417.20	\$0.00	\$0.00
303-EST-02-010	KG	ESTRUCTURA METALICA INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA, APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO, MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	5440.74	5671.76	0.00	5440.74	\$55.80	\$303,593.40	\$316,484.21	\$0.00	-\$12,890.81
302-CIM-01-061	M2	CUBIERTA DE LONA SISTEMA DE LONA BLACKOUT DE 21 ONZAS O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, ANCLAJES, ELEVACION, FIJACION; MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	610.745	572.93	3.509713	607.24	\$427.96	\$261,374.34	\$245,191.12	\$1,502.02	\$14,681.20
330-APO-02-007	KG	PINTURA DE ESMALTE, EN ESTRUCTURA DE METALICA, APLICADA CON COMPRESORA A DOS MANOS, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	5440.742	5671.76	0.00	5440.74	\$7.75	\$42,165.75	\$43,966.14	\$0.00	-\$1,790.39
<b>TOTAL DE HOJA 2</b>											
<b>SUB-TOTAL</b>											
<b>IVA (16%)</b>											
<b>TOTAL</b>											

JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA PUBLICA  
 ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

REPRESENTANTE LEGAL  
 ING. RAUL ROMERO ABEI I AYO



**H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**NÚMEROS GENERADORES**

OBRA: CONSTRUCCION DE DOMO EN ESC. PRIM. RAMON CORONA  
 DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE  
 ESTIMACION No: 3 (FINIQUITO)

FECHA: 15 DE DICIEMBRE DE 2018 PERIODO: DEL 08 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2018


Concepto	EJE	TRAMO	PZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	PESO	UNID.	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
302-CJM-01 - CUBIERTA DE NAVE, SISTEMA DE LONA BLACKOUT DE 21 ONZAS O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, ANCLAJES, ELEVACION, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	5-5"	A-B		26.50	0.132442			M2	3.50971	
<p align="right"><b>TOTAL 1 3.50971</b></p>										

ING. RAUL ROMERO ARELLANO  
 REPRESENTANTE LEGAL



ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS  
 JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA



DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS



**HAYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO**  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**  
**CROQUIS**

OBRA: CONSTRUCCION DE DOMO EN ESC. PRIM. RAMON CORONA DEPENDENCIA: HAYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE ESTIMACION No. 3 (FINQUITO)  
 PLANO: CORONA PERIODO: DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2018  
 FECHA: 15 DE DICIEMBRE DE 2018

CUBIERTA DE NAVE; SISTEMA DE LONA BLACKOUT DE 21 ONZAS O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, ANCLAJES, ELEVACION, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

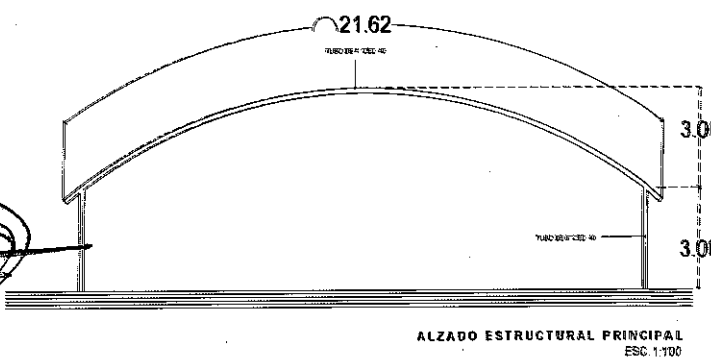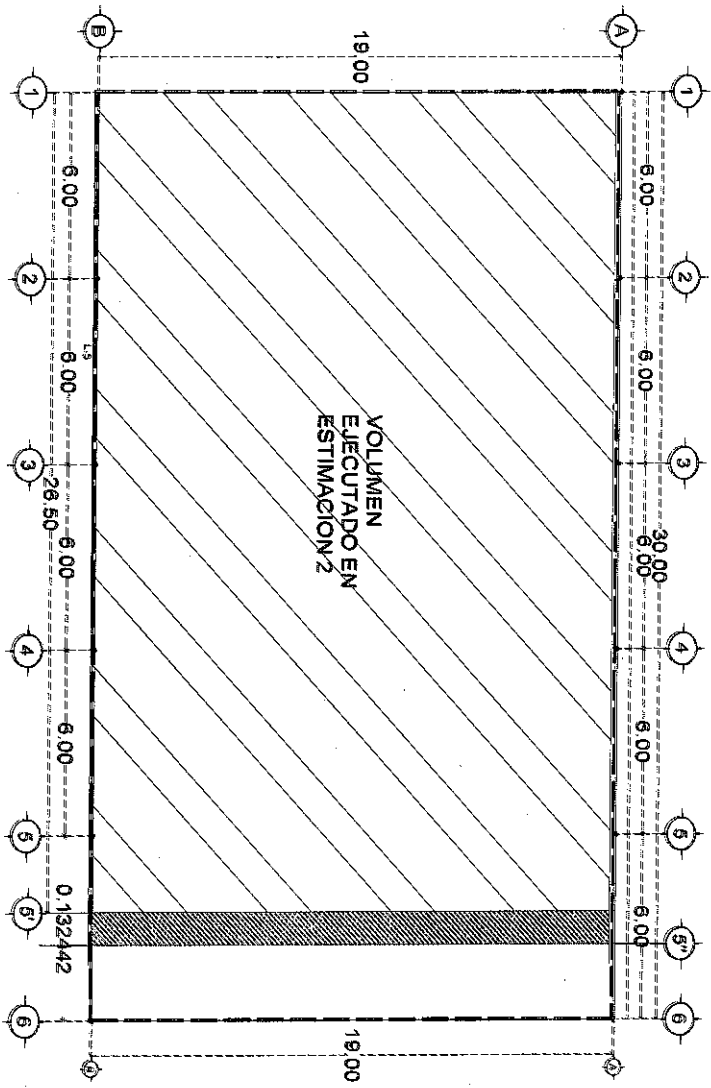

ING. RAUL ROMERO ARELLANO  
 REPRESENTANTE LEGAL

JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA  
 PUEBLA  
 ING. JOSE DAVID DAMIAN ROS

