

RFC emisor: FOAJ600113NZA
 Nombre emisor: JUAN FLORES AGUIAR
 Folio: 224
 RFC receptor: MZG8501012NA
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 1EE4BD9D-BD60-462A-A5D7-810C2040E545
 No. de serie del CSD: 00001000000402407840
 Código postal, fecha y hora de emisión: 49089 2018-06-27 15:39:12
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
80111618		1	LO	LOTE	159078.71	159078.72				
Descripción	Recibimos del Municipio de Zapotlán el Grande la Cantidad de \$ 184,531.31 (Ciento ochenta y cuatro mil quinientos treinta y un pesos 31/100 M.N.) Por concepto de Estimación No.1 de la obra Construcción de Cancha de usos múltiples en la Escuela de la colonia La Primavera en Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, con Numero de contrato DOP/FOCOCI/2018-01/001, correspondiente al programa Estatal del "Fondo Común concursable para la Infraestructura" FOCOCI, para el ejercicio Fiscal 2018. Fianza de Anticipo No. 3517-22 951-5, Fianza de Cumplimiento No. 3517-2 2856-0. Compañía Afianzadora: Afianzadora Aserta S.A. de C.V. se aplico las deducciones del 2% al millar \$ 1,465.52 y el 5% al millar \$ 3,663.79. Monto para efecto de pago \$179,402.00				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	159078.72	Tasa	16.0000%	25452.60

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
 Método de pago: Pago en una sola exhibición
 Condiciones de pago: CONTADO

Subtotal \$ 159,078.72
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 25,452.60
 Total \$ 184,531.32

Sello digital del CFDI:
 DLLDxPLlWb2GyMCPwQpfn+At4yb5Zlh0Oa1+qeiOL3xyRg+ss6EQbs4c3dHtSwTpfVioIvhhTf2xpV6f8gu8F/6tB96NtgVOqei21f0gg8/lqm+BU9x9Ybprc8PTzRf51e4gdAyRHmgUXy8LHpPBe1kbJSVWUgoCOXlwFHMdgvjM5uyZyZJ8uKND64BQXCnUESKR5zJLM+d8+idHeCF4rVnaepxBdgtEM5ijrM3FO+sxX9kPY8bPd+zX9IAHcVwAn+P9Wf0wNRqYFw1QrbY2ssmSpyDNxXQm/wJMLy5lJtZ2c8BreMBtonUnKkP2QYbaUyox7lJzK9q8Jzh7HuQ==

Sello digital del SAT:
 N3FMd8zPa1pZt4avFods1VPOa/Zg6qZz3PBQVaPkwUs6rsLGCbQ1eCdCr00/Jy8ropV5ptjwXsUCT+bDPa+1VAHlm8BwQ3ff4Eva16ulQ0z/QKZ4yr6BYdNG5SHJfnMFJkZcbn/X0oKX7jvEhD Fxd5HakwdeedGSrac1/51HS3RScnDoeqzK161uBxzQbaSPD2tLAEdg7bRYZbLAJ/FKJDavS+5Zgdx1YYkMBi+YAXjMYUo+eam0U7N0nv/t/2cRXdL37feRSvmY+xt9i3LahKnAoTfqt8W/JvXZf68tnSZpFCInmNP/lzHzHx9jQba3+j9UAeG69H8TioRjbg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|1EE4BD9D-BD60-462A-A5D7-810C2040E545|2018-06-27T15:46:24|SAT970701NN3|DLLDxPLlWb2GyMCPwQpfn+At4yb5Zlh0Oa1+qeiOL3xyRg+ss6EQbs4c3dHtSwTpfVioIvhhTf2xpV6f8gu8F/6tB96NtgVOqei21f0gg8/lqm+BU9x9Ybprc8PTzRf51e4gdAyRHmgUXy8LHpPBe1kbJSVWUgoCOXlwFHMdgvjM5uyZyZJ8uKND64BQXCnUESKR5zJLM+d8+idHeCF4rVnaepxBdgtEM5ijrM3FO+sxX9kPY8bPd+zX9IAHcVwAn+P9Wf0wNRqYFw1QrbY2ssmSpyDNxXQm/wJMLy5lJtZ2c8BreMBtonUnKkP2QYbaUyox7lJzK9q8Jzh7HuQ=||00001000000403258748||
 RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-06-27 15:46:24
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



DIRECTOR OBRAS PÚBLICAS

[Handwritten signature]

ING. MANUEL MICHEL CHAVEZ

JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA

[Handwritten signature]

ARQ. JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR



DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PROGRAMAS COPLADEMUN Y VINCULACIÓN CON DELEGACIONES ZAPOTLAN EL GRANDE

EMPRESA CONTRATISTA
 ING. JUAN FLORES AGUIAR

[Handwritten signature]
 Este documento es la representación impresa de un CFDI
 ING. JUAN FLORES AGUIAR



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

DIRECCION GRENERAL DE OBRAS PUBLICAS

ESTATAL("FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA")

FECHA: 27-jun-18

Contrato: DOP/FOCOCI/2018-01/001

Orden de Trabajo:

Clave Presupuestal:

No. de Obra:

Contratista: ING. JUAN FLORES AGUIAR

Obra: CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA DE LA COLONIA PRIMAVERA UBICADO: AMAPOLA, ENTRE LAS CALLES LIRIOS Y TULIPANES, EN LA COLONIA LA PRIMAVERA EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Localidad: CIUDAD GUZMAN

Municipio: ZAPOTLAN EL GRANDE

Fecha de Inicio: 22-may-18

Fecha de Término: 29-jun-18

ESTIMACION 1

Periodo: 22 /05/ 2018

AI: 29/06/18

Resumen de Documento		
+ Importe de la Estimación	212 104.96	212 104.96
+ Aditiva		-
- Deductiva	\$0.00	-
+ IVA: 16%	33 936.79	246 041.75
- Amortización	61 510.44	184 531.31
Total	184 531.31	184 531.31

Avance	
Fecha Inicial:	22-may-18
Financiero:	28.00%
Fisico %	60.00%
Fecha:	27-jun-18

Techo Financiero	Importe	Acumulado	Importe
Presupuesto Base	850 000.00	Esta Estimacion	246 041.75
Convenio Adicional	-	Acumulado Anterior	
Suma Escalatorias	-	Acumulado Actual	246 041.75
Total	850 000.00	Saldo	603 958.25

Anticipo		
Anticipo	25%	212 500.00
Amort. Del acumulado		-
Esta amortización		61 510.44
Total Amortizado		61 510.44
Saldo por Amortizar		150 989.56

1

Detalle	Estatad	Federal	Municipio
Importe	159 078.72	-	-
Escalatoria	-	-	-
IVA	25 452.59	-	-
Total a Facturar	184 531.31	-	-
2 al millar	1 465.52	-	-
5 al millar	3 663.79	-	-
Sanción	-	-	-
Total a Pagar	179 402.00	-	-

Sumas	
	159 078.71
	-
	25 452.59
	184 531.31
	1 465.52
	3 663.79
	-
	179 402.00

DIRECTOR OBRAS PUBLICAS

JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA

ING. MANUEL MICHEL CHAVEZ

ARQ. JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR



EMPRESA CONTRATISTA
ING. JUAN FLORES AGUIAR

ING. JUAN FLORES AGUIAR



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PROGRAMAS COPLADEMUN Y VINCULACIÓN CON DEL EGACIONES ZAPOTLAN EL GRANDE



H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
 DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
 DIRECCION DE CONTRATACION Y CONTROL DE COSTOS

HOJA: 111
 ESTIMACION: 1 (UNO)
 Periodo: 24/05/2018 Al: 27/06/2018
 No. De Contrato: DOP/FOCOCI/2018-01/001
 CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA LA PRIMAVERA EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

LOCALIDAD: CIUDAD GUZMAN
 MUNICIPIO: ZAPOTLAN EL GRANDE

CONTRATISTA: ING. JUAN FLORES AGUIAR

ESTIMACION DE TRABAJOS

CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDADES			PRECIO UNITARIO	IMPORTE						
		PRESUP. BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADO		SALDO	PRESUP. BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADO	SALDO		
PRELIMINARES												
1 Trazo y nivelacion con equipo topografico en terreno plano. Incluye materiales, cuadrilla de topografia, equipo y herramientas.	M2	640.000	640.00	640.00	0.00	8.61	5 510.40	5 510.40	5 510.40	5 510.40	5 510.40	\$
2 Despalme de 15 a 20cms de espesor despedregando el material acarreo libre a 50mts con medios mecanicos en material clas B	M2	640.000	640.00	640.00	0.00	18.92	12 108.80	12 108.80	12 108.80	12 108.80	12 108.80	\$
3 Retiro de material producto del corte con espesor de 20cms en camion volteo o de plataforma fuera de la obra (30% de abundamiento)	M2	640.000	640.00	640.00	0.00	38.36	24 550.40	24 550.40	24 550.40	24 550.40	24 550.40	\$
MOVIMIENTOS DE TIERRAS												
4 Escarificado de terreno natural por medios mecanicos Incluye: Equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	M2	640.000	640.00	640.00	0.00	12.36	7 910.40	7 910.40	7 910.40	7 910.40	7 910.40	\$
5 Relleno en masetas compactado con compactador vibratorio (plaza) en capas de 20 cms utilizando tepalcate. Incluye volteo a mano con pala.	M3	384.000	384.00	384.00	0.00	421.94	162 024.96	162 024.96	162 024.96	162 024.96	162 024.96	\$
RODAPIE												
6 Excavacion a mano en capas terreno tipo B de 0.00 a 1.50mts de profundidad Incluye afine de taludes y fondo.	M3	18.720	0.00	0.00	18.72	191.04	3 576.27	3 576.27	3 576.27	3 576.27	3 576.27	\$
7 Planilla de concreto Fc=100kg/cm² de 6 cms de espesor Incluye materiales, mano de obra y herramienta.	M2	31.24	0.00	0.00	31.24	154.26	4 818.50	4 818.50	4 818.50	4 818.50	4 818.50	\$
8 Muro de mamposteria con piedra brasa limpije sin labrar asentada y juntas con mortero 1:3 cemento arena de 0.00 a 1.50mts de altura.	M3	18.72	0.00	0.00	18.72	1 821.95	34 106.90	34 106.90	34 106.90	34 106.90	34 106.90	\$
LOSA DE CONCRETO												
9 Losa de concreto reforzada con mallacac 6 X 6 de 10 cms de espesor con concreto Fc=200 kg/cm² Incluye cimbra.	M2	640.00	0.00	0.00	640.00	404.70	259 008.00	259 008.00	259 008.00	259 008.00	259 008.00	\$
10 Corte de juntas promedio de contradora con disco de diamante a una profundidad de 1/2 del espesor del pavimento (7cms) modulación de la losa (4X3.00 aprox.) Incluye cortadora, operacion disco de corte, limpieza, juntas de contracción y construcción mediante aire a presión.	M	329.60				20.85	6 872.16	6 872.16				
11 Cinta marca para rod de 1/4" para sellar junta de dilatacion, polietileno sellador suministro de materiales colocacion herramienta y mano de obra.	M	329.60				17.47	5 758.11	5 758.11				
PORTERIAS												
12 Porteria de voleybol elaborada con tubo de 3" ced. 40 con medidas especificadas en el proyecto y red con medidas reglamentarias para porteria de voleybol Incluye materiales herramienta y mano de obra.	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	5 588.90	5 588.90	5 588.90	5 588.90	5 588.90	5 588.90	\$
13 Marco de albero y porteria para cancha de usos multiples elaborada con tubo de 3" ced. 40 y tablero con placa de acero de 3/8" (segun especificacion del proyecto) Incluye tornillos fueras primario y pintura de esmalte color blanco, materiales herramienta y mano de obra.	PZA	2.00	0.00	0.00	2.00	35 499.21	70 998.42	70 998.42	70 998.42	70 998.42	70 998.42	\$
PINTURA												
14 Suministro e instalacion de pintura vinil acrilica de alta pigmentacion mezclada con arena silica para lograr superficie antideslante y granules fino de caucho reciclado similar al sistema laycold resistente a los rayos UV. Segun color indicado Incluye lavado de superficie mediante medios mecanicos una capa de emulsion acilica bluminosa autonivelante y dos capas de pintura terminado final. Pintado de lineas filetes manobras, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	M2	640.00	0.00	0.00	640.00	194.41	124 422.40	124 422.40	124 422.40	124 422.40	124 422.40	\$
LIMPIEZA FINAL												
15 Limpieza final (General) de obra	M2	640	0	0	640	8.60	5 504.00	5 504.00	5 504.00	5 504.00	5 504.00	\$
							732 758.62	212 104.96	212 104.96	212 104.96	212 104.96	\$
												5 504.00
												508 023.39




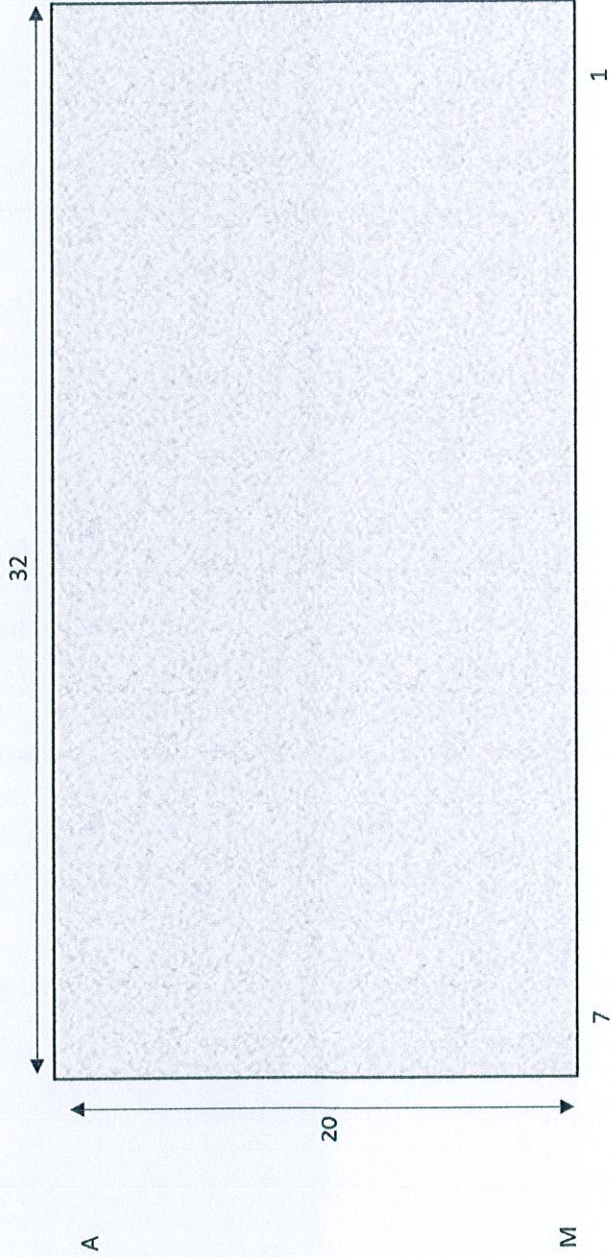
[Signature]
 Arq. Jesús Eugenio Campos Escobar

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Jefe de supervisión y control de Obra Pública

[Signature]
 Contr. Juan Flores Aguiar


 <p>H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS</p> <p>DIRECCION DE CONTRATACION Y CONTROL DE COSTOS</p>	<p>HOJA: 1/1</p> <p>ESTIMACION: 1 (UNO)</p> <p>Periodo: 24/05/2018 Al: 27/06/2018</p> <p>No. De Contrato DOI/FOCOCI/2018-01/001</p> <p>CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA DE LA COLONIA LA PRIMAVERA EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO</p> <p>ORDEN DE TRABAJO: LOCALIDAD CIUDAD GUZMAN MUNICIPIO ZAPOTLAN EL GRANDE</p>	<p>CONTRATISTA: ING. JUAN FLORES AGUIAR</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>EJE</th> <th>TRAMO</th> <th>LARGO</th> <th>ANCHO</th> <th>ALTO</th> <th>UNIDAD</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A-M</td> <td>1 al 7</td> <td>32</td> <td>20</td> <td></td> <td>m²</td> <td>640</td> </tr> </tbody> </table>	EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	UNIDAD	TOTAL	A-M	1 al 7	32	20		m ²	640
EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	UNIDAD	TOTAL										
A-M	1 al 7	32	20		m ²	640										
<p>GENERADOR DE TRABAJOS</p> <p>Trazo y nivelación con equipo topografico en terreno plano. Incluye materiales, cuadrilla de topografía, equipo y herramientas.</p>																




Contratista
Ing. Juan Flores Aguiar

Arq. Jesús Eugenio Campos Escobar
Jefe de supervisión y control de Obra Pública


DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


<p>H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS</p> <p>DIRECCION DE CONTRATACION Y CONTROL DE COSTOS</p>	<p>HOJA: 1/1</p> <p>ESTIMACION: 1 (UNO)</p> <p>Periodo: 24/05/2018 Al: 27/06/2018</p> <p>No. De Contrato DOPI/FOCOCI/2018-01/001</p> <p>CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA DE LA COLONIA LA PRIMAVERA EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO</p> <p>ORDEN DE TRABAJO: LOCALIDAD CIUDAD GUZMAN MUNICIPIO ZAPOTLAN EL GRANDE</p>						
<p>CONTRATISTA: ING. JUAN FLORES AGUIAR</p>							
<p>GENERADOR DE TRABAJOS</p> <p>Despalme de 15 a 20cms de espesor desperdiciando el material acarreo libre a 50mts con medios mecánicos en material clase B.</p>	<p>EJE</p>	<p>TRAMO</p>	<p>LARGO</p>	<p>ANCHO</p>	<p>ALTO</p>	<p>UNIDAD</p>	<p>TOTAL</p>
<p>A-M</p>	<p>1 al 7</p>	<p>32</p>	<p>20</p>	<p>m²</p>	<p>640</p>		

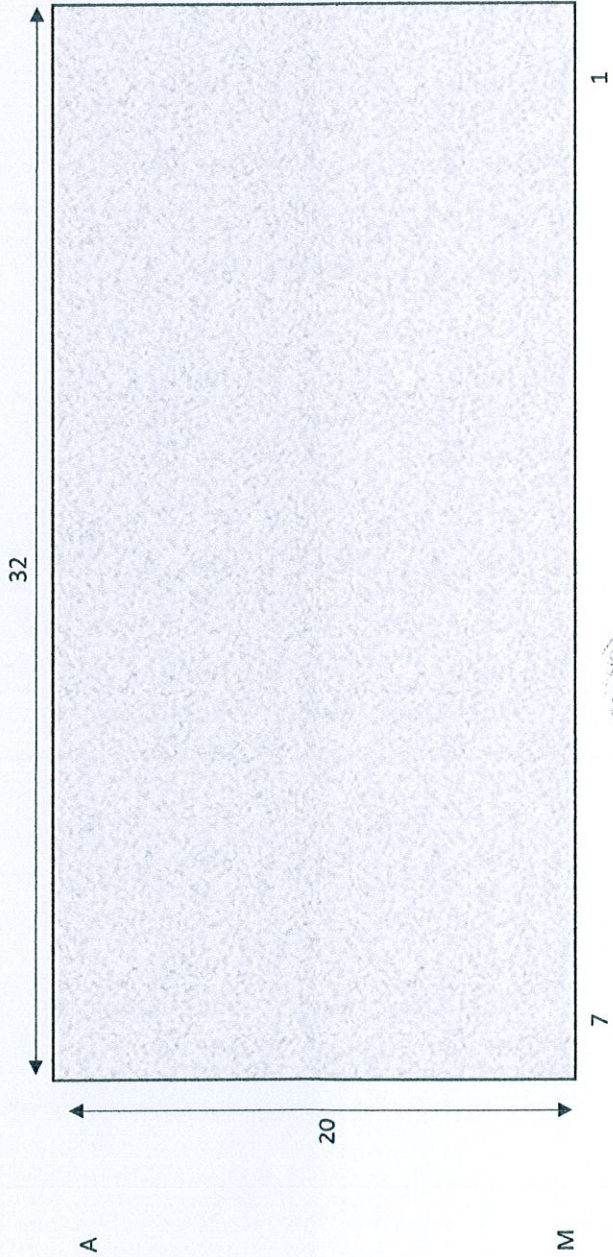

Contratista: *Juan Flores Aguiar*
 Ing. Juan Flores Aguiar

Arq. Jesús Eugenio Campos Escobar
 Jefe de supervisión y control de Obra Pública


<p>H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS</p> <p>DIRECCION DE CONTRATACION Y CONTROL DE COSTOS</p>	<p>HOJA: 1/1</p> <p>ESTIMACION: 1 (UNO)</p> <p>Periodo: 24/05/2018 Al: 27/06/2018</p> <p>No. De Contrato DOP/FOCOCI/2018-01/001</p> <p>CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA DE LA COLONIA LA PRIMAVERA EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO</p> <p>ORDEN DE TRABAJO: LOCALIDAD CIUDAD GUZMAN MUNICIPIO ZAPOTLAN EL GRANDE</p>															
<p>GENERADOR DE TRABAJOS</p> <p>Retiro de material producto del corte con espesor de 20cms en camion volteo o de plataforma fuera de la obra (30% de abundamiento)</p> <table border="1" data-bbox="560 128 636 2076"> <thead> <tr> <th>EJE</th> <th>TRAMO</th> <th>LARGO</th> <th>ANCHO</th> <th>ALTO</th> <th>UNIDAD</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A-M</td> <td>1 al 7</td> <td>32</td> <td>20</td> <td></td> <td>m²</td> <td>640</td> </tr> </tbody> </table> <p>CONTRATISTA: ING. JUAN FLORES AGUIAR</p>			EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	UNIDAD	TOTAL	A-M	1 al 7	32	20		m ²	640
EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	UNIDAD	TOTAL										
A-M	1 al 7	32	20		m ²	640										

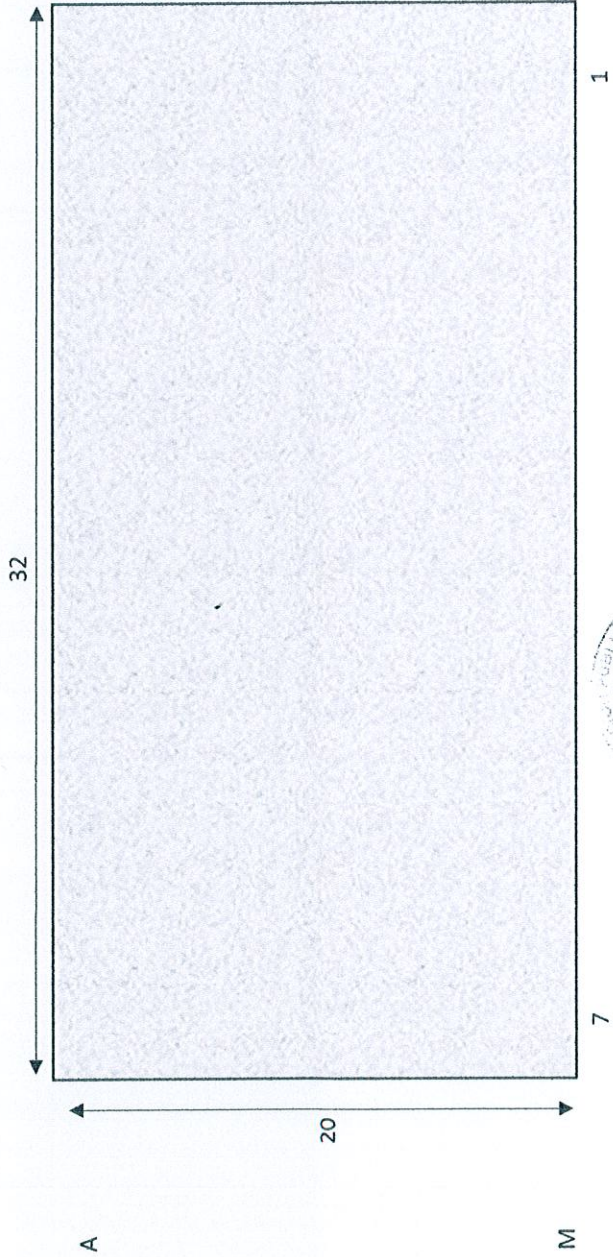



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Arq. Jesús Eugenio Campos Escobar
 Jefe de supervisión y control de Obra Pública

Contratista: *[Firma]*
 Ing. Juan Flores Aguiar

 <p>H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS</p> <p>DIRECCION DE CONTRATACION Y CONTROL DE COSTOS</p>	<p>HOJA: 1/1</p> <p>ESTIMACION: 1 (UNO)</p> <p>Periodo: 24/05/2018 Al: 27/06/2018</p> <p>No. De Contrato DOPIFOCOCII/2018-01/001</p> <p>CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA DE LA COLONIA LA PRIMAVERA EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO</p> <p>ORDEN DE TRABAJO: LOCALIDAD CIUDAD GUZMAN MUNICIPIO ZAPOTLAN EL GRANDE</p>	<p>CONTRATISTA: ING. JUAN FLORES AGUIAR</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>EJE</th> <th>TRAMO</th> <th>LARGO</th> <th>ANCHO</th> <th>ALTO</th> <th>UNIDAD</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A-M</td> <td>1 al 7</td> <td>32</td> <td>20</td> <td></td> <td>m²</td> <td>640</td> </tr> </tbody> </table>	EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	UNIDAD	TOTAL	A-M	1 al 7	32	20		m ²	640
EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	UNIDAD	TOTAL										
A-M	1 al 7	32	20		m ²	640										
<p>GENERADOR DE TRABAJOS</p> <p>Escarificado de terreno natural por medios mecánicos Incluye: Equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.</p>																

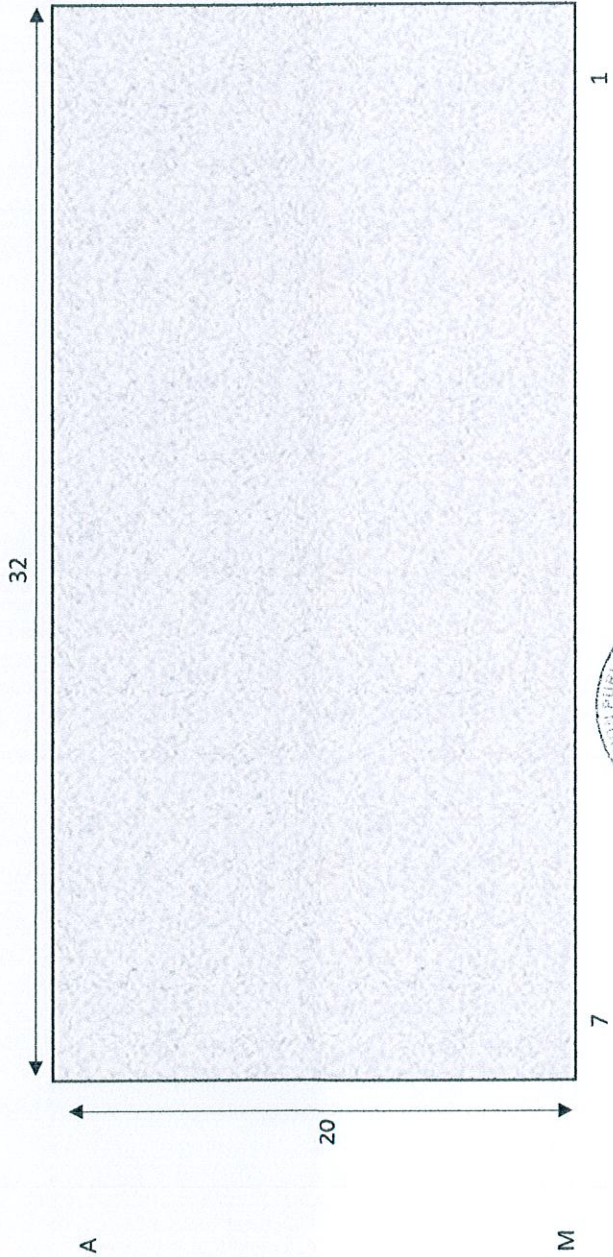


Contratista: 


Ing. Juan Flores Aguiar

Arq. Jesús Eugenio Campos Escobar

Jefe de supervisión y control de Obra Pública

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

<p>H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS</p> <p>DIRECCION DE CONTRATACION Y CONTROL DE COSTOS</p>	<p>HOJA: 1/1</p> <p>ESTIMACION: 1 (UNO)</p> <p>Periodo: 24/05/2018 Al: 27/06/2018</p> <p>No. De Contrato DOPI/FOCOCI/2018-01/001</p> <p>CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA DE LA COLONIA LA PRIMAVERA EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO</p> <p>ORDEN DE TRABAJO: LOCALIDAD CIUDAD GUZMAN MUNICIPIO ZAPOTLAN EL GRANDE</p>															
<p>CONTRATISTA: ING. JUAN FLORES AGUIAR</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>EJE</th> <th>TRAMO</th> <th>LARGO</th> <th>ANCHO</th> <th>ALTO</th> <th>UNIDAD</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A-M</td> <td>1 al 7</td> <td>32</td> <td>20</td> <td></td> <td>0.6 m³</td> <td>384</td> </tr> </tbody> </table> <p>GENERADOR DE TRABAJOS</p> <p>Relleno en mesetas compactado con compactador vibratorio (placa) en capas de 20 cms utilizando tepetate. Incluye volteo a mano con pala.</p>			EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	UNIDAD	TOTAL	A-M	1 al 7	32	20		0.6 m ³	384
EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	UNIDAD	TOTAL										
A-M	1 al 7	32	20		0.6 m ³	384										

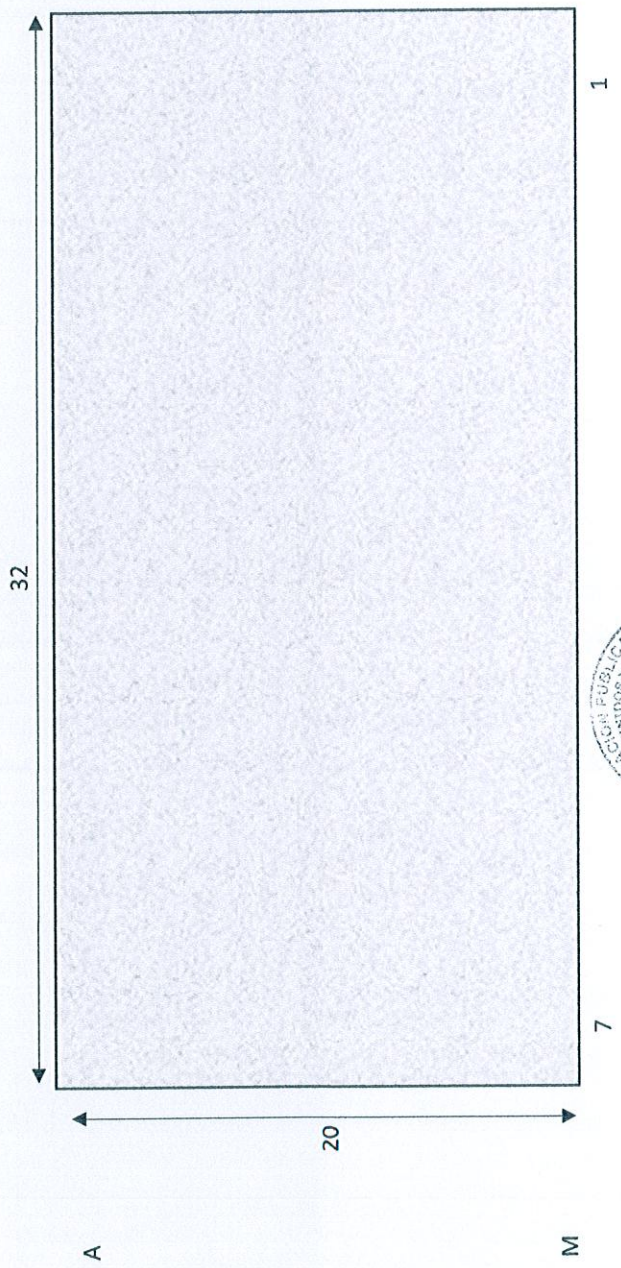

Juan Flores Aguiar
Contratista

Arq. Jesús Eugenio Campos Escobar
Jefe de supervisión y control de Obra Pública

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE
ZAPOTLAN EL GRANDE,
DIRECCION GENERAL DE
OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE CONTRATACION
Y CONTROL DE COSTOS

HOJA:

ESTIMACION: 1 (UNO)

Periodo:

24/05/2018 Al:

27/06/2018

No. De Contrato DOP/FOCOCI/2018-01/001

CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA DE LA COLONIA LA PRIMAVERA EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

ORDEN DE TRABAJO:

LOCALIDAD CIUDAD GUZMAN

MUNICIPIO

ZAPOTLAN EL GRANDE

FOTOGRAFIAS

CONTRATISTA: ING. JUAN FLORES AGUIAR



Arq. Jesús Eugenio Campos Escobar

Jefe de supervisión y control de Obra Pública

Contratista
Ing. Juan Flores Aguiar



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE
ZAPOTLAN EL GRANDE,
DIRECCION GENERAL DE
OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE CONTRATACION
Y CONTROL DE COSTOS

HOJA:

ESTIMACION: 1 (UNO)

Periodo:

24/05/2018 Al:

27/06/2018

No. De Contrato DOI/FOCOCI/2018-01/001

CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA DE LA COLONIA LA PRIMAVERA EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

ORDEN DE TRABAJO:

LOCALIDAD

CIUDAD GUZMAN

MUNICIPIO

ZAPOTLAN EL GRANDE

FOTOGRAFIAS

CONTRATISTA: ING. JUAN FLORES AGUIAR



Arq. Jesús Eugenio Campos Escobar

Contratista
Ing. Juan Flores Aguiar

Jefe de supervisión y control de Obra Pública



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE
ZAPOTLAN EL GRANDE,
DIRECCION GENERAL DE
OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE CONTRATACION
Y CONTROL DE COSTOS

HOJA:

ESTIMACION: 1 (UNO)

Periodo:

27/06/2018

24/05/2018 Al:

No. De Contrato DOI/FOCOCI/2018-01/001

CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA DE LA COLONIA LA PRIMAVERA EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

ORDEN DE TRABAJO:

LOCALIDAD CIUDAD GUZMAN


MUNICIPIO

ZAPOTLAN EL GRANDE

FOTOGRAFIAS

CONTRATISTA:

ING. JUAN FLORES AGUIAR

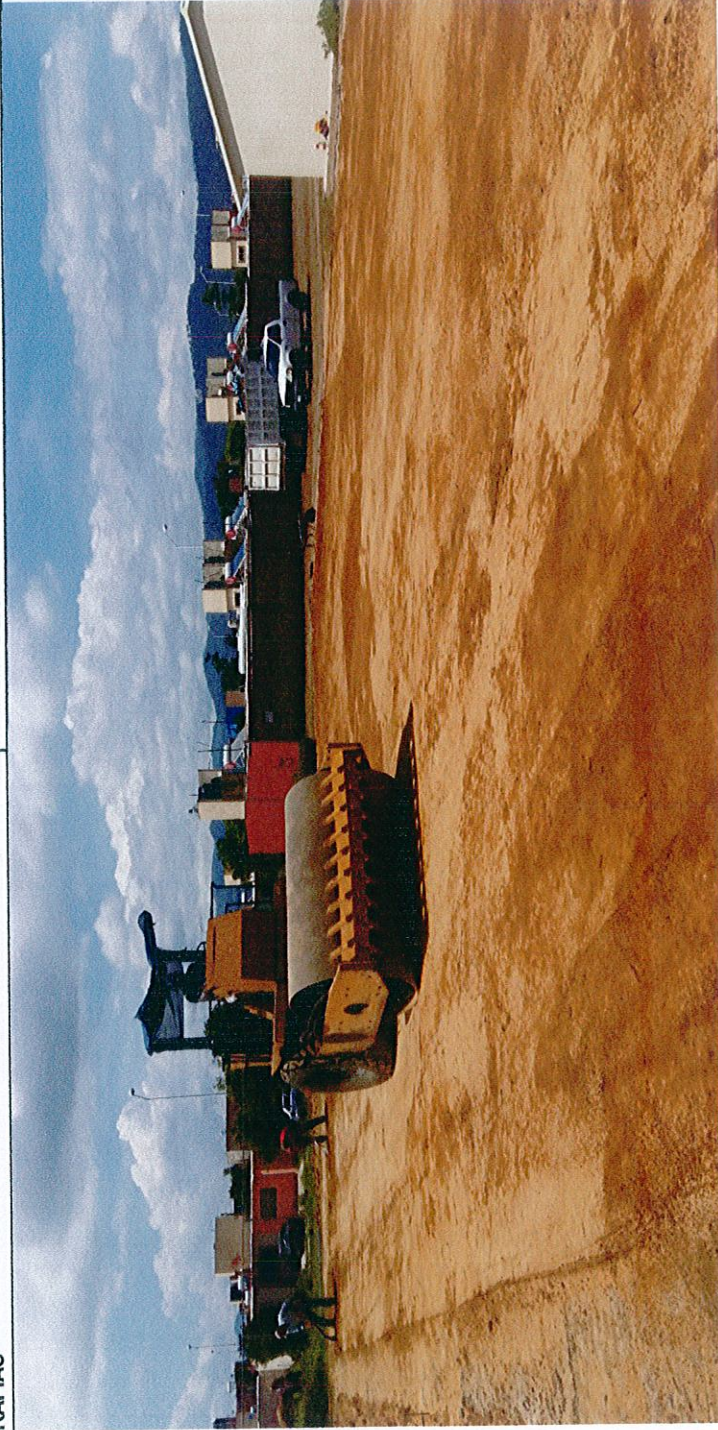

Arq. Jesús Eugenio Campos Escobar
Jesús Campos Escobar
Jefe de supervisión y control de Obra Pública

Contratista
Juan Flores Aguiar
Ing. Juan Flores Aguiar



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
