



**CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DEL SUR DE  
TECA SA DE CV**

RFC: CES061127734 ABASOLO No. 61 CENTRO, TECALITLAN 49900 TECALITLAN  
JALISCO MEXICO

|  |
|--|
| <b>I - Ingreso Versión 3.3 Factura Serie y Folio: A 44</b>   |
| FECHA: 26/12/2018 13:43:40   |
| Folio Fiscal: FDFCB705-8608-4167-9297-A5B17F495624<br>Fecha y hora de certificación: Diciembre 26 2018 - 13:43:42<br>Serie del Certificado del emisor: 00001000000403996498<br>No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074 |
| CONDICIONES:   |
| USO CFDI: G03 - Gastos en general  |

EXPEDIDO EN: CP: 49900

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| <b>CLIENTE:</b> 2 MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO   | <b>R.F.C.:</b> MZG8501012NA |
| <b>DOMICILIO:</b> AV. COLON No. 62, COLONIA: CENTRO. POBLACIÓN: GUZMAN, JALISCO, C.P.: 49900  |                             |
| <b>FORMA DE PAGO:</b> 99 - Por definir, <b>MÉTODO DE PAGO:</b> PPD - Pago en parcialidades o diferido, <b>MONEDA:</b> MXN - Peso Mexicano |                             |
| Observaciones:  | Referencia:                 |

| Cantidad | Clave Unidad SAT         | Clave Producto/Servicio | Concepto / Descripción  | Valor Unitario | Impuestos                 | Importe    |
|----------|--------------------------|-------------------------|---|----------------|---------------------------|------------|
| 1.00000  | E48 - Unidad de servicio | 2 SAT: 30191800         | RECIBIMOS DE H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO LA CANTIDAD DE \$ 918,040.65 (NOVECIENTOS DIEZ Y OCHO MIL CUARENTA PESOS .65/100 M.N.) POR CONCEPTO DE ESTIMACION No 3 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO CON NUMERO DE CONTRATO DOP/PDR23/2018-01/016 CON FIANZA DE ANTICIPO # 3202-12214-0 Y FIANZA DE CUMPLIMIENTO 3502-12215-7 COMPANIA ASERTA AFIANZADORA S.A. DE C.V. | 791,414.35000  | 002 - IVA - 126,626.30 -- | 791,414.35 |

|   |
|---|
| <b>IMPORTE CON LETRA</b>                                |
| NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL CUARENTA PESOS 65/100 M.N.    |
| Este documento es una representación impresa de un CFDI |
| 601 - General de Ley Personas Morales                   |
| <b>CFDI Relacionado:</b>                                |
| <b>Tipo Relación:</b> -                                 |
| <b>CFDI Relacionado:</b>                                |

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| SUBTOTAL:            | 791,414.35        |
| Impuestos Traslados: |                   |
| I.V.A. 16%:          | 126,626.30        |
| <b>TOTAL:</b>        | <b>918,040.65</b> |

Sello digital del CFDI  
czHXUj31gNLERITJa+JxLo5pxfSKyE8puabH7bZpZohoxWVwvZDXWTKzC8vbEqUa/v7Yim+PGTqoLjrqJ  
q88Yv43QCv6uR817zUJNEgW4yrvCRq3u5NB5Lr+DILQLJ0DRWqWcXcAzr9cVvNEPVeXK86acN3C7a3k1Jf  
+9yJpBFF8wTAJbPcmZGkiZboxOdJgKYBgLImKp0STHRD1VyVfUuipqBOFGS9AWg50Zq62vJZNdSE5HFSHY1R  
Ze+B+gAqtzsmgPGk5ZLOOb8AJ7Ym8F7yjc/BwLlornA/X53cSa/TILR9oiwOTJIRg5ARXWVQpIgreba8g==

Sello del SAT  
NpyAo9VxXr9bJ2W+gBHuxflKmcSLNnzF+alpaiVwL2CC73kMxDQszPI3bGK7DnVXjbigSm73BP  
FuBspvddU534M6R+XIDZgFKer261v6xu38zVEByAPlwokVNEpXpRmzwSvenMHKJvVdyJlp3Ylo9IP  
I1XNtFQkx/BuITrZLnTxeUjjeMAbeOwNTCjF9mAJDhgn5YBzRw7lIRX39whz5FV7yBY+5jz  
EbbaSyICJXZ4wccEciFXUV5UJUEv+lr7N5C2jV6fRiGczKko9gOUC0leTirER3D+rze2VObHHRNSW1ta  
jNkKwZU9esdc7UOWaAJrWg==



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
||1.1|FDFCB705-8608-4167-9297-A5B17F495624|2018-12-26T13:43:42|MAS0810247C0ezrHK  
q31gNLERITJa+JxLo5pxfSKyE8puabH7bZpZohoxWVwvZDXWTKzC8vbEqUa/v7Yim+PGTqoLjrq  
sJg8Yv43QCv6uR817zUJNEgW4yrvCRq3u5NB5Lr+DILQLJ0DRWqWcXcAzr9cVvNEPVeXK86acN3C  
7a3k1Jf+9yJpBFF8wTAJbPcmZGkiZboxOdJgKYBgLImKp0STHRD1VyVfUuipqBOFGS9AWg50Zq62v  
JZNdSE5HFSHY1RZe+B+gAqtzsmgPGk5ZLOOb8AJ7Ym8F7yjc/BwLlornA/X53cSa/TILR9oiwOTJ  
Rg5ARXWVQpIgreba8g==|00001000000404486074||

|   |
|---|
| <b>Banco:</b>   |
| Debe(mos) y pagare(mos) incondicionalmente por este Pagaré a la orden de CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DEL SUR DE TECA SA DE CV en TECALITLAN, JALISCO el día _____ la cantidad de: \$918,040.65 (NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL CUARENTA PESOS 65/100 M.N.), valor recibido en mercancía a mi (nuestra) entera satisfacción. Este pagaré es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su Artículo 173 parte final y artículos correlativos por no ser pagaré domiciliado. De no ser pagado a su vencimiento causara intereses moratorios del 5% mensual, todo cheque devuelto causara un 20% sobre el valor del mismo según artículo 7 y 39 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. |
| MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO<br>Firma de Aceptación  |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
DIRECCION DE GESTION DE PROGRAMAS COPLADEMUNY VINCULACION CON DELEGACIONES

27 DIC 2018  
**RECIBIDO**

GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
RECURSO: "PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL"

CONTROL DE OBRA PUBLICA  
Contrato: **DOP/PDR23/2018-01/016**  
Evento: LOSA DE CONCRETO

FECHA: 1612/2018

Contratista: **CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DEL SUR DE TECA S.A. DE C.V.**

Obra: **"Construcción de losa de concreto hidráulico en Av. Pedro Ramírez Vázquez (Segunda etapa), en el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco."**

Localidad: **CD. GUZMAN**  
Fecha de Inicio:  
Estimación No.:

**07/01/2018**  
**3 TRES**

Municipio:  
Fecha de Término:

**ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.**  
**15/12/18**

| Resumen de Documento       |                     |                     |
|----------------------------|---------------------|---------------------|
| + Importe de la Estimación | \$ 1,055,219.13     | \$1,055,219.13      |
| + Aditiva                  | \$0.00              | \$0.00              |
| - Deductiva                | \$0.00              | \$0.00              |
| + IVA: 16%                 | \$168,835.06        | \$1,224,054.19      |
| - Amortización             | \$306,013.55        | \$918,040.64        |
| <b>Total</b>               | <b>\$918,040.64</b> | <b>\$918,040.64</b> |




| Avance        |            |
|---------------|------------|
| Fecha Inicial | 07/01/2018 |
| Financiero:   | 98.43%     |
| Fisico %      | 97.90%     |
| Fecha:        | 1612/2018  |

| Techo Financiero   | Importe               | Acumulado          | Importe             |
|--------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| Presupuesto Base   | \$5,458,285.47        | Esta Estimación    | \$1,224,054.19      |
| Convenio Adicional |                       | Acumulado Anterior | \$4,119,761.27      |
| Suma Escalatorias  |                       | Acumulado Actual   | \$5,343,815.46      |
| <b>Total</b>       | <b>\$5,458,285.47</b> | <b>Saldo</b>       | <b>\$114,470.01</b> |

| Anticipo                   |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Anticipo                   | 25% \$ 1,364,571.37   |
| Amort. Del acumulado       | 1,029,940.32          |
| Esta amortización          | \$306,013.55          |
| <b>Total Amortizado</b>    | <b>\$1,335,953.87</b> |
| <b>Saldo por amortizar</b> | <b>\$ 28,617.50</b>   |

| Detalle                              | Federal             | Estatal       | Municipio     |
|--------------------------------------|---------------------|---------------|---------------|
| Importe                              | \$791,414.35        | \$0.00        | \$0.00        |
| Escalatoria                          | \$0.00              | \$0.00        | \$0.00        |
| IVA                                  | \$126,626.30        | \$0.00        | \$0.00        |
| <b>Total a Facturar</b>              | <b>\$918,040.65</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> |
| Deducción del 5 al millar            | \$0.00              | \$0.00        | \$0.00        |
| Deducción del 2 al millar            | \$0.00              | \$0.00        | \$0.00        |
| Deducción del 2% Supervisión Externa | \$0.00              | \$0.00        | \$0.00        |
| Sanción                              | \$0.00              | \$0.00        | \$0.00        |
| <b>Total a Pagar</b>                 | <b>\$918,040.65</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> |

| Sumas |              |
|-------|--------------|
|       | \$791,414.35 |
|       | \$0.00       |
|       | \$126,626.30 |
|       | \$918,040.65 |
|       | \$0.00       |
|       | \$0.00       |
|       | \$0.00       |
|       | \$0.00       |
|       | \$0.00       |
|       | \$918,040.65 |

|   |   |
|---|---|
| <p>OBRAS PUBLICAS</p>  <p>ARQ. JESUS EGENIO CAMPOS ESCOBAR<br/>DIRECTOR</p>        | <p>OBRAS PUBLICAS</p>  <p>ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS<br/>Jefe de Supervisión y Control de Obra Publica.</p> |
| <p>CONTRATISTA</p>  <p>JORGE RIGOBERTO CARDENAS MACIAS<br/>REPRESENTANTE LEGAL</p> |   |

DIRECCION DE GESTION DE  
PROGRAMAS COPLADEMUN Y  
VINCULACION CON DELEGACIONES


27 DIC 2018


RECIBIDO

**GOBIERNO DE ZAPOTLAN EL GRANDE**  
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
 ESTIMACION DE TRABAJOS ORDINARIOS

**CUERPO DE ESTIMACION**  
 OBRA: "Construcción de losa de concreto hidráulico en Av. Pedro Ramírez Vázquez (Segunda etapa), en el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco."  
 ESTIMACIÓN: TRES MUNICIPIO: ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.  
 No. DE OBRA: DOP/PDR23/2018-01  
 No. DE CONTRATO: DOP/PDR23/2018-01/016 HOJA: 1 DE 2

| CONCEPTOS  | U  | CANTIDADES   |              |             | PRECIO UNITARIO | IMPORTE         |                 |                 | SALDO       |
|--|----|--------------|--------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
|  |    | PRESUP. BASE | ESTIM. ACUM. | ESTA ESTIM. |                 | PRESUP. BASE    | ESTIM. ACUM.    | ESTA ESTIMACION |             |
| <b>PRELIMINARES</b>  |    |              |              |             |                 |                 |                 |                 |             |
| TRA-013.1 TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO SENCILLAMENTE PLANO UTILIZANDO EQUIPO TOPOGRAFICO. ESTABLECIENDO BANCOS DE NIVEL Y LEYES DE REFERENCIA INCLUYE: ESTACAS, PINTURA Y TODO LO QUE SEA NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION                                      | M2 | 4,946.69     | 4,946.69     | 0.00        | 7.41            | \$36,654.97290  | \$36,654.98031  | \$0.00000       | -\$0.01     |
| COR-486 CORTE (EXCAVACION) POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA EN REBAJES DE LA CAMA DE CORTES Y/O DE LA CORONA DE TERRAPLENES EXISTENTES, CUANDO EL MATERIAL SE DESPERDICE (MATERIAL CLASE "B")  | M3 | 2,324.95     | 2,324.95     | 0.00        | 26.00           | \$60,448.70     | \$60,448.70     | \$0.00000       | \$0.00      |
| RET-001 CARGA Y RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE DE LA OBRA EN CAMION VOLTEO O DE PLATAFORMA FUERA DE LA OBRA HASTA TRAZERO MUNICIPAL O A DONDE LO INDIQUEN LAS AUTORIDADES, A UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 5 KMS.  | M3 | 3,138.68     | 2,324.95     | 813.73      | 121.27          | \$390,627.7236  | \$281,946.68560 | \$0.00          | \$98,681.04 |
| EMP-004 EXCARIFICADO DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.  | M2 | 4,946.69     | 4,946.70     | 0.00        | 8.87            | \$43,877.14917  | \$43,877.14917  | \$0.00000       | \$0.00      |
| SUB-496.2X ELABORACION Y TENDIDO DE SUB-BASE HIDRAULICA, DE 20 CMS. DE ESPESOR COMPACTO  | M2 | 4,946.69     | 4,946.70     | 0.00        | 51.89           | \$256,683.79599 | \$256,683.79599 | \$0.00000       | \$0.00      |
| ELABORACION Y TENDIDO DE BASE HIDRAULICA, DE 20 CMS. DE ESPESOR COMPACTO. LOS MATERIALES PARA LA BASE PODRAN SER NATURALES (ARENAS, GRAVAS, LIMOS Y ROCAS FRAGMENTADAS Y MUY ALTERADAS); ESTOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS (N-CMT-4-02-002). | M2 | 4,946.69     | 4,946.70     | 0.00        | 106.51          | \$526,872.05841 | \$526,872.05841 | \$0.00000       | \$0.00      |
| RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL DE BANCO UTILIZANDO MAQUINARIA, EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS. EN LAS PROPORCIONES NECESARIAS PARA SATISFACER LOS REQUISITOS DE CALIDAD; ESTOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS DE LA S. C. T.                | M3 | 247.33       | 247.33       | 0.00        | 523.74          | \$129,536.6142  | \$129,536.6142  | \$0.00000       | \$0.00      |
| <b>SUBTOTAL</b>  |    |              |              |             |                 | \$1,434,701.01  | \$1,336,019.98  | \$0.00          | \$98,681.04 |

CONTRATISTA:  REPRESENTANTE LEGAL

OBRA PUBLICAS  DIRECTOR

ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS  
 Jefe de Supervision y Control de Obra Publica.

**GOBIERNO DE ZAPOTLAN EL GRANDE**  
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
 ESTIMACION DE TRABAJOS ORDINARIOS

OBRA: "REHABILITACION DE ANDADOR PEATONAL LAGUNA DE ZAPOTLAN EN CIUDAD GUZMAN, DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO." MUNICIPIO: ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.

ESTIMACION: TRES  
 No. DE OBRA: DOP/PDR23/2018-01  
 No. DE CONTRATO: DOP/PDR23/2018-01/016


CUERPO DE ESTIMACION  
 HOJA: 2 DE 2

| CONCEPTOS  | U   | CANTIDADES   |              |             | PRECIO UNITARIO | IMPORTES         |                   |                 | SALDO    |
|--|-----|--------------|--------------|-------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|----------|
|  |     | PRESUP. BASE | ESTIM. ACUM. | ESTA ESTIM. |                 | PRESUP. BASE     | ESTIM. ACUM.      | ESTA ESTIMACION |          |
| <b>MACHUELOS</b>   |     |              |              |             |                 |                  |                   |                 |          |
| MAC- 341,2MACHUELO INTEGRAL DE 10 A 15 CM. X 60 CM. X 35 CM. DE ALTURA ELABORADO A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO Fc=250 KG/CM2. INCLUYE CIMBRA, COLADO, VIBRADO, Y CURADO. HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | M   | 804.34       | 783.30       | 21.04       | 0.00 \$         | \$421,866.2866   | \$410,833.02 \$   | 11,035.27       | \$0.0000 |
| <b>LOSA DE CONCRETO</b>  |     |              |              |             |                 |                  |                   |                 |          |
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO Fc = 250 KG/CM2 RESISTENCIA NORMAL A 28 DIAS CON REVENIMIENTO DE 10 CMS.,  | M2  | 4,544.52     | 2,814.55     | 1,730.00    | 0.0 \$          | \$2,585,377.9699 | \$1,601,197.90 \$ | 984,180.50      | \$0.00   |
| <b>LUMINARIAS</b>  |     |              |              |             |                 |                  |                   |                 |          |
| INSTALACION DE LUMINARIA CREE XPS1 101 WATTS. INCLUYE CABLE CONDUMEX CAL. 12, BRAZO METALICO DE 1.80 X 32 MM. Y LUMINARIA. NO INCLUYE POSTE.   | PZA | 16.000       | 16.00        | -           | 0.00 \$         | \$203,467.84     | \$203,467.84 \$   | -               | \$0.00   |
| <b>LIMPIEZA FINAL</b>  |     |              |              |             |                 |                  |                   |                 |          |
| LIMPIEZA FINAL (GENERAL) DE OBRA   | M2  | 4,946.69     | -            | 4,946.69    | 0.00 \$         | \$60,003.36183   | \$0.00            | \$60,003.36183  | \$0.00   |
| <b>SUBTOTAL</b>  |     |              |              |             |                 | \$3,270,717.4853 | \$2,215,498.35    | \$1,055,219.13  | \$0.00   |



|              |  |  |  |  |  |               |                |                |             |
|--------------|--|--|--|--|--|---------------|----------------|----------------|-------------|
| <b>TOTAL</b> |  |  |  |  |  | \$4,705,418.5 | \$3,551,518.33 | \$1,055,219.13 | \$98,681.04 |
|--------------|--|--|--|--|--|---------------|----------------|----------------|-------------|

CONTRATISTA  
  
 JORGE ROBERTO CARDENAS MACIAS  
 REPRESENTANTE LEGAL

OBRAS PUBLICAS  
  
 ARQ. JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR  
 DIRECTOR



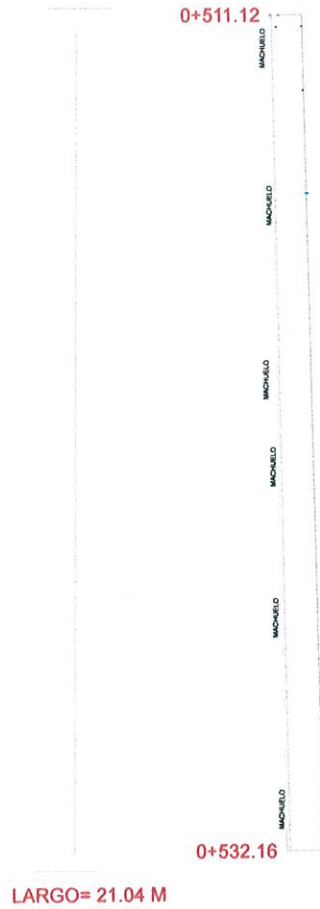
ING. JOSE DAVID DAVAN RIOS  
 Jefe de Supervision y Control de Obras Publicas.

|  |  |  |              |  |             |                 |               |                      |
|--|--|--|--------------|--|-------------|-----------------|---------------|----------------------|
| <b>GOBIERNO DE ZAPOTLAN EL GRANDE</b><br><b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>  |  | <b>CONTRATO No.</b><br>DOPPPDR23/2018-01/016   |              | <b>GENERADORES</b>   |             |                 |               |                      |
| <b>OBRA:</b><br>"Construcción de losa de concreto hidráulico en Av. Pedro Ramirez Vazquez (Segunda etapa), en el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco" |  | <b>UBICACION:</b><br>CIUDAD GUZMAN, JAL.   |              | ESTIMACION 3   |             |                 |               |                      |
| <b>CONTRATISTA:</b><br>CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DEL SUR DE TECA, S.A. DE C.V.  |  | <b>HOJA No.</b><br>1   |              |  |             |                 |               |                      |
| <b>No.</b>   | <b>CONCEPTO</b>  | <b>REFERENCIA</b>  | <b>LARGO</b> | <b>ANCHO</b>   | <b>ALTO</b> | <b>CANTIDAD</b> | <b>UNIDAD</b> | <b>OBSERVACIONES</b> |
| 1  | MAC- 341.2MACHUELO INTEGRAL DE 10 A 15 CM. X 30 CM. X 35 CM. DE ALTURA ELABORADO A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO FC-250 KG/CM2. INCLUYE CIMBRA, COLADO, VIBRADO, Y CURADO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | CADENAMIENTO<br>LADO DERECHO<br>0+511.12<br>AL<br>0+542.16   | 21.04        | 0.5  | 0.35        | 21.04           | ML            |                      |
| <b>TOTAL:</b>  |  |  |              |  |             | <b>21.04</b>    | <b>ML</b>     |                      |
| <b>CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DEL SUR DE TECA, S.A. DE C.V.</b><br>   |  | <b>OBRAS PUBLICAS</b>  |              |  |             |                 |               |                      |
| <b>JORGE RIGOBERTO CARDENAS MACIAS</b><br>Representante Legal.   |  | <br><b>ARQ. JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR</b><br>Director de Obras Publicas. |              | <b>ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS</b><br>Jefe de Supervision y Control de Obra Publica. |             |                 |               |                      |

"Construcción de losa de concreto hidráulico en Av. Pedro Ramírez Vázquez (Segunda etapa), en el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco."

(SOLO LADO DERECHO)  
TERCER TRAMO

CROQUIS





MAC- 341.2MACHUELO INTEGRAL DE 10 A 15 CM. X 50 CM. X 35 CM. DE ALTURA, ELABORADO A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2. INCLUYE CIMBRA, COLADO, VIBRADO, Y CURADO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.

|                                 |              |   |              |
|---------------------------------|--------------|---|--------------|
| GOBIERNO DE ZAPOTILAN EL GRANDE | CONTRATO No. | DOP/PPDR23/2018-01/01   | GENERADORES  |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS     | OBRA:        | "Construcción de losa de concreto hidráulico en Av. Pedro Ramirez Vázquez (Segunda etapa), en el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco." | ESTIMACION 3 |
|                                 | UBICACION:   | CIUDAD GUZMAN, JAL.   | HOJA No.     |
|                                 | CONTRATISTA: | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DEL SUR DE TECA, S.A. DE C.V.  | 1 DE 3       |

**REPORTE FOTOGRAFICO**

|   |   |
|---|---|
|  |  |
|---|---|

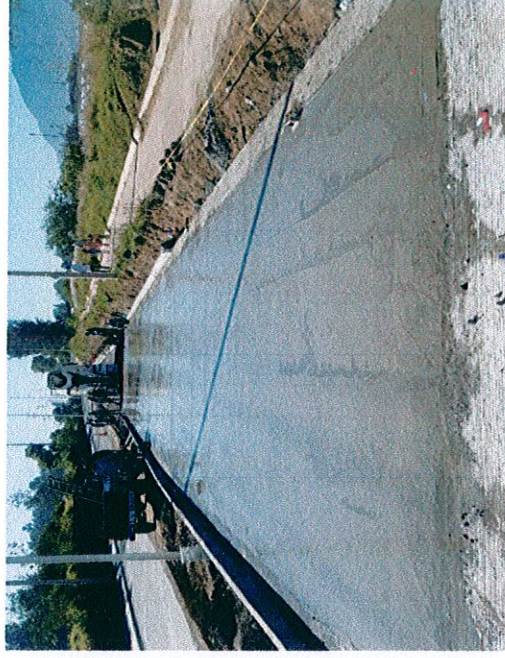
|  |  |
|--|--|
| CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DEL SUR DE TECA, S.A. DE C.V.                             | OBRAS PUBLICAS   |
|  |  |
| JORGE RIGOBERTO CARDENAS MACIAS<br>Representante Legal.                              | ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS<br>Jefe de Supervision y Control de Obra Publica.        |

| GOBIERNO DE ZAPOTLAN EL GRANDE                          |  | DOP/PDR23/2018-01/016  |        |   |            | GENERADORES   |        |
|---|--|--|--------|---|------------|---------------|--------|
| CONTRATO No.  |  | "Construcción de losa de concreto hidráulico en Av. Pedro Ramirez Vazquez (Segunda etapa), en el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco" |        |   |            | ESTIMACION 3  |        |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                             |  | CIUDAD GUZMAN, JAL.  |        |   |            | HOJA No. 2    |        |
| CONTRATISTA:  |  | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DEL SUR DE TECA, S.A. DE C.V.   |        |   |            | OBSERVACIONES |        |
| No.   | CONCEPTO   | REFERENCIA   | LARGO  | SECCION VARIABLE  |            | CANTIDAD      | UNIDAD |
|   |  |  |        | BASE MAYOR  | BASE MENOR |               |        |
| 2   | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PRIME/ACLAADO Fc = 250 KG/CM2 RESISTENCIA NORMAL A 28 DIAS CON REVENIMIENTO DE 10 CMS. | 0-511.12   | 16.67  | 7.05  | 6.60       | 113.77        | M2     |
|   |  | AL   |        |   |            |               |        |
|   |  | 0-527.68   | 16.67  | 6.6   | 6.00       | 105.02        | M2     |
|   |  | AL   |        |   |            |               |        |
|   |  | 0-544.44   | 16.67  | 6.0   | 5.60       | 96.69         | M2     |
|   |  | AL   |        |   |            |               |        |
|   |  | 0-561.12   | LARGO  | ANCHO   |            |               |        |
|   |  | AL   | 253.00 | 5.6   |            | 1,416.80      | M2     |
|   |  | 0-814.12   |        |   |            |               |        |
| TOTAL:  |  |  |        |   |            | 1,732.28      | M2     |
| CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DEL SUR DE TECA S.A. DE C.V. |  | OBRAS  |        | PUBLICAS  |            |               |        |
| JORGE RIGOBERTO CARDENAS MACIAS<br>Representante Legal. |  | ARQ. JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR<br>Director de Obras Publicas.   |        | ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS<br>Jefe de Supervision y Control de Obra Publica. |            |               |        |






|                                |                     |   |              |
|--------------------------------|---------------------|---|--------------|
| GOBIERNO DE ZAPOTLAN EL GRANDE | CONTRATO N°:        | DOP/PDR23/2018-01/01  | GENERADORES  |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS    | OBRA:               | "Construcción de losa de concreto hidráulico en Av. Pedro Ramirez Vázquez (Segunda etapa), en el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco." | ESTIMACION 3 |
|                                | UBICACION:          | CIUDAD GUZMAN, JAL.   | 2 DE 3       |
|                                | CONTRATISTA:        | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DEL SUR DE TECA, S.A. DE C.V.  | HOJA N°:     |
| 2                              | REPORTE FOTOGRAFICO |   |              |



|  |   |
|--|---|
| CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DEL SUR DE TECA, S.A. DE C.V. | OBRAS PUBLICAS  |
| JORGE RIGOBERTO CARDENAS MACIAS<br>Representante Legal.  | ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS<br>Jefe de Supervision y Control de Obra Publica. |

|  |  |  |  |   |  |   |  |
|--|--|--|--|---|--|---|--|
| <b>GOBIERNO DE ZAPOTLAN EL GRANDE</b><br>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS |  | CONTRATO No.<br>OBRA:<br>UBICACION:<br>CONTRATISTA:              |  | DOP/PDR23/2018-01/016<br>DOP/PDR23/2018-01/016<br>CIUDAD GUZMAN, JAL.<br>CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DEL SUR DE TECA, S.A. DE C.V. |  | GENERADORES<br>ESTIMACION 3<br>HOJA No. 3                                     |  |
| No.  |  | CONCEPTO   |  | REFERENCIA<br>CADENAMIENTO  |  | UNIDAD  |  |
| 3  |  | LIMPIEZA FINAL GENERAL DE OBRA                                   |  | 0-000.00<br>AL<br>0-825   |  | M2  |  |
|  |  |  |  | 825.00  |  | 4950.00   |  |
|  |  |  |  | 6.000000  |  | 4946.69   |  |
|  |  |  |  | TOTAL:  |  | M2  |  |
|  |  |  |  |   |  | OBRAS PUBLICAS  |  |
| JORGE ROBERTO CARDENAS MACIAS<br>Representante Legal.                |  | ARO, JESUS ELGENTE CAMPOS ESCOBAR<br>Director de Obras Publicas. |  |   |  | ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS<br>Jefe de Supervision y Control de Obra Publica. |  |

"Construcción de losa de concreto hidráulico en Av. Pedro Ramírez Vázquez (Segunda etapa), en el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco."

CROQUIS

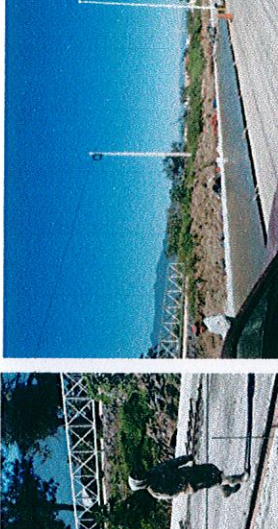


0+000.00

LARGO= 825.0 M

0+825.00

ANCHO= 6.0 M

LIMPIEZA FINAL GENERAL DE OBRA

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <p>GOBIERNO DE ZAPOTLAN EL GRANDE<br/>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</p>              | <p>CONTRATO No.<br/>OBRAS:<br/>UBICACION:<br/>CONTRATISTA:</p>                    | <p>DOP/PDR23/2018-01/01<br/>"Construcción de losa de concreto hidráulico en Av. Pedro Ramirez Vázquez (Segunda etapa), en el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco."<br/>CIUDAD GUZMAN, JAL.<br/>CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DEL SUR DE TECA, S.A. DE C.V.</p> | <p>GENERADORES<br/>ESTIMACION 3<br/>3 DE 3<br/>HOJA No.</p>                           |
| <p>3 REPORTE FOTOGRAFICO</p>   |   |  |   |
|  |  |   |   |
| <p>CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DEL SUR DE<br/>TECA, S.A. DE C.V.</p>                | <p>JORGE RIGOBERTO CARDENAS MACIAS<br/>Representante Legal.</p>                   | <p>ARQ. JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR<br/>Director de Obras Publicas.</p>   | <p>ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS<br/>Jefe de Supervision y Control de Obra Publica.</p> |
| <p>OBRAS PUBLICAS</p>  |   |  |   |
