



CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DEL SUR DE TECA SA DE CV

RFC: CES061127734 ABASOLO No. 61 CENTRO, TECALITLAN 49900 TECALITLAN
JALISCO MEXICO

I - Ingreso Versión 3.3 Factura Serie y Folio: A 45
FECHA: 26/12/2018 13:44:19
Folio Fiscal: 16E25C05-C07D-44BF-8AA6-49789A90E9AE Fecha y hora de certificación: Diciembre 26 2018 - 13:44:21 Serie del Certificado del emisor: 00001000000403996498 No de Serie del Certificado del SAT: 0000100000040486074
CONDICIONES:
USO CFDI: G03 - Gastos en general

EXPEDIDO EN: CP: 49900

CLIENTE: 2 MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO	R.F.C.: MZG8501012NA
DOMICILIO: AV. COLON No. 62, COLONIA: CENTRO, POBLACIÓN: GUZMAN, JALISCO, C.P.: 49900	
FORMA DE PAGO: 99 - Por definir, MÉTODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferido, MONEDA: MXN - Peso Mexicano	
Observaciones:	Referencia:

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.00000	E48 - Unidad de servicio	2 SAT: 30191800	RECIBIMOS DE H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO LA CANTIDAD DE \$ 627,567.04 (SEISCIENTOS VEINTICETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS .04/100 M.N.) POR CONCEPTO DE ESTIMACION No 4 Y FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO CON NUMERO DE CONTRATO DOP/PDR23/2018-01/016 CON FIANZA DE ANTICIPO # 3202-12214-0 Y FIANZA DE CUMPLIMIENTO 3502-12215-7 COMPANIA ASERTA AFIANZADORA S.A. DE C.V.	541,006.07000	002 - IVA - 86,560.97	541,006.07

IMPORTE CON LETRA	
SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 04/100 M.N.	
Este documento es una representación impresa de un CFDI	
601 - General de Ley Personas Morales	
CFDI Relacionado:	
Tipo Relación: -	
CFDI Relacionado: -	

SUBTOTAL:	541,006.07
Impuestos Traslados	
I.V.A. 16%:	86,560.97
TOTAL:	627,567.04

Sello digital del CFDI

FloAtkUQIDExA27uKvpsL9Aj23EL+xErY5nrb31yuYo0Ru7+mg4sVpOML+LGoOrOmobkSKaWed8ks32kPnRpY2C0FQ8n1HWFr18loy+qjMTDwZ0d4Rq3mveE28XJ5MIR0KieqncamNqTNSusuC2j9AApMf0Dnye2K+/S3NZp9REBY2FIIHb37TnnR7oOCTuvMkllE4dwlCgxnngC6H7S4wBIB4CkW9a3R/6kdC5KWfufu/E4v153xFWxb55LQwnzF9O136b0u3eNl9q5oyQn+xazF2JibULXyiq26y4Znr9XoTeWn1fGY3YMZJ5RwT+5j25hyw2g==

Sello del SAT

L0f5SXENgAxRmblC+gxcltRzr90YebHO2eM6paqHqBkKGMQZokePKWDCsJvN+TT1MPwKtQw8RSPTkShhM3CHYSoYtV3qjRMBfdvduJgt+gs3RPFIB+wt2xd1lbdzsyxk3SRtsSKSUZaAAWnJdqe1W0HtBrclXv+80kcoqJhQsjoXxtw+VxGBL/VfYzxpNdlLLRneFHhXWYefiq2svp+2j0smxS3MnQHpSaa pSks55fHOnNocQpMoqU1ze++wEymjQnr+QFY2aEqAYr8C9LfaPmlCFqWYym3ByhJkYaylrSjI0JfWZQUv4YrkZu4gUvQ=-

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1||16E25C05-C07D-44BF-8AA6-49789A90E9AE|2018-12-26T13:44:21|MAS0810247C0|F/aA|kUQIDExA27uKvpsL9Aj23EL+xErY5nrb31yuYo0Ru7+mg4sVpOML+LGoOrOmobkSKaWed8ks32kPnRpY2C0FQ8n1HWFr18loy+qjMTDwZ0d4Rq3mveE28XJ5MIR0KieqncamNqTNSusuC2j9AApMf0Dnye2K+/S3NZp9REBY2FIIHb37TnnR7oOCTuvMkllE4dwlCgxnngC6H7S4wBIB4CkW9a3R/6kdC5KWfufu/E4v153xFWxb55LQwnzF9O136b0u3eNl9q5oyQn+xazF2JibULXyiq26y4Znr9XoTeWn1fGY3YMZJ5RwT+5j25hyw2g==|0000100000040486074||



Banco:

Debe(mos) y pagare(mos) incondicionalmente por este Pagaré a la orden de CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DEL SUR DE TECA SA DE CV en TECALITLAN, JALISCO el día _____ la cantidad de: \$627,567.04 (SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 04/100 M.N.), valor recibido en mercancía a mi (nuestra) entera satisfacción. Este pagaré es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su Artículo 173 parte final y artículos correlativos por no ser pagaré domiciliado. De no ser pagado a su vencimiento causara intereses moratorios del 5% mensual, todo cheque devuelto causara un 20% sobre el valor del mismo según artículo 7 y 39 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
Firma de Aceptación

DIRECCION DE GESTION DE PROGRAMAS COPLADEMUN Y CULACION COLEGACIONES

27 DIC 2018

RECIBIDO

GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 RECURSO: "PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL"

CONTROL DE OBRA PUBLICA

FECHA: 2712/2018

Contrato: DOP/PDR23/2018-01/016
 Evento: LOSA DE CONCRETO

Contratista: CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DEL SUR DE TECA S.A. DE C.V.

Obra: "Construcción de losa de concreto hidráulico en Av. Pedro Ramírez Vázquez (Segunda etapa), en el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco."

Localidad: CD. GUZMAN
 Fecha de Inicio: 07/010/2018
 Estimación No.: 4 (FINIQUITO)

Municipio: ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.
 Fecha de Término: 15/12/18

Resumen de Documento		
+ Importe de la Estimación	\$565,676.33	\$565,676.33
+ Aditiva	\$0.00	\$0.00
- Deductiva	\$0.00	\$0.00
+ IVA: 16%	\$90,508.21	\$656,184.54
- Amortización	\$28,617.50	\$627,567.04
Total	\$627,567.04	\$627,567.04

Avance	
Fecha Inicial	07/010/2018
Financiero:	100.00%
Fisico %	100.00%
Fecha:	2712/2018

Techo Financiero	Importe	Acumulado	Importe
Presupuesto Base	\$5,458,285.47	Esta Estimacion	\$656,184.54
Convenio Adicional	\$541,714.53	Acumulado Anterior	\$5,343,815.46
Suma Escalatorias		Acumulado Actual	\$6,000,000.00
Total	\$6,000,000.00	Saldo	\$0.00

Anticipo	
Anticipo	25% \$ 1,364,571.37
Amort. Del acumulado	\$ 1,335,953.87
Esta amortización	\$ 28,617.50
Total Amortizado	\$ 1,364,571.37
Saldo por amortizar	\$ 0.00

Detalle	Federal	Estatal	Municipio
Importe	\$541,006.07	\$0.00	\$0.00
Escalatoria	\$0.00	\$0.00	\$0.00
IVA	\$86,560.97	\$0.00	\$0.00
Total a Facturar	\$627,567.04	\$0.00	\$0.00
Deducción del 5 al millar	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Deducción del 2 al millar	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Deducción del 2% Supervisión Externa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Sanción	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total a Pagar	\$627,567.04	\$0.00	\$0.00

Sumas	
	\$541,006.07
	\$0.00
	\$86,560.97
	\$627,567.04
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$627,567.04


OBRAS PUBLICAS  ARQ. JESUS EGENIO CAMPOS ESCOBAR DIRECTOR	 OBRAS PUBLICAS  ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS Jefe de Supervision y Control de Obra Publica.	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS CONTRATISTA  JORGE RIGOBERTO CARDENAS MACIAS REPRESENTANTE LEGAL
---	---	---

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 PROGRAMAS DE PLANEACION Y
 VINCULACION CON LAS DELEGACIONES

27 DIC 2018

RECIBIDO

GOBIERNO DE ZAPOTLAN EL GRANDE		CUERPO DE ESTIMACION									
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		"Construcción de leas de concreto hidráulico en Av. Pedro Ramirez Vázquez (Segunda etapa), en el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco."									
ESTIMACION DE TRABAJOS ORDINARIOS		ESTIMACION: 4 (FINIQUITO)		MUNICIPIO: ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.		No. DE OBRA: DOP/PDR232018-01		No. DE CONTRATO: DOP/PDR232018-01/016		HOJA: 1 DE 2	
CONCEPTOS	U	CANTIDADES			PRECIO UNITARIO	IMPORTE			SALDO		
		PRESUP. BASE	ESTIM. ACUM.	ESTA ESTIM.		PRESUP. BASE	ESTIM. ACUM.	ESTA ESTIMACION			
PRELIMINARES											
TRA-611 TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO SERVICIAMENTE PLANO UTILIZANDO CONO PARA ESTABLECER LOS PUNTO DE REFERENCIA INCLUYE: ESTACAS, PINTURA Y TODO LO QUE SEA NECESARIO PARA SU CORRECTA ELECCION	M2	4,946.69	4,946.69	720.00	-720.00 \$	7.41	\$36,654.97290	\$36,654.98031	\$5,335.2		-\$5,335.21
COR-486 CORTE (EXCAVACION) POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA EN REBAJES DE LA CAMA DE CORTES Y/O DE LA CORONA DE TERRAPLENES EXISTENTES, CUANDO EL MATERIAL SE DESPERDICE (MATERIAL CLASE "B")	M3	2,324.95	2,324.95	338.40	-338.40 \$	26.00	\$60,448.70	\$8,795.4	\$8,795.4		-\$8,795.40
REF-001 CARGA Y RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE DE LA OBRA EN CAMION VOLTEO O DE PLATAFORMA FUERA DE LA OBRA HASTA TRADERO MUNICIPAL O A DONDE LO INDIQUEN LAS AUTORIDADES, A UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 5 KMS. ...	M3	3,138.68	2,324.95	338.40	475.33 \$	121.27	\$80,627.7236	\$281,946.68650	\$41,037.77		\$57,643.27
EMP-004 EXCARIFICADO DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	4,946.69	4,946.70	720.00	-720.00 \$	8.87	\$43,877.14917	\$43,877.14917	\$6,386.4		-\$6,386.40
SUB-486.2X ELABORACION Y TENDIDO DE SUB-BASE HIDRAULICA, DE 20 CMS. DE ESPESOR COMPACTO	M2	4,946.69	4,946.70	720.00	-720.00 \$	51.89	\$256,683.79599	\$256,683.79599	\$37,360.8		-\$37,360.80
ELABORACION Y TENDIDO DE BASE HIDRAULICA DE 20 CMS. DE ESPESOR COMPACTO. LOS MATERIALES PARA LA BASE PODRAN SER NATURALES (ARENAS, GRAVAS, LIMOS Y ROCAS FRAGMENTADAS Y MUY ALTERADAS); ESTOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS (N-CMT-4-02-062).	M2	4,946.69	4,946.70	720.00	-720.00 \$	106.51	\$526,872.05841	\$526,872.05841	\$76,687.20		-\$76,687.20
RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL DE BANCO UTILIZANDO MAQUINARIA, EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS. EN LAS PROPORCIONES NECESARIAS PARA SATISFACER LOS REQUISITOS DE CALIDAD; ESTOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS DE LA S. C. T.	M3	247.33	247.33		0.00 \$	523.74	\$129,536.6142	\$129,536.6142	\$0.00000		\$0.00
SUBTOTAL							\$1,434,701.01	\$1,336,019.98	\$175,685.77		-\$117,962.50


CONTRATISTA

 REPRESENTANTE LEGAL

OBRA PUBLICAS

 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


OBRA PUBLICAS

 DIRECTOR

OBRA PUBLICAS

 JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA PUBLICA.

"Construcción de losa de concreto hidráulico en Av. Pedro Ramírez Vázquez (Segunda etapa), en el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco."

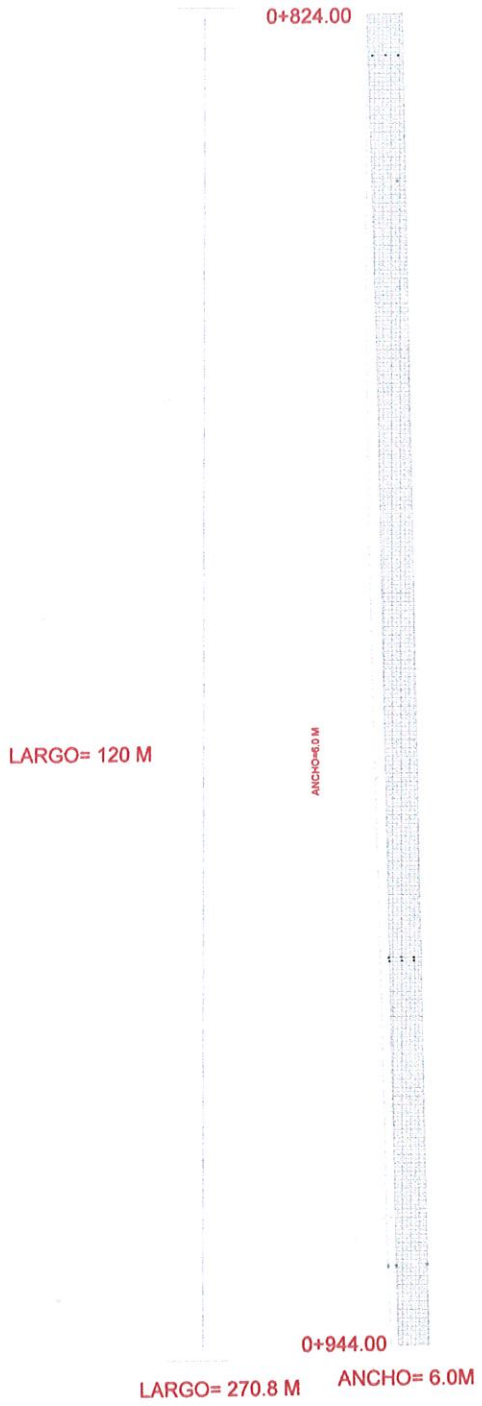CROQUIS




TRA-613.1 TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO SENCIBLEMENTE PLANO UTILIZANDO EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO BANCOS DE NIVEL Y EJES DE REFERENCIA INCLUYE: ESTACAS, PINTURA Y TODO LO QUE SEA NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

GOBIERNO DE ZAPOTLAN EL GRANDE	CONTRATO No.	DOP/PDR23/2018-01/01	GENERADORES
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBRA:	"Construcción de losa de concreto hidráulico en Av. Pedro Ramirez Vázquez (Segunda etapa), en el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco."	ESTIMACION 4 FINQUITO
	UBICACION:	CIUDAD GUZMAN, JAL.	HOJA No.
	CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DEL SUR DE TECA, S.A. DE C.V.	

1 REPORTE FOTOGRAFICO



CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DEL SUR DE	OBRAS	PUBLICAS
TECA, S.A. DE C.V.		
JORGE RISOBERTO CARDENAS MACIAS	ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS	Jefe de Supervision y Control de Obra Publica.
Representante Legal.	Director de Obras Publicas.	



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


GOBIERNO DE ZAPOTLAN EL GRANDE DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DEL SUR DE TECA, S.A. DE C.V. DOP/PDR23/2018-01/016				GENERADORES 4 FINIQUITO							
CONTRATO No. OBRA: UBICACION: CONTRATISTA:		CIUDAD GUZMAN, JAL. CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DEL SUR DE TECA, S.A. DE C.V.				HOJA No. 2							
No.		REFERENCIA CADENAMIENTO		ANCHO		ALTO		TOTAL		UNIDAD		OBSERVACIONES	
2		01 824.00 AL 0-944		120.00		6.000000		0.47		338.40		M3	
CONCEPTO		COR-486 CORTE (EXCAVACION) POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA EN RIBAJES DE LA CAMA DE CORTIS V/O DE LA CORONA DE TERRAPLENES EXISTENTES, CUANDO EL MATERIAL SE DESPERDICE (MATERIAL CLASE "B")											
		TOTAL: 338.40 M3											
CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DEL SUR DE TECA, S.A. DE C.V.		OBRAS PUBLICAS											
JORGE RICARDO CORDERAS MACIAS Representante Legal.		ARQ. JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR Director de Obras Publicas.											
		ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS Jefe de Supervision y Control de Obra Publica.											



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

"Construcción de losa de concreto hidráulico en Av. Pedro Ramírez Vázquez (Segunda etapa), en el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco."

CROQUIS

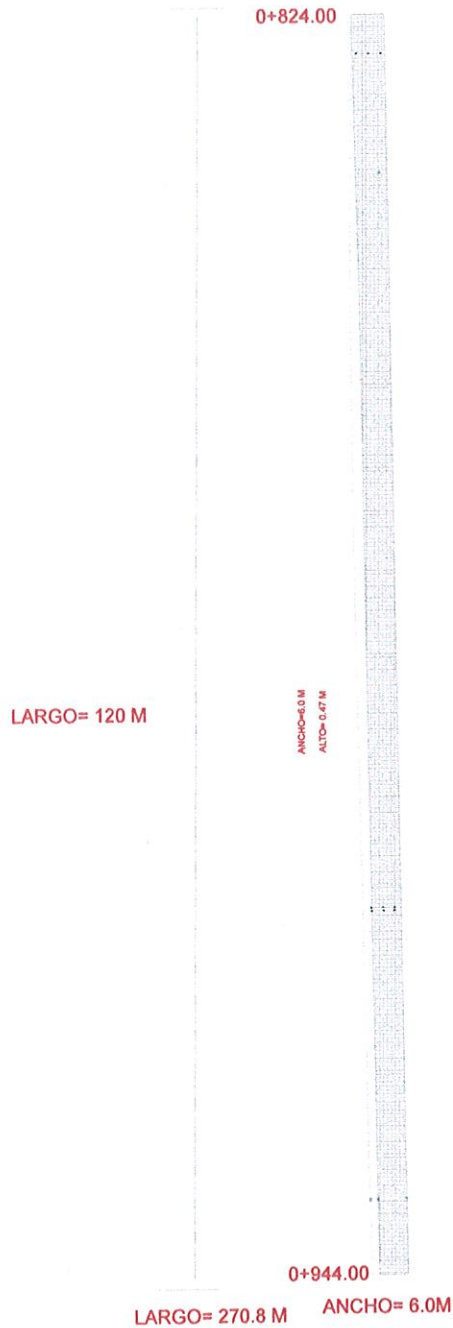

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

COR-486 CORTE (EXCAVACION) POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA EN REBAJES DE LA CAMA DE CORTES Y/O DE LA CORONA DE TERRAPLENES EXISTENTES, CUANDO EL MATERIAL SE DESPERDICIE (MATERIAL CLASE "B")


GOBIERNO DE ZAPOTILAN EL GRANDE DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		CONTRATO No. OBRA: UBICACION: CONTRATISTA:		CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DEL SUR DE TECA, S.A. DE C.V. DOP/PDR23/2018-01/016		GENERADORES 4 FINIQUITO	
		CIUDAD GUZMAN, JAL.		HOJA No. 3			
		CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DEL SUR DE TECA, S.A. DE C.V.					
No.		CONCEPTO		REFERENCIA		ANCHO	
3		RETORNO CARGA Y RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE DE LA OBRA EN CAMION VOLTRIO O DE PLATAPORMIA FUERA DE LA OBRA HASTA TIERRERO MUNICIPAL O A DONDE LO INDIQUEN		0+824.00 AL 0+944		6.000000	
				120.00		0.47	
				338.40		M3	
				TOTAL:		338.40	
						M3	
CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DEL SUR DE TECA, S.A. DE C.V.				OBRAS		PUBLICAS	
JORGE RIGOBERTO CARDENAS MACIAS Representante Legal.		ARO. JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR Director de Obras Publicas.		ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS Jefe de Supervision y Control de Obra Publica.			



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

"Construcción de losa de concreto hidráulico en Av. Pedro Ramírez Vázquez (Segunda etapa), en el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco."

CROQUIS

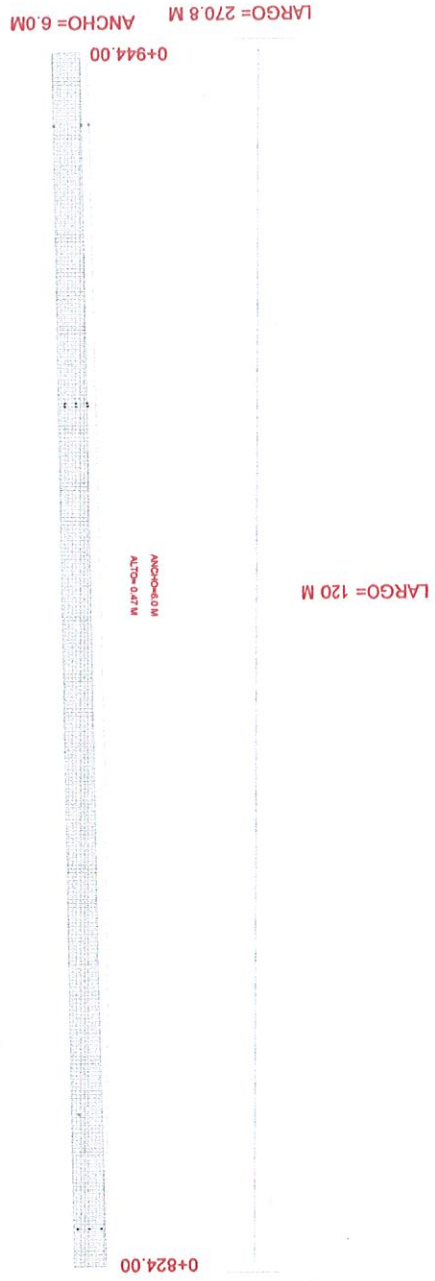

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS





WA

RET-001 CARGA Y RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE DE LA OBRA EN CAMION VOLTEO O DE PLATAFORMA FUERA DE LA OBRA HASTA TIRADERO MUNICIPAL O A DONDE LO INDIQUEN

Detailed description: A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long vertical stroke extending downwards.


GOBIERNO DE ZAPOTLAN EL GRANDE DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO No. OBRA: UBICACION: CONTRATISTA:	DOP/PDKR23/2018-01/01 "Construcción de losa de concreto hidráulico en Av. Pedro Ramirez Vázquez (Segunda etapa), en el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco."	GENERADORES ESTIMACION 4 FINIQUITO
		CIUDAD GUZMAN, JAL. CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DEL SUR DE TECA, S.A. DE C.V.	HOJA No. 3
REPORTE FOTOGRAFICO			

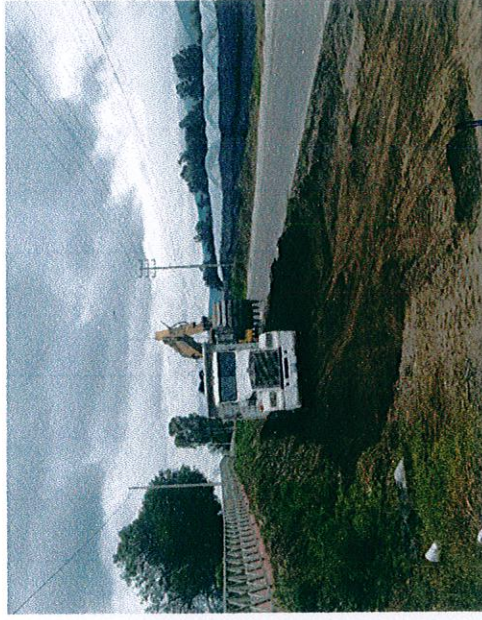

CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DEL SUR DE TECA, S.A. DE C.V. 	OBRAS PUBLICAS
JORGE RIGOBERTO CARDENAS MACIAS Representante Legal.	ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS Jefe de Supervision y Control de Obra Publica.



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


GOBIERNO DE ZAPOTILAN EL GRANDE DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DEL SUR DE TECA, S.A. DE C.V.				GENERADORES	
CONTRATO No. OBRA: UBICACION: CONTRATISTA:		DOP/PDR23/2018-01/016 CIUDAD GUZMAN, JAL. CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DEL SUR DE TECA, S.A. DE C.V.				4 FINIQUITO 4	
No.		CONCEPTO		REFERENCIA CADENAMIENTO		UNIDAD OBSERVACIONES	
4		EMP-004 EXCARIFICADO DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		0-824.00 AL 0-944		720.00 M2	
				120.00 6.000000		TOTAL: 720.00 M2	
CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DEL SUR DE TECA, S.A. DE C.V.		OBRAS PUBLICAS					
JORGE ROBERTO CARDENAS MACIAS Representante Legal.		ARQ. JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR Director de Obras Publicas		ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS Jefe de Supervision y Control de Obra Publica.			






DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

"Construcción de losa de concreto hidráulico en Av. Pedro Ramírez Vázquez (Segunda etapa), en el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco."

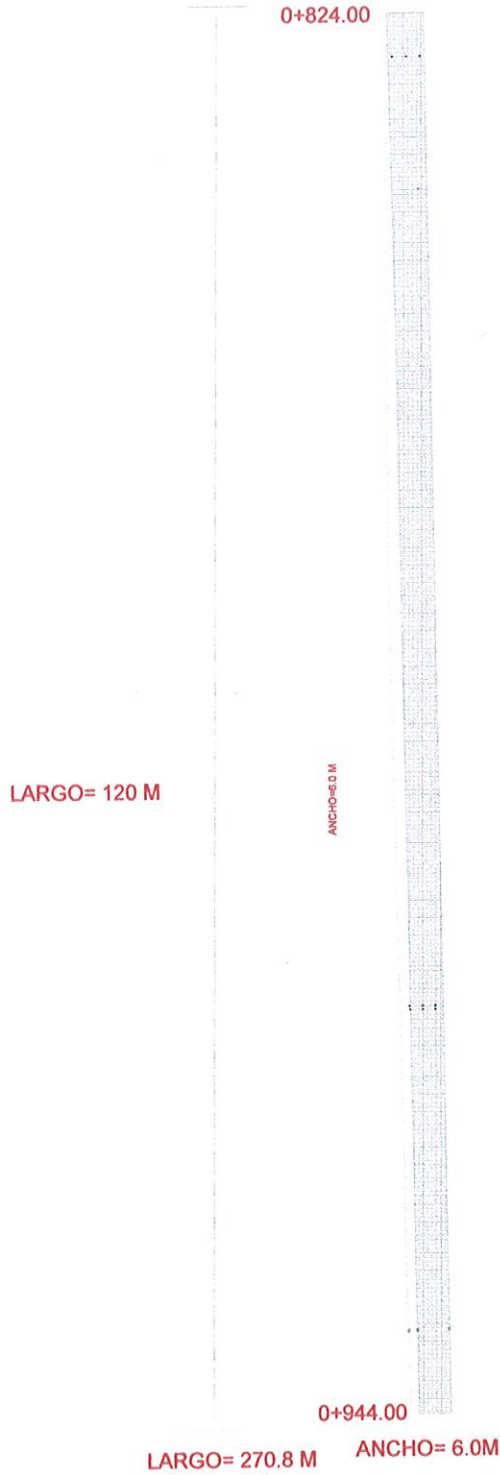CROQUIS



EMP-004 EXCARIFICADO DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS INCLUYE:
EQUIPO. HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

GOBIERNO DE ZAPOTLAN EL GRANDE DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO No. OBRA: UBICACION: CONTRATISTA:	DOP/PDR23/2018-01/01 "Construcción de losa de concreto hidráulico en Av. Pedro Ramírez Vázquez (Segunda etapa), en el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco." CIUDAD GUZMAN, JAL.	GENERADORES ESTIMACION 4 FINIQUITO 4
4		CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DEL SUR DE TECA, S.A. DE C.V.	
REPORTE FOTOGRAFICO			
			
CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DEL SUR DE TECA, S.A. DE C.V. 		OBRAS PUBLICAS	
JORGE ROBERTO CARDENAS MACIAS Representante Legal.		ARQ. JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR Director de Obras Publicas.	
		JOSE DAVID DAMIAN RIOS Jefe de Supervision y Control de Obra Publica.	

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


GOBIERNO DE ZAPOTLAN EL GRANDE		CONTRATO No.		DOP/PDR23/2018-01/016		GENERADORES	
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		OBRA:		"Construcción de losa de concreto hidráulico en Av. Pedro Ramirez Vazquez (Segunda etapa), en el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco"		4 FINIQUITO	
		UBICACION:		CIUDAD GUZMAN, JAL.		HOJA No.	
		CONTRATISTA:		CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DEL SUR DE TECA, S.A. DE C.V.		5	
No.		CONCEPTO		REFERENCIA		UNIDAD	
		CADERNAMENTO		LARGO		ANCHO	
				ALTO		TOTAL	
5		SUB-496.2X ELABORACION Y TENDIDO DE SUB-BASE HIDRAULICA DE 20 CMS. DE ESPESOR COMPACTO		120.00		6.00	
				0.2		720.00	
						M2	
				TOTAL:		720.00 M2	
CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DEL SUR DE TECA, S.A. DE C.V.				OBRAS		PUBLICAS	
JORGE ROBERTO CARDENAS MACIAS Representante Legal.		ARQ. JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR Director de Obras Publicas.		ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS Jefe de Supervision y Control de Obra Publica.			



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

"Construcción de losa de concreto hidráulico en Av. Pedro Ramírez Vázquez (Segunda etapa), en el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco."


CROQUIS

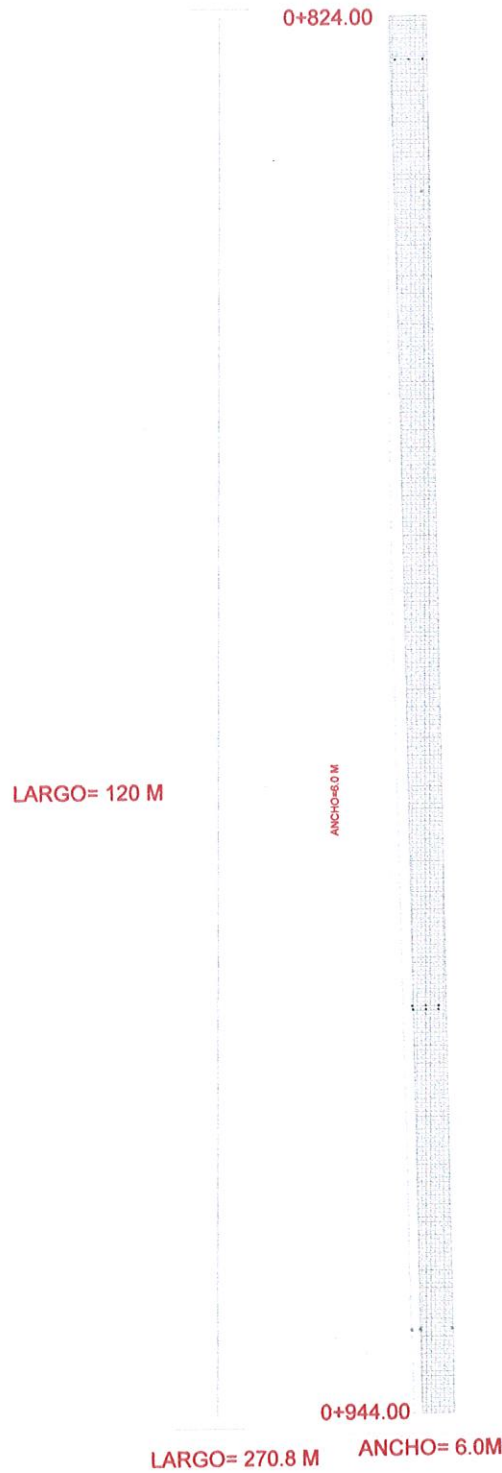

SUB-496.2X ELABORACION Y TENDIDO DE SUB-BASE HIDRAULICA, DE 20 CMS. DE ESPESOR COMPACTO


GOBIERNO DE ZAPOTLAN EL GRANDE	CONTRATO No.	DOP/PDR23/2018-01/01	GENERADORES
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBRA: UBICACION: CONTRATISTA:	"Construcción de losa de concreto hidráulico en Av. Pedro Ramírez Vázquez (Segunda etapa), en el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco." CIUDAD GUZMAN, JAL. CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DEL SUR DE TECA, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 4 FINIQUITO 5
5			HOJA No. 5

REPORTE FOTOGRAFICO

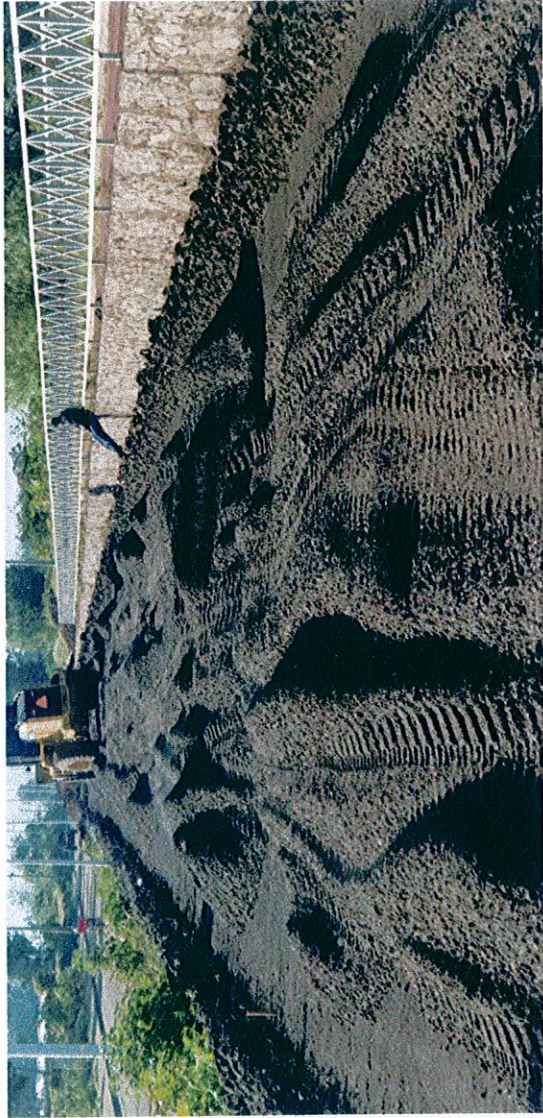

[Handwritten signature in blue ink]

CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DEL SUR DE TECA, S.A. DE C.V.	OBRAS PUBLICAS
JORGE RIGOBERTO CARDENAS MACIAS Representante Legal.	ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS Jefe de Supervision y Control de Obra Publica.



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


GOBIERNO DE ZAPOTLAN EL GRANDE		CONTRATO No.		DOP/PDR23/2018-01/016		GENERADORES	
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		OBRA: UBICACION: CONTRATISTA:		CIUDAD GUZMAN, JAL. CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DEL SUR DE TECA, S.A. DE C.V.		CONVENIO ADICIONAL	
No.		CONCEPTO		LARGO		ANCHO	
6		ELABORACION Y TENDIDO DE BASE HIDRAULICA. DE 20 CMS. DE ESPESOR COMPACTO. LOS MATERIALES PARA LA BASE PODRAN SER NATURALES (ARENAS, GRAVAS, LIMOS Y ROCAS FRAGMENTADAS Y MUY ALTEBADAS); ESTOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS (N° CMT-4-02/002).		120.00		6.000000	
				0-824.00 AL 0-944.00		720.00	
						M2	
				TOTAL		TOTAL: 720.00	
						M2	
						OBRAS PUBLICAS	
		CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DEL SUR DE TECA, S.A. DE C.V.					
		JORGE RIGOBERTO CARDENAS MACIAS Representante Legal.		ARQ. JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR Director de Obras Publicas.		ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS Jefe de Supervision y Control de Obra Publica.	



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

"Construcción de losa de concreto hidráulico en Av. Pedro Ramírez Vázquez (Segunda etapa), en el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco."

CROQUIS

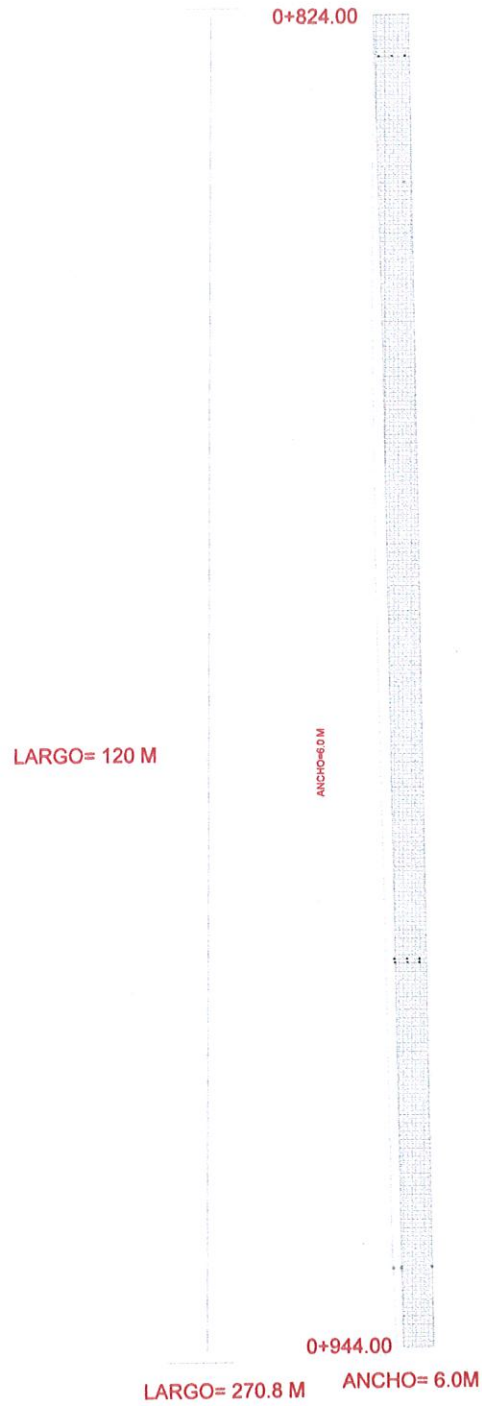



ELABORACION Y TENDIDO DE BASE HIDRAULICA, DE 20 CMS. DE ESPESOR COMPACTO, LOS MATERIALES PARA LA BASE PODRAN SER NATURALES (ARENAS, GRAVAS, LIMOS Y ROCAS FRAGMENTADAS Y MUY ALTERADAS); ESTOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS (N-CMT-4-02-002),

GOBIERNO DE ZAPOTLAN EL GRANDE	CONTRATO No.	"Construcción de losa de concreto hidráulico en Av. Pedro Ramírez Vázquez (Segunda etapa), en el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco."	GENERADORES
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBRA: UBICACION: CONTRATISTA:	CIUDAD GUZMAN, JAL. CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DEL SUR DE TECA, S.A. DE C.V.	
6	6	HOJA No.	6

REPORTE FOTOGRAFICO




CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DEL SUR DE TECA, S.A. DE C.V.	OBRAS PUBLICAS
JORGE RIGOBERTO CARDENAS MACIAS	ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS
Representante Legal.	Jefe de Supervision y Control de Obra Publica.

GOBIERNO DE ZAPOTLAN EL GRANDE DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		CONTRATO No. DOP/PDR23/2018-01/016 "Construcción de losa de concreto hidráulico en Av. Pedro Ramirez Vazquez (Segunda etapa), en el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco"				GENERADORES		
OBRA: UBICACION: CONTRATISTA:		CIUDAD GUZMAN, JAL. CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DEL SUR DE TECA, S.A. DE C.V.				CONVENIO ADICIONAL HOJA No. 7		
CONCEPTO		REFERENCIA	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	UNIDAD	
MAC-341 MACHUELO INTEGRAL DE 10 A 15 CM. X 50 CM. X 35 CM. DE ALTURA ELABORADO A BASE DE CONCRETO PNEUMATIZADO FC-250 KG/CM3. INCLUYE CIMBRA, COLADO, VIBRADO, Y CURADO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.		CADERNAMENTO LADO DERECHO 0+532.16 AL 0+651.76	119.60671	0.5	0.35	119.60671	ML	
7		TOTAL: 119.60671 ML						
CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DEL SUR DE TECA, S.A. DE C.V.		OBRAS PUBLICAS				OBRAS PUBLICAS		
JORGE RICARDO CARDENAS MACIAS Representante Legal.		ARQ. JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR Director de Obras Publicas.				ING. JOSE DAVID DAMIAN ROS Jefe de Supervision y Control de Obra Publica		
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS						

"Construcción de losa de concreto hidráulico en Av. Pedro Ramírez Vázquez (Segunda etapa), en el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco."

(SOLO LADO DERECHO)
TERCER TRAMO

CROQUIS

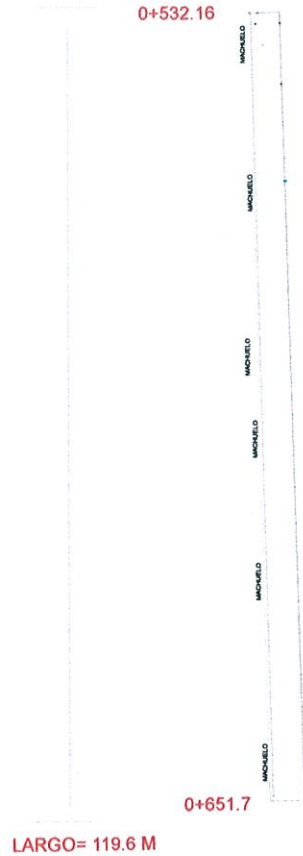

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS





MAC- 341.2MACHUELO INTEGRAL DE 10 A 15 CM. X 50 CM. X 35 CM. DE ALTURA, ELABORADO A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2. INCLUYE CIMBRA, COLADO, VIBRADO, Y CURADO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.

GOBIERNO DE ZAPOTLAN EL GRANDE	CONTRATO No.	GENERADORES
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBRA: UBICACION: CONTRATISTA:	ESTIMACION 4 FINIQUITO
7	"Construcción de losa de concreto hidráulico en Av. Pedro Ramirez Vázquez (Segunda etapa), en el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco." CIUDAD GUZMAN, JAL. CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DEL SUR DE TECA, S.A. DE C.V.	HOJA No. 7
REPORTE FOTOGRAFICO		



CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DEL SUR DE TECA, S.A. DE C.V.	OBRAS PUBLICAS
JORGE RIGOBERTO CARDENAS MACIAS Representante Legal.	ARQ. JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR Director de Obras Publicas
ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS Jefe de Supervision y Control de Obra Publica.	

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

GOBIERNO DE ZAPOTLAN EL GRANDE DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		CONTRATO No. DOP/PDR23/2018-01/016				GENERADORES CONVENIO ADICIONAL							
OBRA: UBIACION: CONTRATISTA:		"Construcción de losa de concreto hidráulico en Av. Pedro Ramírez Vázquez (Segunda etapa), en el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco"				HOJA No. 8							
CONCEPTO		CIUDAD GUZMAN, JAL. CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DEL SUR DE TECA, S.A. DE C.V.				OBSERVACIONES							
No.		REFERENCIA		LARGO		ANCHO		ALTO		CANTIDAD		UNIDAD	
8		0+814.12 AL 0+932.22		118.10		5.6				661.36		M2	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO f _c = 250 KG/CM2 RESISTENCIA NORMAL A 28 DIAS CON REVENIMIENTO DE 10 CMS.,													
TOTAL: 661.36 M2													
CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DEL SUR DE TECA, S.A. DE C.V.		OBRAS PUBLICAS											
JORGE RIGOBERTO CARDENAS MACIAS Representante Legal.		ARQ. JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR Director de Obras Publicas.											
													
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS													

"Construcción de losa de concreto hidráulico en Av. Pedro Ramírez Vázquez (Segunda etapa), en el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco."

GROQUIS



SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
PREMEZCLADO $f_c = 250 \text{ KG/CM}^2$ RESISTENCIA NORMAL A 28 DIAS CON REVENIMIENTO
DE 10 CMS.,

GOBIERNO DE ZAPOTLAN EL GRANDE	CONTRATO No.	GENERADORES
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBRAS: UBICACION: CONTRATISTA:	ESTIMACION 4 FINIQUITO
8	"Construcción de losa de concreto hidráulico en Av. Pedro Ramirez Vázquez (Segunda etapa), en el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco." CIUDAD GUZMAN, JAL. CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DEL SUR DE TECA, S.A. DE C.V.	HOJA No. 8



REPORTE FOTOGRAFICO



CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DEL SUR DE TECA, S.A. DE C.V.	OBRAS PUBLICAS
JORGE RIGOBERTO CARDENAS MACIAS Representante Legal.	ARQ. JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR Director de Obras Publicas
	Jefe de Supervision y Control de Obra Publica.




DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

GOBIERNO DE ZAPOTLAN EL GRANDE DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		CONTRATO No. 0 OBRA: CIUDAD GUZMAN, JAL. UBICACION: CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DEL SUR DE TECA, S.A. DE C.V. CONTRATISTA:		GENERADORES 4 FINIQUITO HOJA No. 9			
No.	CONCEPTO	REFERENCIA	LARGO	ANCHO	TOTAL	UNIDAD	OBSERVACIONES
9	LIMPIEZA FINAL GENERAL DE OBRA	0-825.00 AL 0-945.00	120.00	6.000000	720.00	M2	
				TOTAL:		720.00	M2
CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DEL SUR DE TECA, S.A. DE C.V.							
JORGE RIGOBERTO CARDENAS MACIAS Representante Legal.		ARQ. JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR Director de Obras Publicas.				ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS Jefe de Supervision y Control de Obra Publica.	
							
						DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	

"Construcción de losa de concreto hidráulico en Av. Pedro Ramírez Vázquez (Segunda etapa), en el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco."


CROQUIS

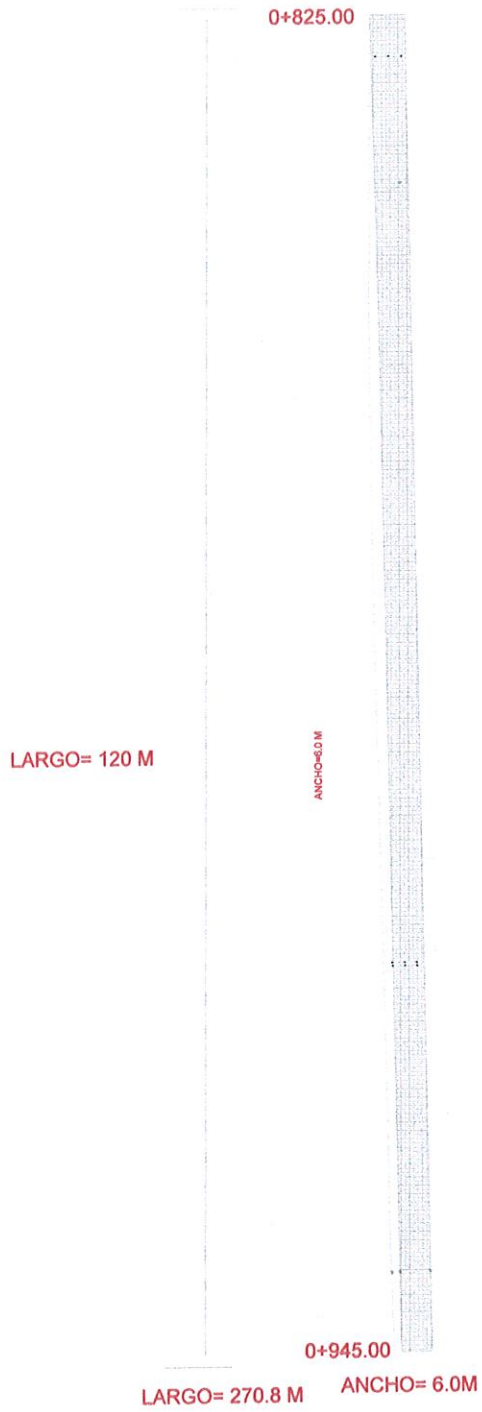




P/M

GOBIERNO DE ZAPOTLAN EL GRANDE	CONTRATO No.	"Construcción de losa de concreto hidráulico en Av. Pedro Ramirez Vázquez (Segunda etapa), en el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco."	GENERADORES
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	UBICACION: CONTRATISTA:	CIUDAD GUZMAN, JAL. CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DEL SUR DE TECA, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 4 FINIQUITO
9	HOJA No.		9

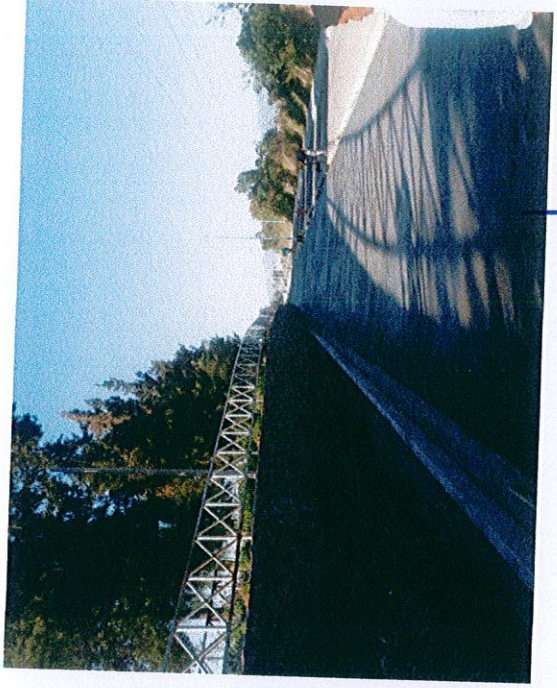REPORTE FOTOGRAFICO



CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DEL SUR DE TECA, S.A. DE C.V.	OBRAS PUBLICAS
JORGE RIGOBERTO CARDENAS MACIAS Representante Legal.	ARQ. JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR Director de Obras Publicas.
	
	<p align="center">DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</p>
